

所管事項調査

【目次】


【ページ】

長崎のもぞき恐竜パークの進捗状況について

- | | |
|------------|-----|
| 1 運営の準備状況 | 1 |
| 2 施設等の整備状況 | 2～3 |

【参考】

- | | |
|--|-----|
| 長崎市恐竜博物館整備事業の進捗状況について
(教育厚生委員会資料抜粋) | 4～7 |
|--|-----|



長崎のもぎき恐竜パークの進捗状況について

1 運営の準備状況

(1) 指定管理者との協定書の締結に向けての協議の進捗

令和3年5月17日の臨時会において、指定管理者が「大成 NOMON グループ」に決定したことにより、基本協定を締結するため、5月18日から指定管理者と協議・調整を行っている。

【主な協議・調整事項】

- ・ 指定管理者が行う業務内容の確認及び業務引継ぎに係る協議
- ・ 各施設に備え付けてある備品等の確認
- ・ 事業計画書（提案事業の実施）に係る協議

なお、基本協定締結後、7月1日からは恐竜博物館の利用に関する業務、宣伝及び利用促進に関する一部指定管理業務を、10月29日からは全ての指定管理業務を開始する。

(2) プロモーション（案）

項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月
基本協定締結	↔					
指定管理業務開始		★(7月1日) ●プレス発表 ・恐竜パーク ロゴマーク発表 ・事業計画 ・商談会、関連施設等連携協定				
恐竜広場供用開始				★(9月5日) ↔ 伊勢エビキャンペーン開催 ●プレス発表 ・恐竜広場オープン ・伊勢エビキャンペーン同時開催		
恐竜パークオープン					★(10月29日) ●プレス発表 ・オープンセレモニー ・企画展開催告知	

2 施設等の整備状況

1 項目（工事）別スケジュール

番号	項目	令和2年度			令和3年度							5月末時点 進捗率(%)		
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1-1	恐竜博物館建設工事 (主体)	本体工事												100
1-2	主体電気工事	電気工事												100
1-3	主体管工事	管工事												100
2-1	恐竜博物館展示室内装及び 外構工事(建築)	展示室内装・外構工事												100
2-2	展示室電気工事	電気工事												100
2-3	展示室管工事	管工事												100
2-4	恐竜博物館展示施工業務				展示施工							-		
3-1	トリックス骨格標本													88
3-2	恐竜オブジェ(博物館前)													98
3-3	標本取得													87
4-1	野母崎文化センター外壁・ 屋根改修工事	外壁・屋根工事												92
4-2	野母崎文化センター内部 改修工事													94
5	敷地造成工事	造成工事												94
6	駐車場ほか舗装工事	舗装工事												100
7	公園便所解体工事		解体工事											100
8	倉庫解体工事		解体工事											100
9	給排水管布設ほか工事		給排水解体布設ほか工事											85
10	広場等舗装工事		広場等舗装工事											90
11	公園施設整備等工事		施設整備等工事											30
12	公園遊具等整備工事		遊具等設置工事											25
13	公園灯設置工事		公園灯設置工事											8
14	インフォメーションセンター 改修工事	改修工事												12
15	インフォメーションセンター エントランス・外構整備工事				エントランス・外構整備工事									42
16	国道499号歩道舗装工事	舗装工事												60
17	公衆トイレ設置工事				トイレ設置工事									64
18-1	物産センター、ふれあい市場、 公園管理棟解体工事				解体・広場整備工事									7
18-2	解体後広場整備工事													7
19	指定管理業務													20
20	恐竜広場供用開始													30

完成 → 施行中 → 未契約

2 現況状況写真 (R3.6.7)



【南側上空】




【北側上空】

インフォメーションセンター周辺拡大図

長崎のもぎき恐竜パーク 平面図

S:1: 500 (A1版)
S:1: 1000 (A3版)

0m 10m 20m 30m

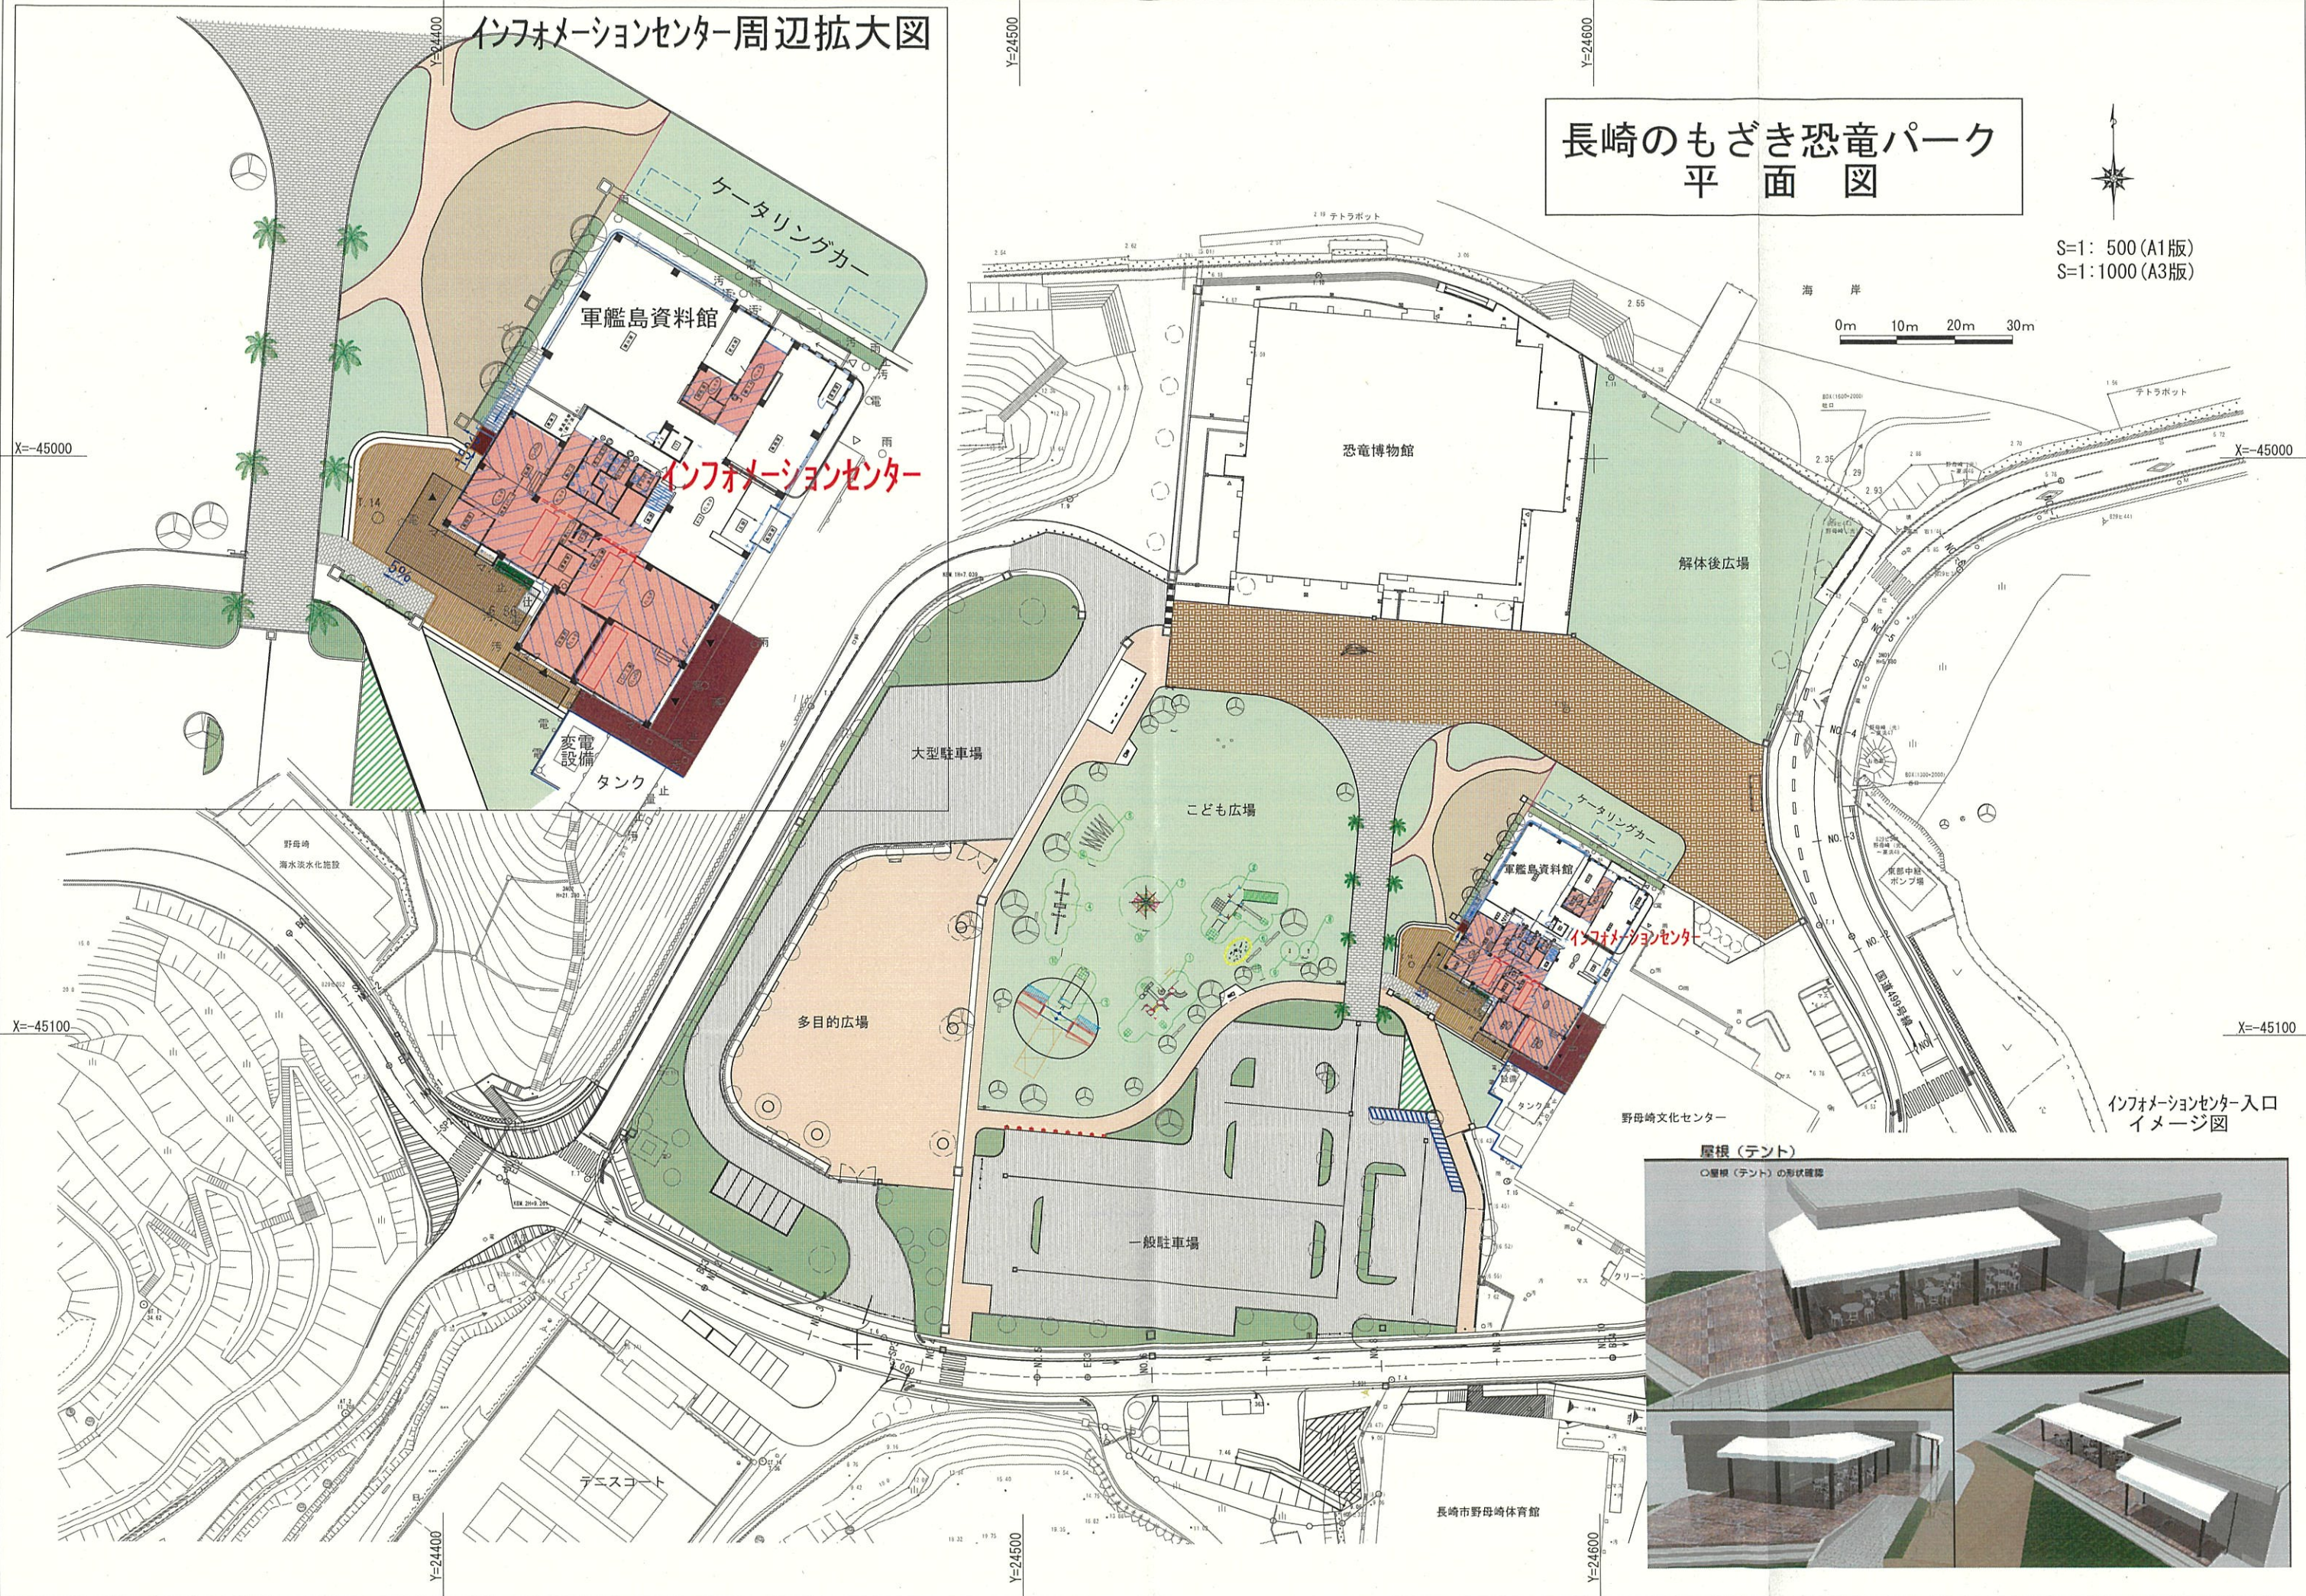

インフォメーションセンター入口
イメージ図



【参考】長崎市恐竜博物館整備事業の進捗状況について

(1) 全体スケジュール(予定)


項目	完了 (完了予定)	令和3年度									
		4	5	6	7	8	9	10	11		
建設工事	①建設主体工事	R3. 3. 19									
	②建設主体電気工事										
	③建設主体管工事										
	④展示室内装及び外構工事	R3. 5. 14	→								
	⑤展示室電気工事	R3. 4. 23	→								
	⑥展示室管工事	R3. 4. 23	→								
⑦トリックス骨格標本	R3. 6. 4	→									
⑧標本取得	(R3. 7. 31)	→	→	→	→						
⑨展示施工	(R3. 9. 15)	→	→	→	→	→	→				
恐竜オブジェ設置	⑩博物館前1基	(R3. 6. 18)	→	→	→						
	⑪国道沿線3基	(R3. 10. 28)							→		

完了 → 施工中 → 施工予定 →

恐竜博物館 開館

(2) 進捗状況等

ア 平面図

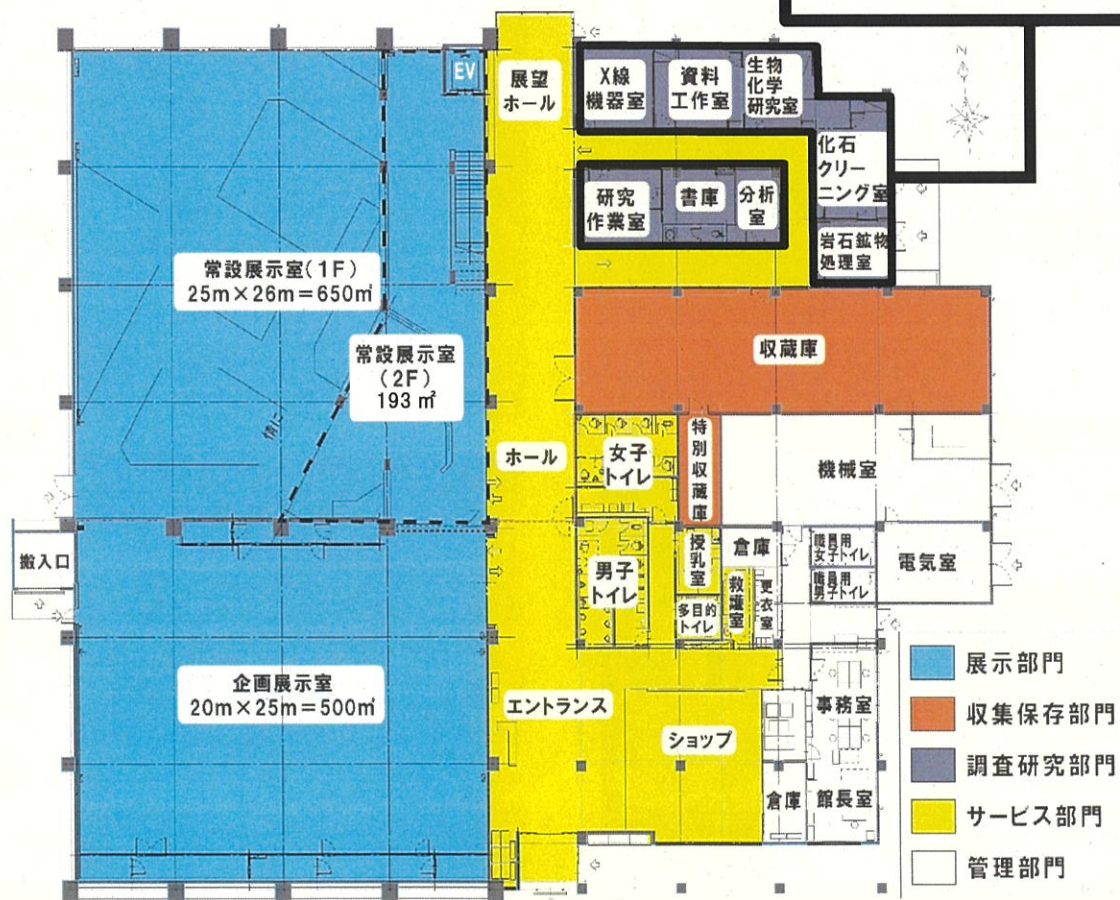

イ 恐竜パーク全体



ウ 博物館外部



エ 博物館内部





企画展示室



展望ホール



オープンラボ



収蔵庫



岩石鉱物処理室




化石クリーニング室



分析室



資料工作室

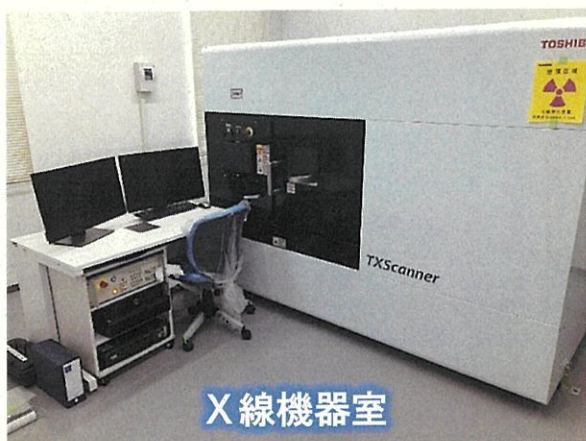

X線機器室




事務室

オ その他



トリックス骨格標本

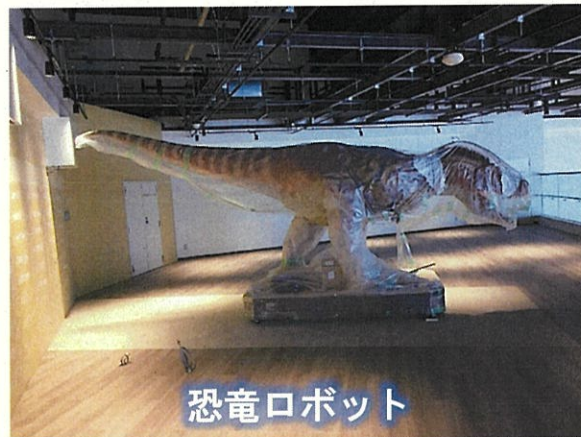

恐竜ロボット



常設展示室現況 (R3. 6. 7)
