

所管事項調査に関する資料

目 次	ページ
1 令和 7 年 8 月の豪雨被災状況について	2
2 令和 7 年度主要事業の執行予定について	3 ～ 21
3 平和公園スポーツ施設再配置イメージについて	22 ～ 27
4 訴訟の現況について（建物明渡等請求事件）	28 ～ 30
5 訴訟の現況について（怠る事実の違法確認請求控訴事件）	31 ～ 38

土木部
令和 7 年 9 月

1 令和7年8月の豪雨被災状況について

令和7年度（令和7年8月10日～令和7年8月11日）の豪雨被災状況

道路：6件、河川：1件、公園：0件

うち、【補助】道路災害復旧は1件

路線名：戸石町2号線

被災日：令和7年8月11日

24時間雨量：231ミリ、1時間雨量：57ミリ


延長L=8.0m

崩壊幅W=2.0m、高さH=3.0m ※現在車両通行止め

戸石町2号線
被災状況写真



位置図

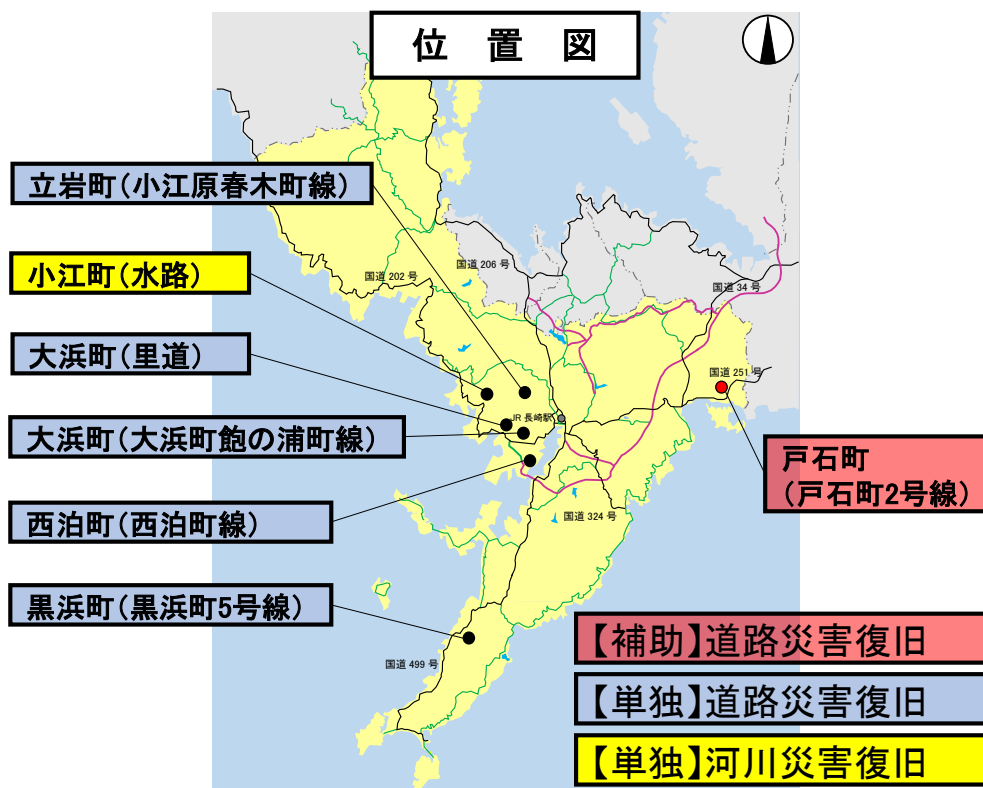

2 令和7年度主要事業の執行予定について

■次の表は現時点における主要事業の執行予定です。今後の執行予定額については、追加の補助があった場合は変更になることがあります。

令和7年8月時点(単位:千円)

区分	番号	事業実施箇所	予算額 (A)	執行 予定額 (B)	差引額 (B)-(A)	予算の内容	→ 執行予定内容	※は補足説明	全体計画及び進捗率				
									事業期間 (認可期間)	事業計画	総事業費	進捗率	
												R6 (R7.3月末)	R7見込み (R8.3月末)
道路	1	江平浜平線	50,000	33,348	▲16,652	工事 L=100m 委託 費用便益分析 一式	→ 変更なし(※) → 変更なし	※内示減による 工事内容の見直し	H9年度～R11年度 (H9年度～R8年度)	延長 幅員 L=2,260m W=9.75m	4,600,000	83%	84%
	2	中川鳴滝3号線	15,200	6,000	▲9,200	工事 L=42m 用地取得 A=300㎡	→ 変更なし(※) → A=20㎡	※内示減による 工事内容の見直し	H12年度～R12年度 (H12年度～R12年度)	延長 幅員 L=1,200m W=10m ～12m	4,100,000	49%	50%
	3	籠町稲田町1号線 (電線類地中化)	20,000	20,000	0	工事 L=90m 工事委託 一式	→ 変更なし → 変更なし		H29年度～R7年度 (H29年度～R7年度)	延長 L=250m	420,000	94%	100%
	4	相川町四杖町1号線ほか4線	74,000	74,000	0	工事 L=62m 委託 建物調査 一式 用地取得 A=8㎡	→ 変更なし → 変更なし → 変更なし		H20年度～R12年度 (H20年度～R12年度)	延長 幅員 L=2,720m W=5.5m ～11.5m	3,560,000	80%	84%
	5	虹が丘町西町1号線	231,000	231,000	0	工事 橋梁上部工 L=64m 法面整備 L=20m 委託 道路詳細設計 一式 用地取得 A=350㎡	→ 変更なし → 変更なし → 変更なし → 変更なし		H9年度～R11年度 (H9年度～R7年度)	延長 幅員 L=1,950m W=10m	6,500,000	51%	55%
	6	新市庁舎周辺道路	70,500	70,500	0	工事 L=125m 委託 交差点設計 一式 用地取得 A=50㎡	→ 変更なし → 変更なし → 変更なし		H28年度～R9年度 (H28年度～R9年度)	延長 幅員 L=560m W=9m ～37.6m	1,947,000	79%	83%
	7	幸町周辺地区	5,000	4,500	▲500	工事 L=70m	→ 変更なし(※)	※内示減による 工事内容の見直し	R4年度～R8年度 (R4年度～R8年度)	延長 L=270m	364,700	16%	18%
	8	道路構造物等補強 (道路メンテナンス事業)	223,750	204,442	▲19,308	工事 10橋・1トンネル 設計 11橋・1トンネル 点検 180橋	→ 9橋・1トンネル → 9橋・1トンネル → 変更なし		—	—	—	—	—

区分	番号	事業実施箇所	予算額 (A)	執行 予定額 (B)	差引額 (B)-(A)	予算の内容	→	執行予定内容	※は補足説明	全体計画及び進捗率				
										事業期間 (認可期間)	事業計画	総事業費	進捗率	
													R6 (R7.3月末)	R7見込み (R8.3月末)
街路	9	大黒町恵美須町線	446,000	228,138	▲217,862	委託 交差点詳細設計 一式	→	変更なし		H26年度～R14年度 (H26年度～R14年度)	延長 L=110m 幅員 W=26.25m	5,969,000	22%	26%
	10	新地町稲田町線	20,000	20,000	0	工事 L=70m	→	変更なし		H12年度～R9年度 (H12年度～R9年度)	延長 L=400m 幅員 W=15m	4,100,000	82%	83%
	11	銅座町松が枝町線 (銅座工区)	30,000	30,000	0	工事 L=140m 委託 建物調査 一式 用地取得 A=3㎡	→ → →	変更なし 変更なし 変更なし		H26年度～R11年度 (H26年度～R11年度)	延長 L=420m 幅員 W=15m	4,946,000	51%	52%
	12	片淵線(新大工工区)	24,000	24,000	0	建物の解体 1棟 用地取得 A=10㎡	→ →	変更なし 変更なし		H28年度～R12年度 (H28年度～R12年度)	延長 L=270m 幅員 W=8m	775,200	39%	40%
河川 海岸	13	江川川	6,000	6,000	0	委託 測量設計 一式	→	変更なし		S56年度～R12年度 (S56年度～R12年度)	延長 L=2,530m	3,162,000	94%	94%
	14	大井手川	37,500	22,371	▲15,129	工事 L=160m 委託 用地測量等 一式 用地取得 A=25㎡	→ → →	L=135m 皆減(次年度以降実施予定) 皆減(次年度以降実施予定)		H13年度～R12年度 (H13年度～R10年度)	延長 L=2,150m	2,500,000	84%	86%
公園	15	金比羅公園	58,000	30,000	▲28,000	工事 L=60m	→	変更なし(※)	※内示減による 工事内容の見直し	H22年度～R8年度 (H22年度～R8年度)	面積 A=21.4ha	588,000	74%	83%
	16	【補助】公園等施設整備事業費 公園施設長寿命化	30,000	22,700	▲7,300	長崎東公園庭球場舗装更新 3面	→	2面		—	—	—	—	—

土木部内示率	76%
--------	-----

【参考】補助内示にかかる予算執行について

【例】事業費 20,000千円(補助率 1/2)で、内示率が80%だった場合

予算額(A) 20,000千円		補助要望額 10,000千円		起債・一財 10,000千円	
内示後	歳入	補助内示額	内示減	内示分に対応する起債・一財	内示減分に対応する起債・一財
	歳出	執行予定額(B)	執行制限額(不用額)※	執行予定額(B)	執行制限額(不用額)※
	16,000千円	8,000千円	2,000千円	8,000千円	2,000千円

※内示減分については補助及び起債充当額が歳入予算計上額よりも減となることから、長崎市予算規則第9条の規定により、予算執行不可(不用額)となる。

【参考】長崎市予算規則(抜粋)

(予算の執行の制限)

第9条 歳出予算のうち、特定の収入を財源とする事務又は事業については、その収入が確定した後に執行するものとする。

ただし、財務部長が特に認める場合は、この限りでない。

- 2 前項の収入が歳入予算に計上した額よりも減少し、又は減少するおそれがあるときは、課長は、財務部長の承認を受けた後でなければその収入を財源とする事務又は事業を執行することができない。

江平浜平線

L=2,260 m W=9.75 m

新幹線(新長崎トンネル)



工事 L=100m

費用便益分析 一式

旧江平中学校

江平2丁目

橋梁

トンネル

立山公園

長崎東高校

浜平2丁目

山里中学校

坂本小学校

長崎大学医学部

長崎大学病院

凡 例

■	令和6年度までに施行
■	令和7年度に施行予定
■	令和8年度以降に施行予定

	(当初)	(執行予定)
工事	L=100m	→ 変更なし
委託	費用便益分析 一式	※工事内容の見直し → 変更なし

中川鳴滝 3 号線

(当初) (執行予定)
 工事 L=42m → 変更なし
 ※工事内容の見直し
 用地取得 A=300 m² → A= 20 m²

用地取得 A= 20 m²

工事 L=42m

凡 例

	令和 6 年度までに施行
	令和 7 年度に施行予定
	令和 8 年度以降に施行予定

1 工区
L=340m

2 工区
L=380m

3 工区
L=480m

L=1,200m
W=10~12m

籠町稲田町1号線（電線類地中化）



国道499号

湊公園

長崎みなと
メディカルセンター

土神堂

仁田佐古
小学校

国道324号

工事 L=90m
工事委託 一式

	(当初)	(執行予定)
工事	L=90m	→ 変更なし
工事委託	一式	→ 変更なし

L=250m




凡 例

■	令和6年度までに施行
■	令和7年度に施行予定
■	令和8年度以降に施行予定



相川町四杖町 1 号線ほか 4 線

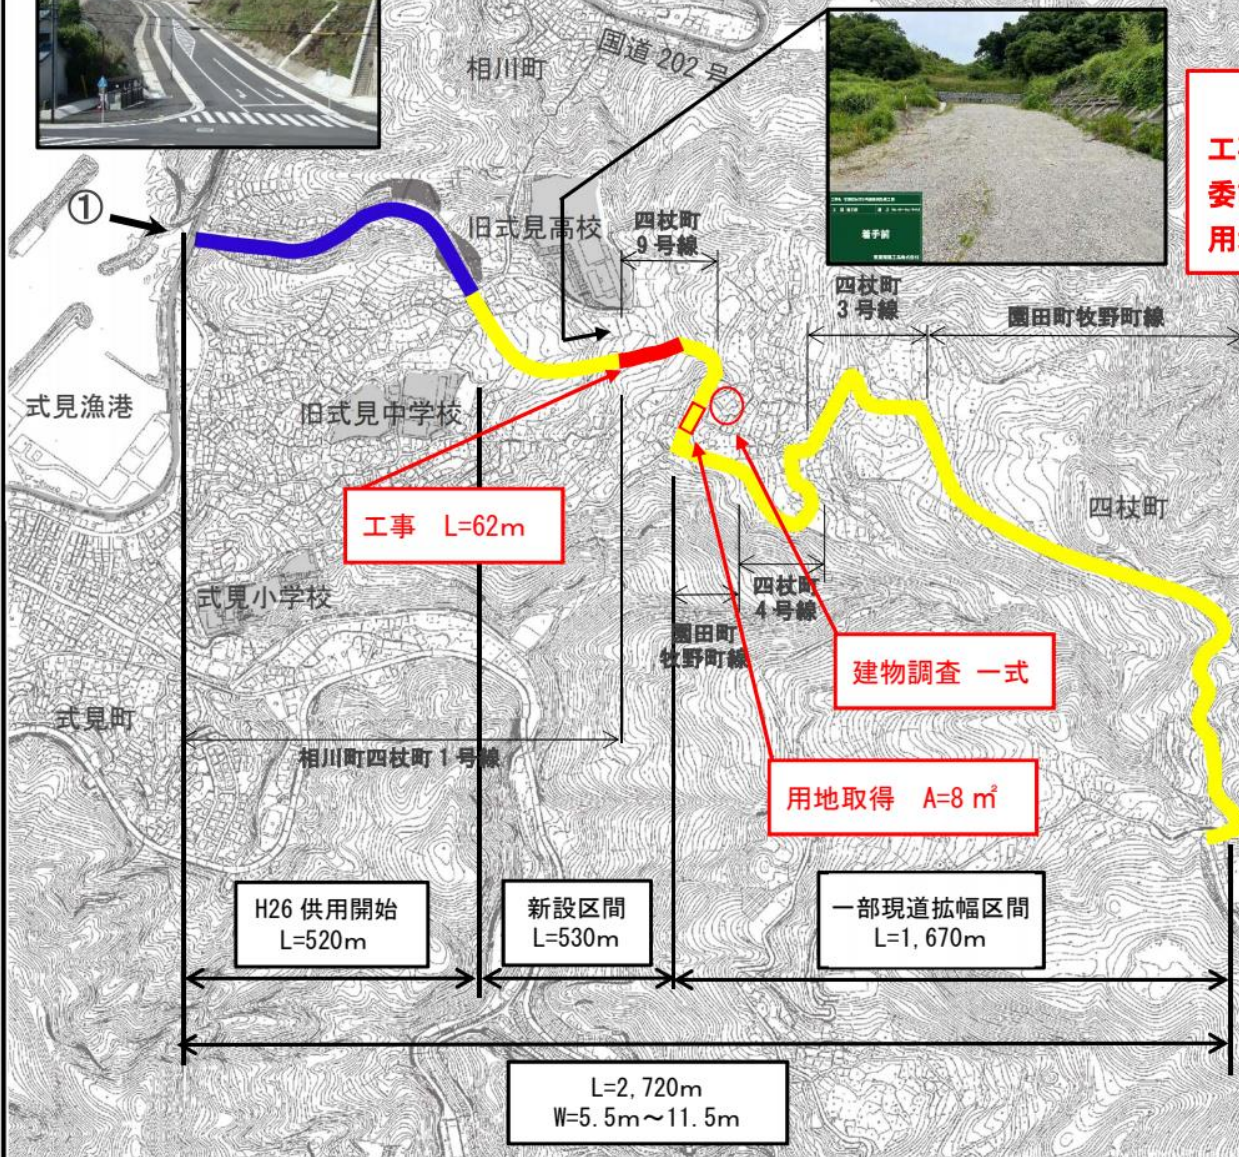

	(当初)	(執行予定)
工事	L=62m	→ 変更なし
委託	建物調査 一式	→ 変更なし
用地取得	A=8 m ²	→ 変更なし

凡 例	
 	令和 6 年度までに施行
 	令和 7 年度に施行予定
 	令和 8 年度以降に施行予定

虹が丘町西町1号線



	(当初)	(執行予定)
工事	橋梁上部工 L=64m	→ 変更なし
	法面整備 L=20m	→ 変更なし
委託	道路詳細設計 一式	→ 変更なし
用地取得	A=350 m ²	→ 変更なし

工事 橋梁上部工 L=64m

用地取得 A=350 m²

工事
法面整備 L=20m

道路詳細設計 一式

トンネル

虹が丘病院

道の尾病院

虹が丘町

虹が丘小学校

橋梁

橋梁

錦3丁目

市道油木町西町線

油木町

県道長崎式見港線





L=1,950m
W=10m

凡 例

 	令和6年度までに施行
 	令和7年度に施行予定
 	令和8年度以降に施行予定

幸町周辺地区

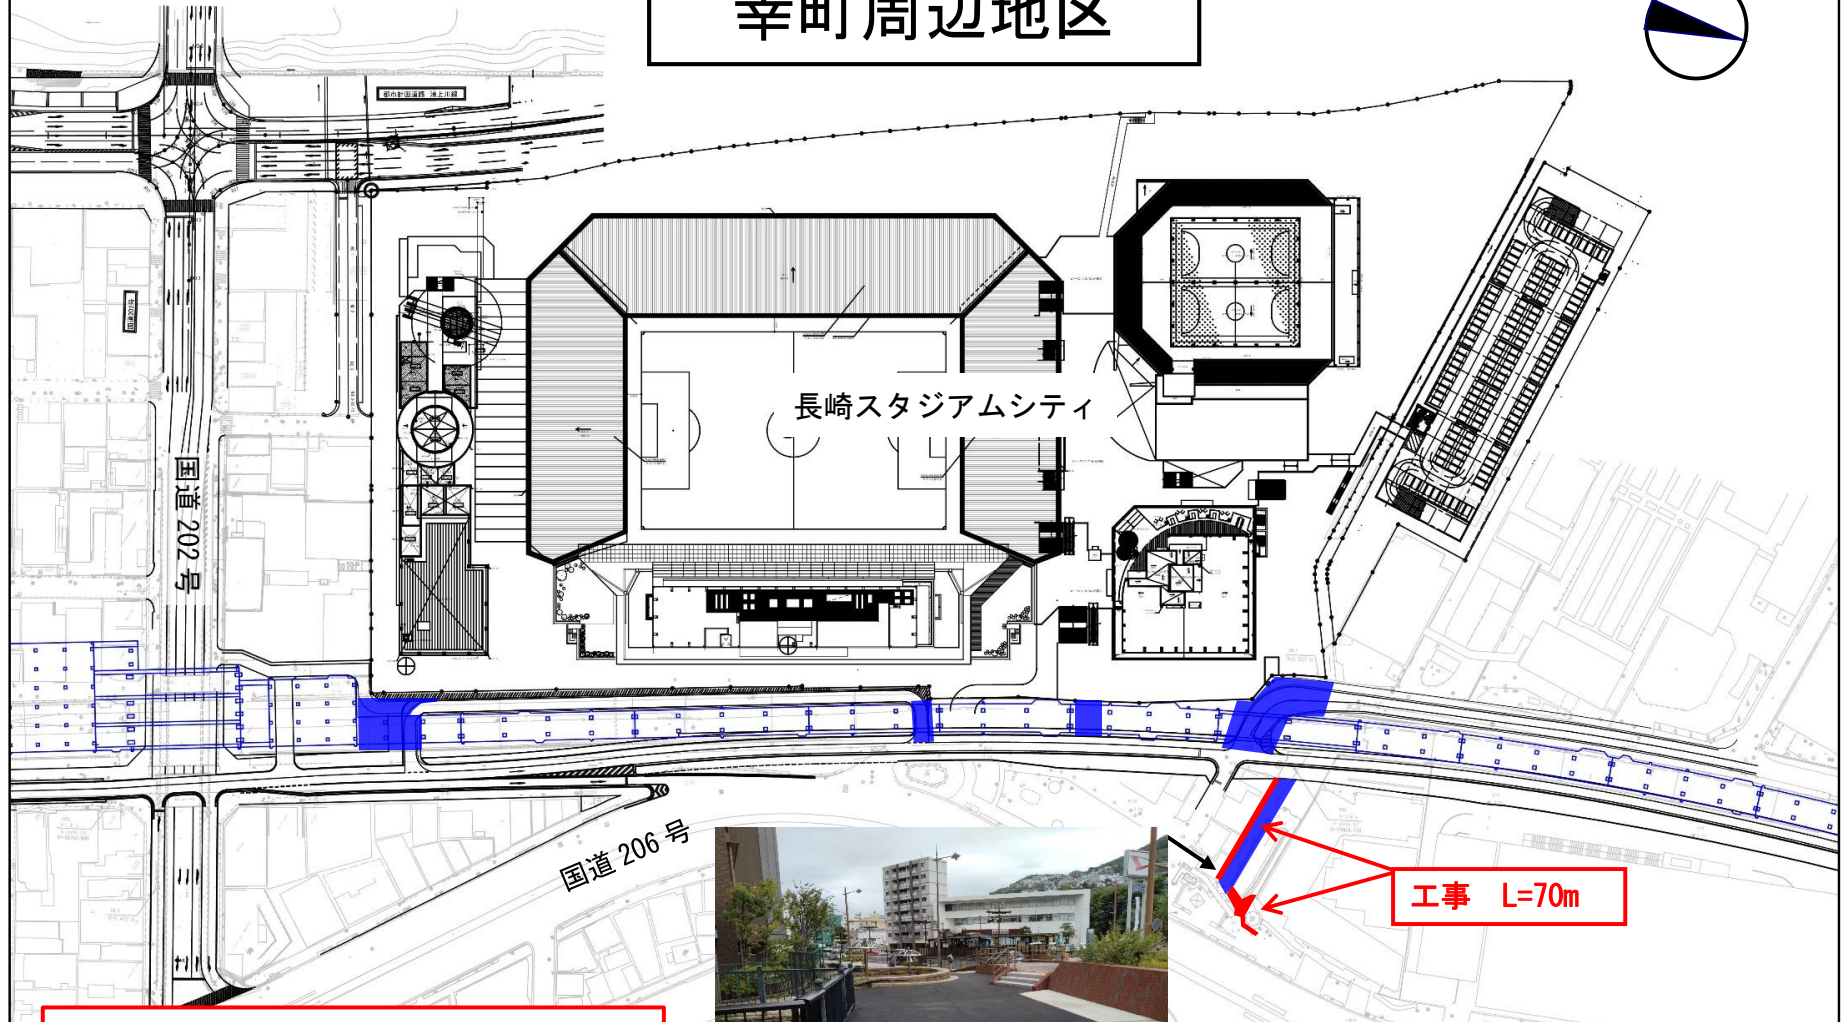

(当初) (執行予定)
工事 L=70m → 変更なし
※工事内容の見直し





工事 L=70m

凡 例

	令和6年度までに施行
	令和7年度に施行予定
	令和8年度以降に施行予定

道路構造物等補強（道路メンテナンス事業）

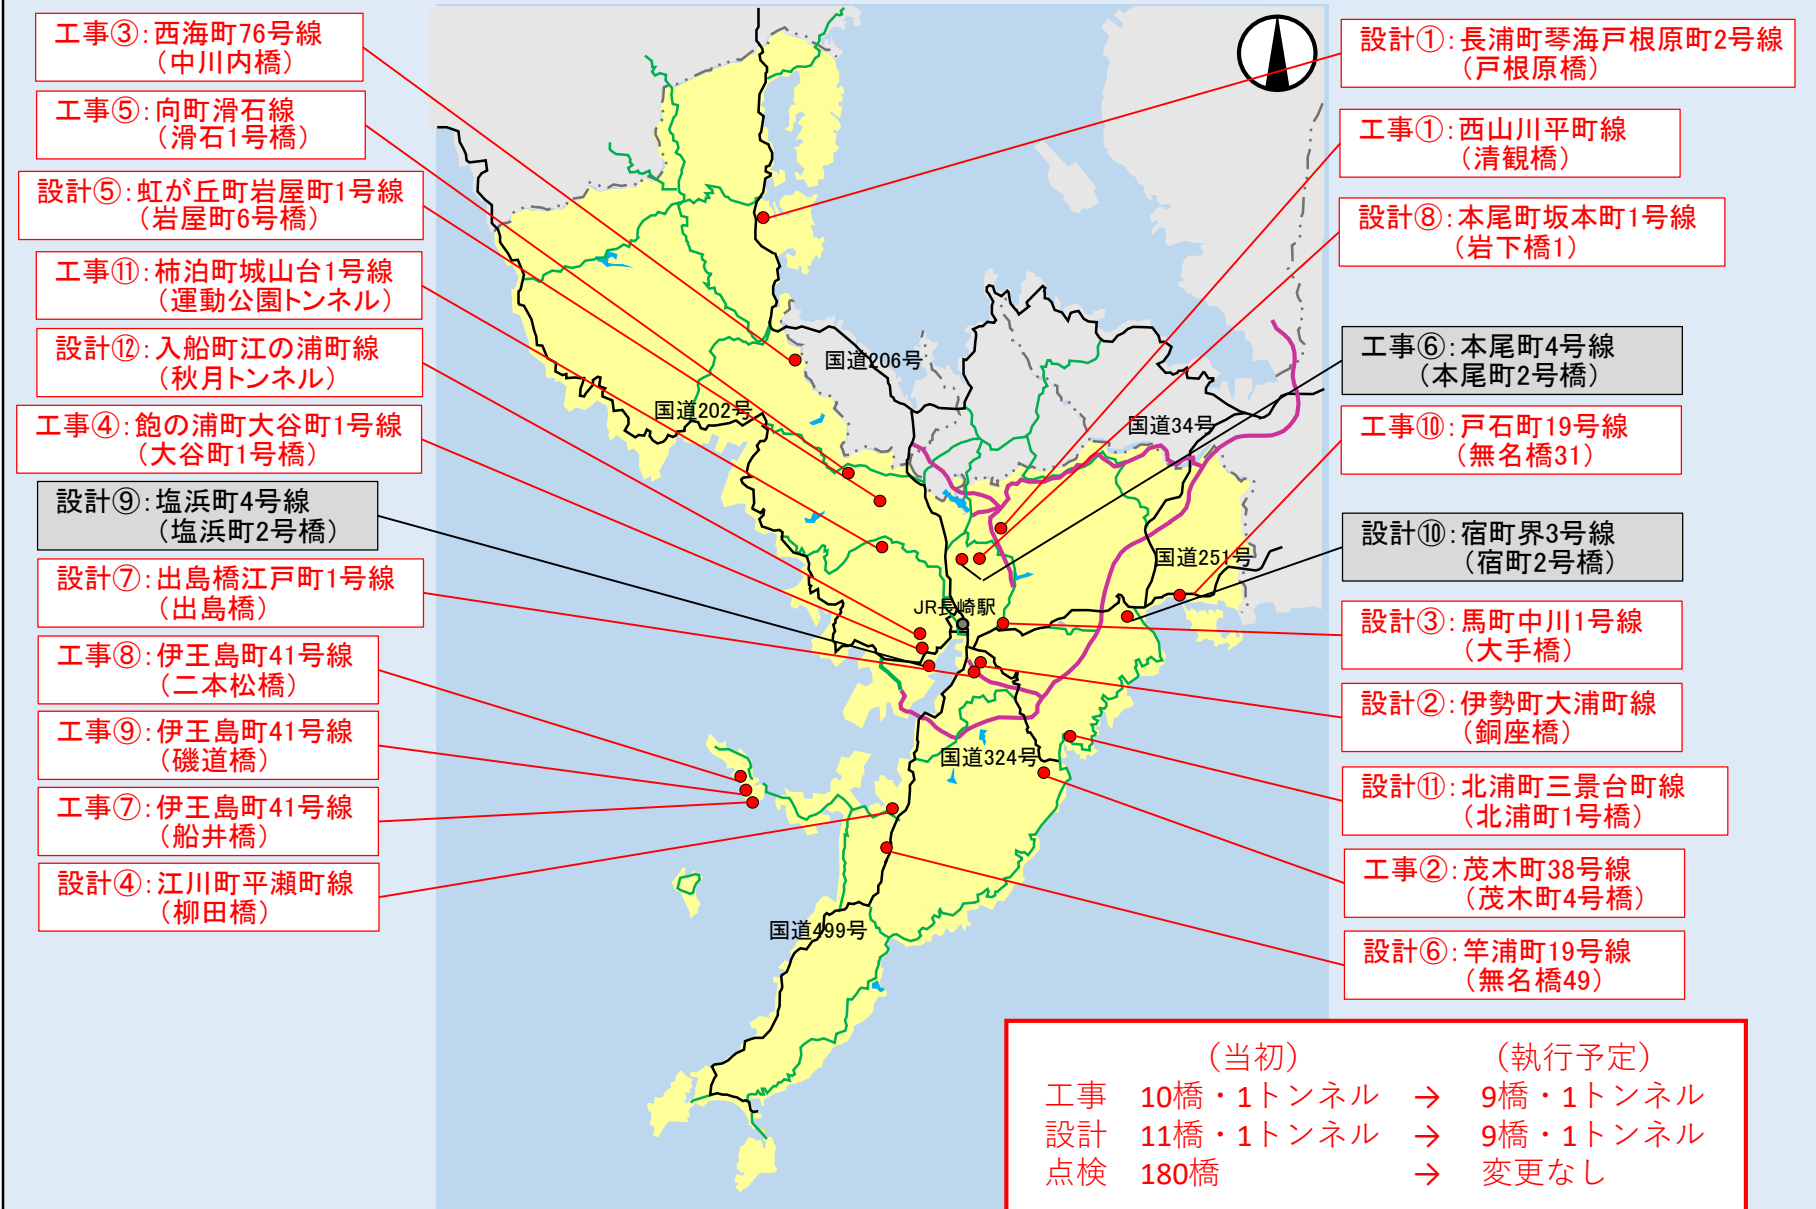

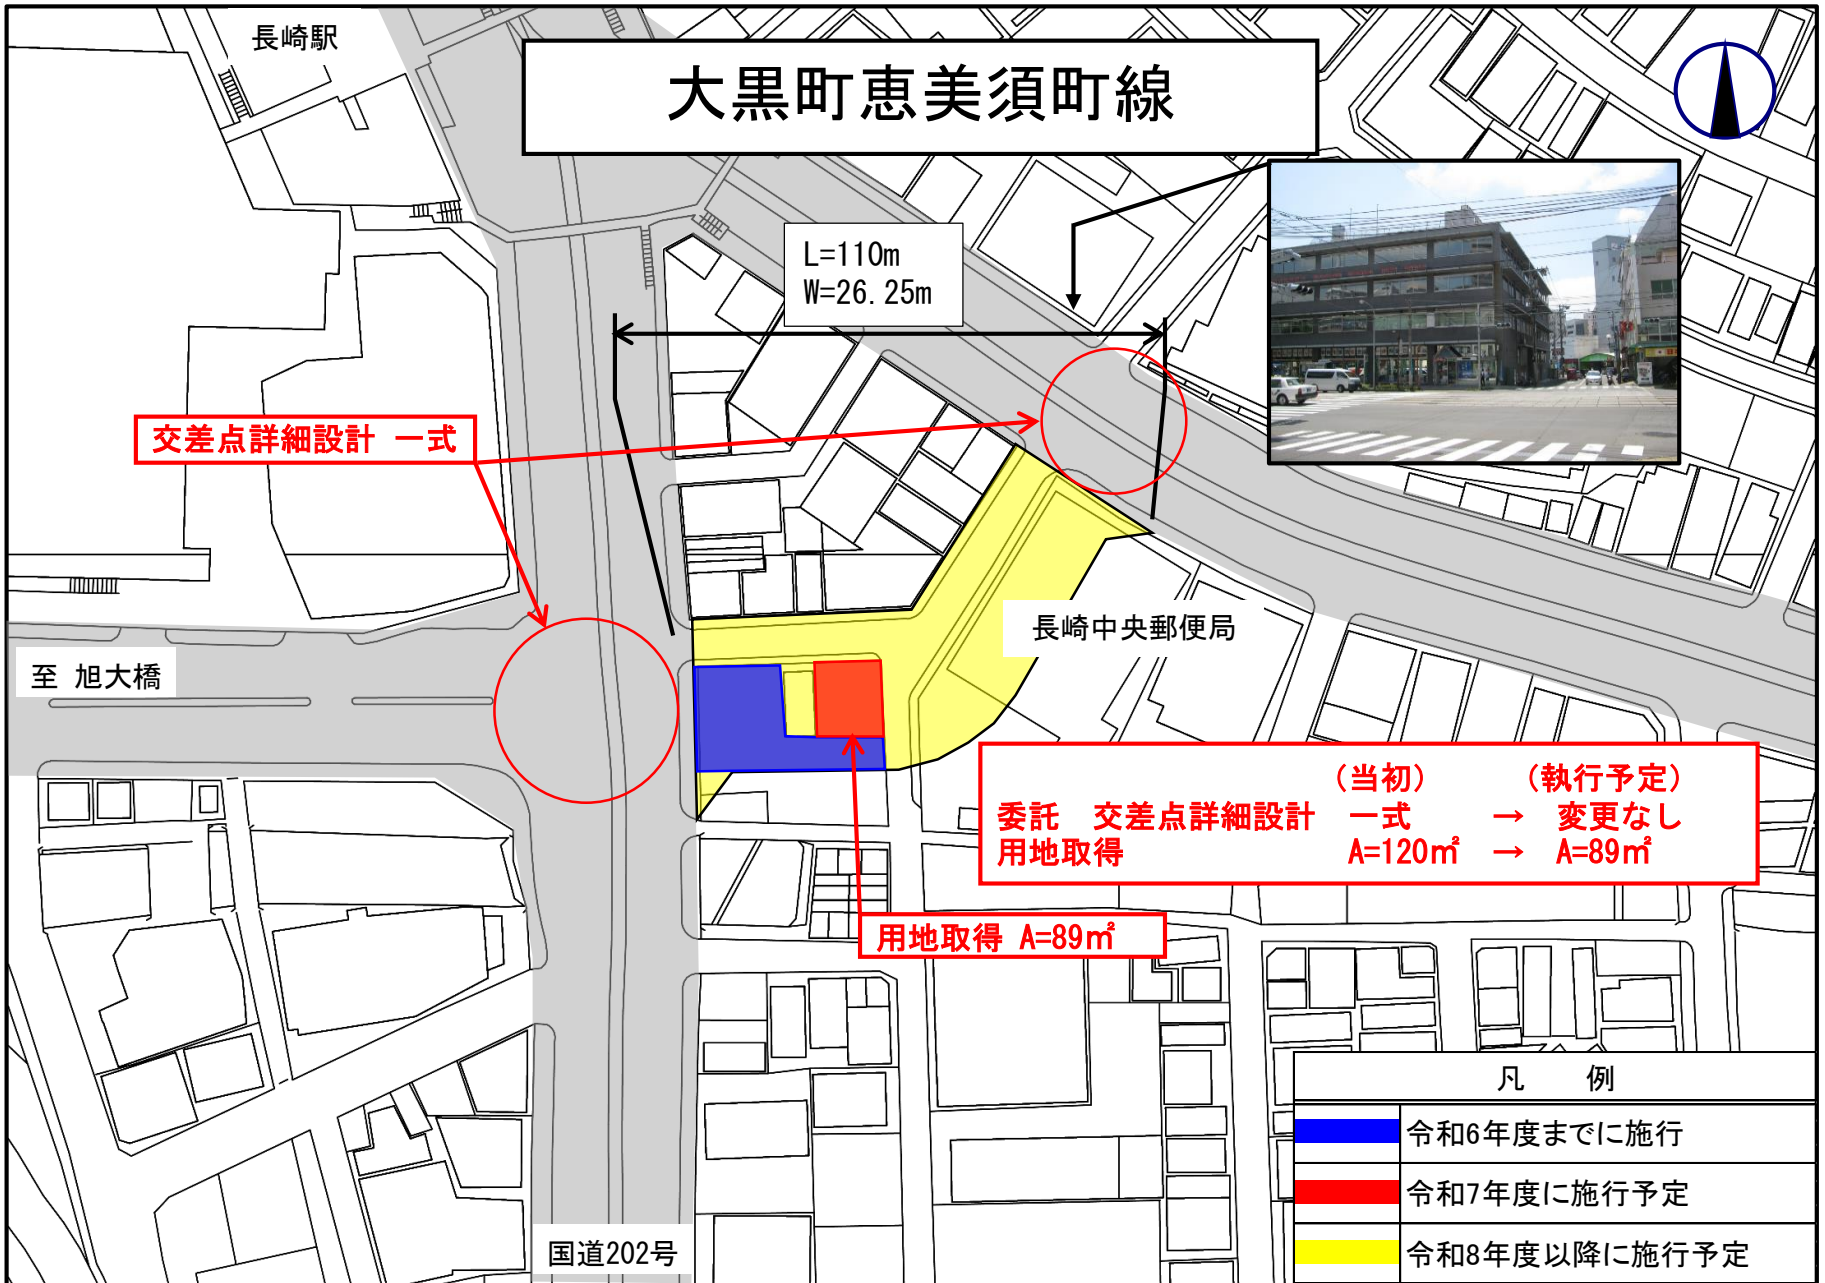

大黒町恵美須町線

L=110m
W=26.25m

交差点詳細設計 一式

至 旭大橋


長崎中央郵便局

	(当初)	(執行予定)
委託 交差点詳細設計 一式	→	変更なし
用地取得	A=120㎡	→ A=89㎡


用地取得 A=89㎡

国道202号

凡 例	
	令和6年度までに施行
	令和7年度に施行予定
	令和8年度以降に施行予定

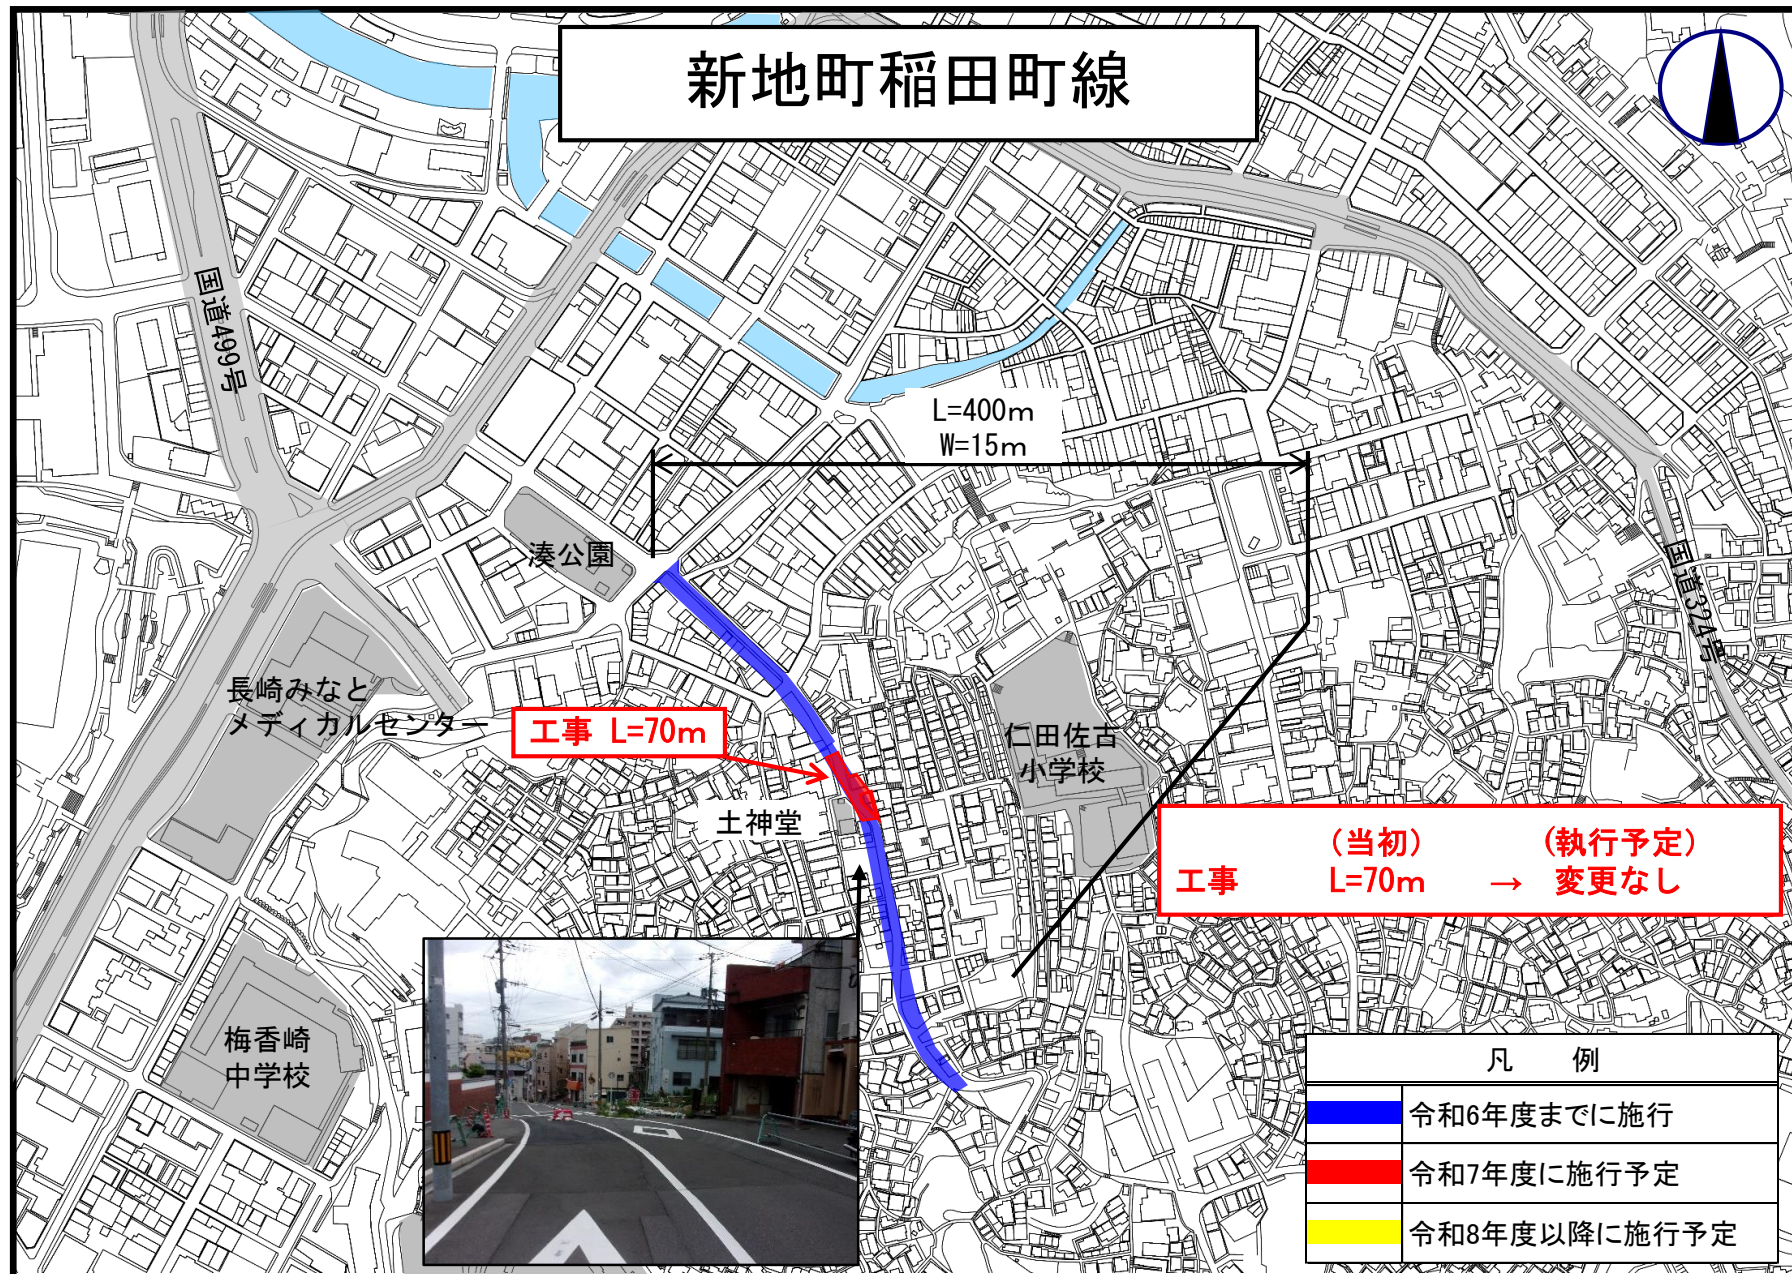

銅座町松が枝町線（銅座工区）



旧長崎県庁


出島

L=420m
W=15m


浜町

イメージ①

イメージ①

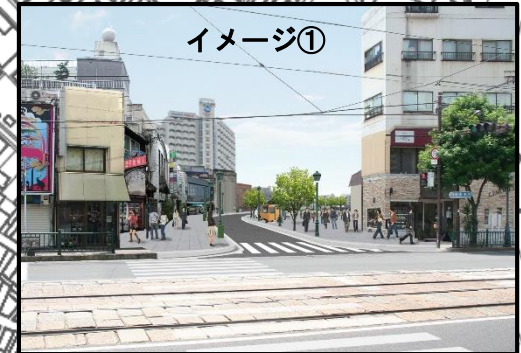

イメージ②

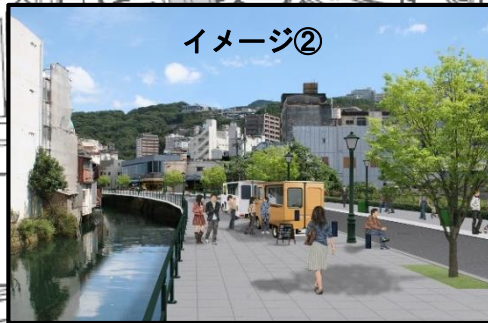

工事 L=140m

イメージ②

建物調査 一式

用地取得 A=3㎡


湊公園

	(当初)		(執行予定)
工事	L=140m	→	変更なし
委託 建物調査	一式	→	変更なし
用地取得	A=3㎡	→	変更なし

凡 例

	令和6年度までに施行
	令和7年度に施行予定
	令和8年度以降に施行予定

片淵線（新大工工区）



上長崎地区
ふれあい
センター

建物解体 1棟

用地取得 A=10m²

桜馬場中学校

馬町交差点

国道34号



	(当初)	(執行予定)
建物解体	1棟	→ 変更なし
用地取得	A=10m ²	→ 変更なし

至 市役所

凡 例	
	令和6年度までに施行
	令和7年度に施行予定
	令和8年度以降に施行予定

江川川

L=2,530m

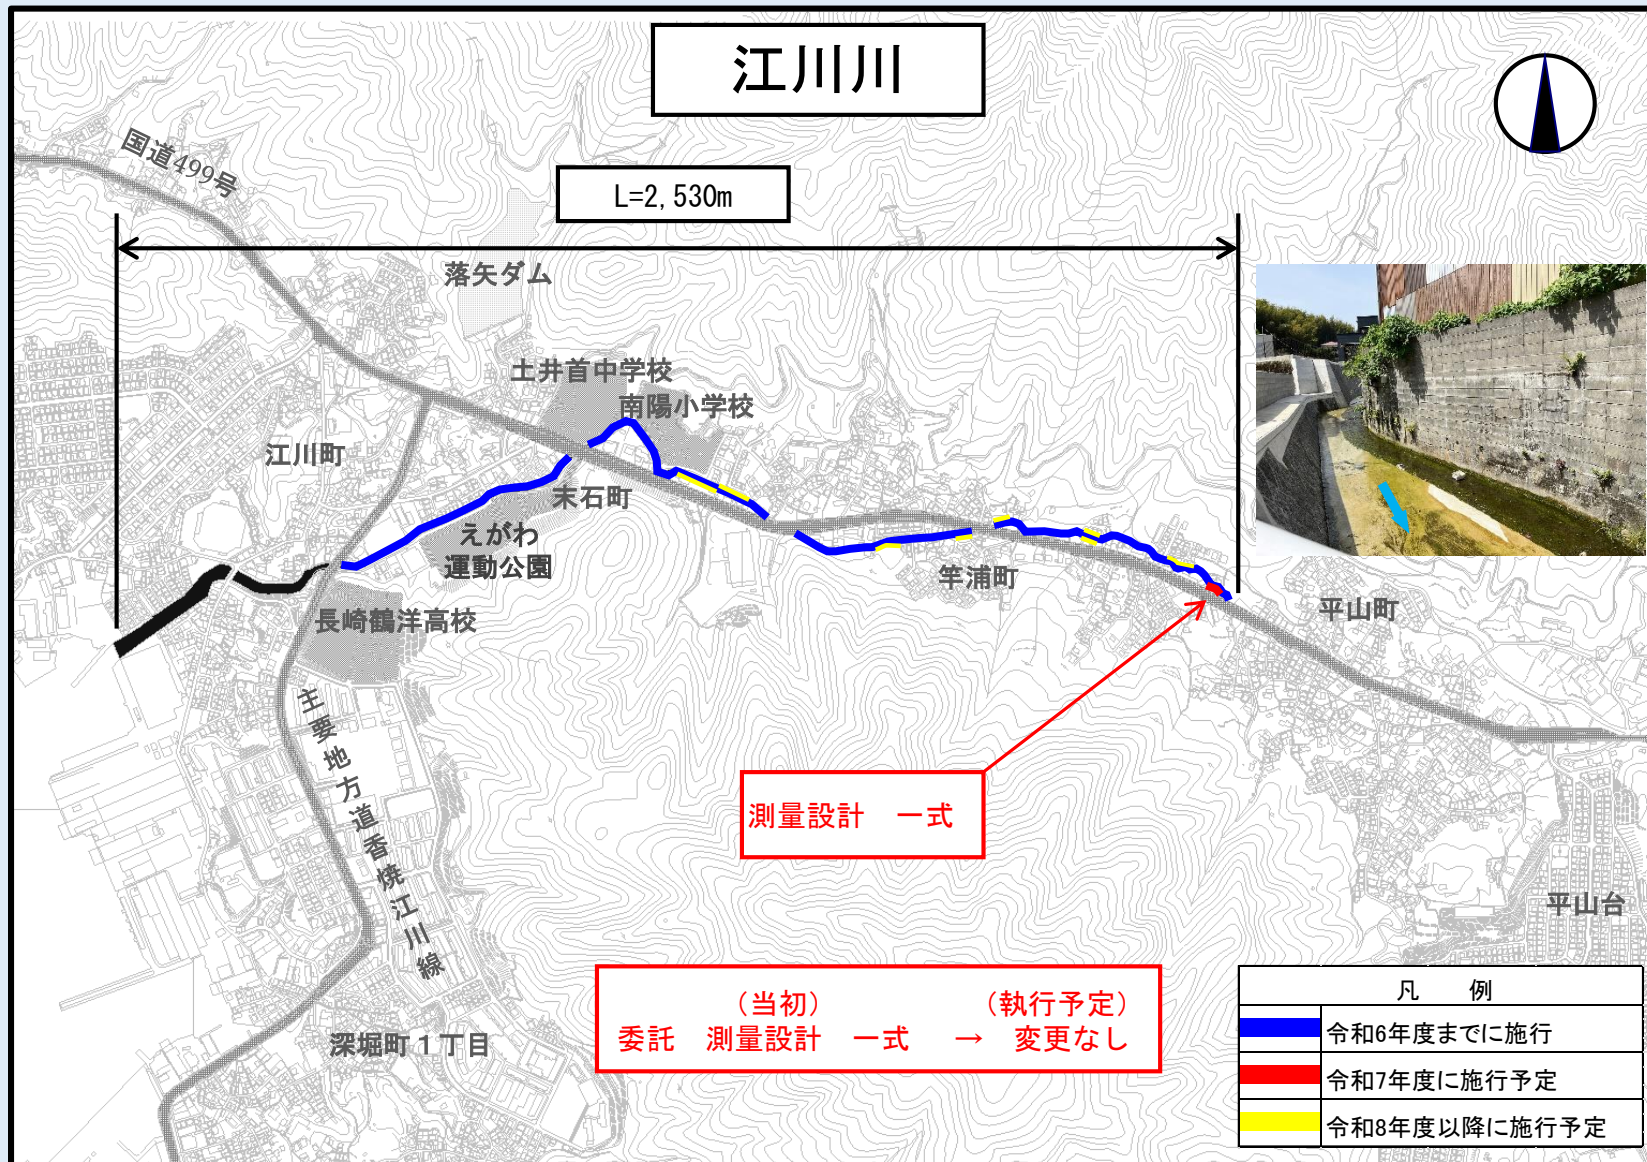

大井手川



L=2,150m

市・県合併施工区間 L=360m

国道
206
号

滑石3丁目

工事 L=25m
→ 次年度以降実施予定

工事 L=135m

都市計画道路滑石町線

北陽小学校

滑石中学校

用地取得 A=25㎡
→ 次年度以降実施予定

大園小学校

用地測量等 一式
→ 次年度以降実施予定

葉山1丁目

道ノ尾駅

大園町



虹が丘町

	(当初)	(執行予定)
工事	L=160m	→ L=135m
委託	用地測量等 一式	→ 皆減(次年度以降実施予定)
用地取得	A=25㎡	→ 皆減(次年度以降実施予定)

凡 例

■	令和6年度までに施行
■	令和7年度に施行予定
■	令和8年度以降に施行予定

金比羅公園



工事 園路整備 L=60m



金刀比羅神社

(当初)
工事 L=60m → (執行予定)
変更なし
※工事内容の見直し

長崎東中学校
長崎東高等学校

立山公園

長崎大学
経済学部

当初

執行予定

長崎中学校

凡 例

	令和6年度までに施行
	令和7年度に施行予定
	令和8年度以降に施行予定

【補助】公園等施設整備事業費 公園施設長寿命化

長崎東公園



駐車場

ソフトボール場

庭球場

駐車場

東工場

かき道3丁目

長崎東公園庭球場舗装更新 2面


長崎東公園庭球場舗装更新 1面
→ 次年度以降実施予定

	(当初)		(執行予定)
長崎東公園庭球場舗装更新	3面	→	2面




3 平和公園スポーツ施設再配置イメージについて


(1) 施設再配置先

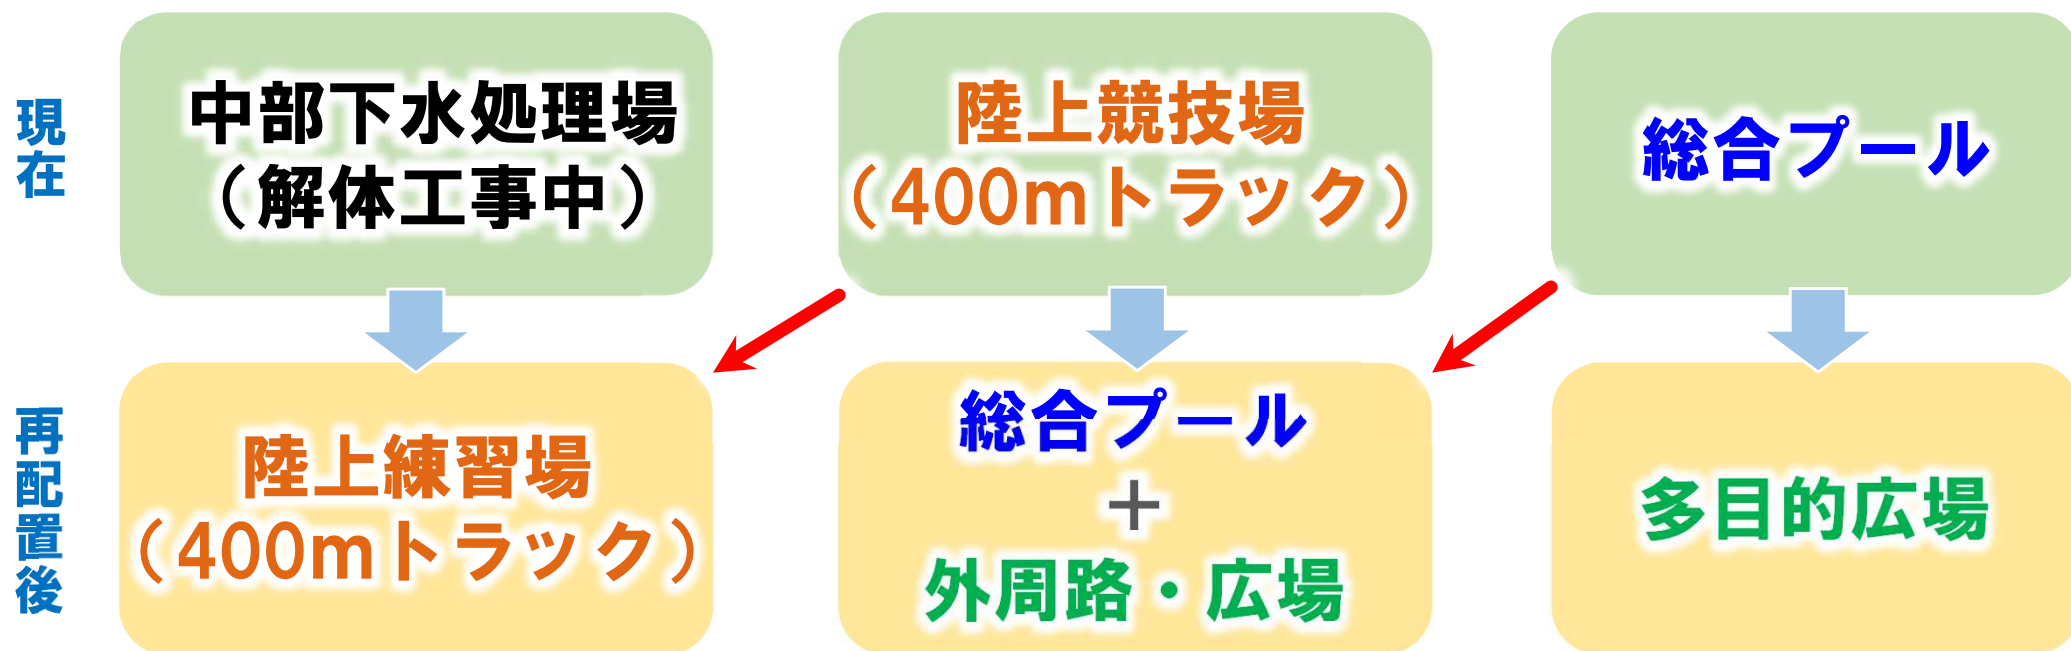

(2) 平和公園（西地区）再整備基本計画

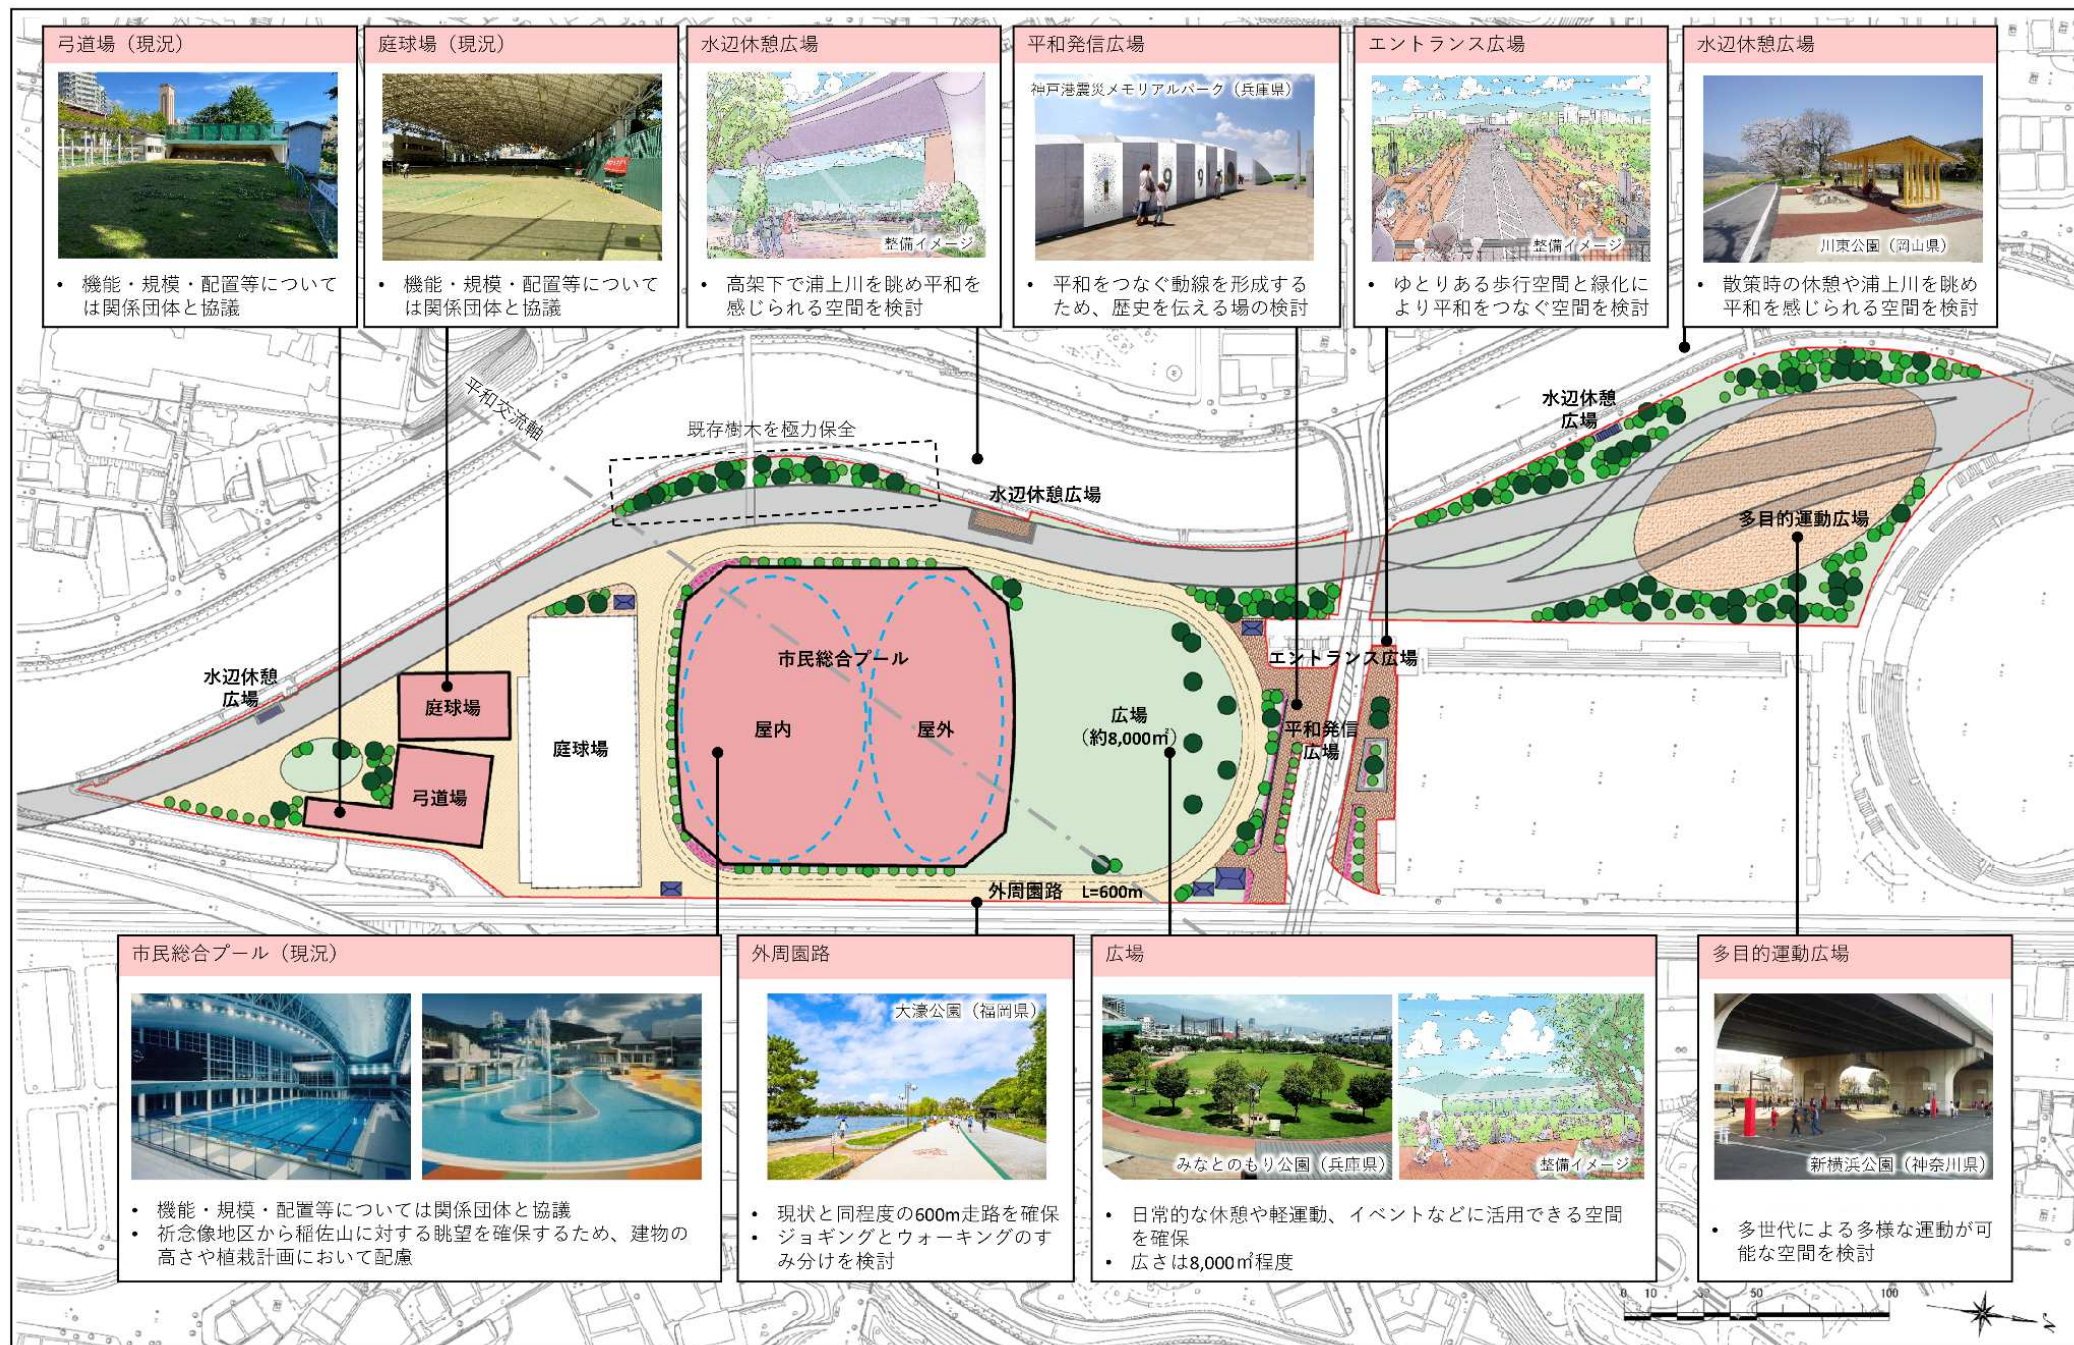

(3) 【イメージ】平和公園（西地区）

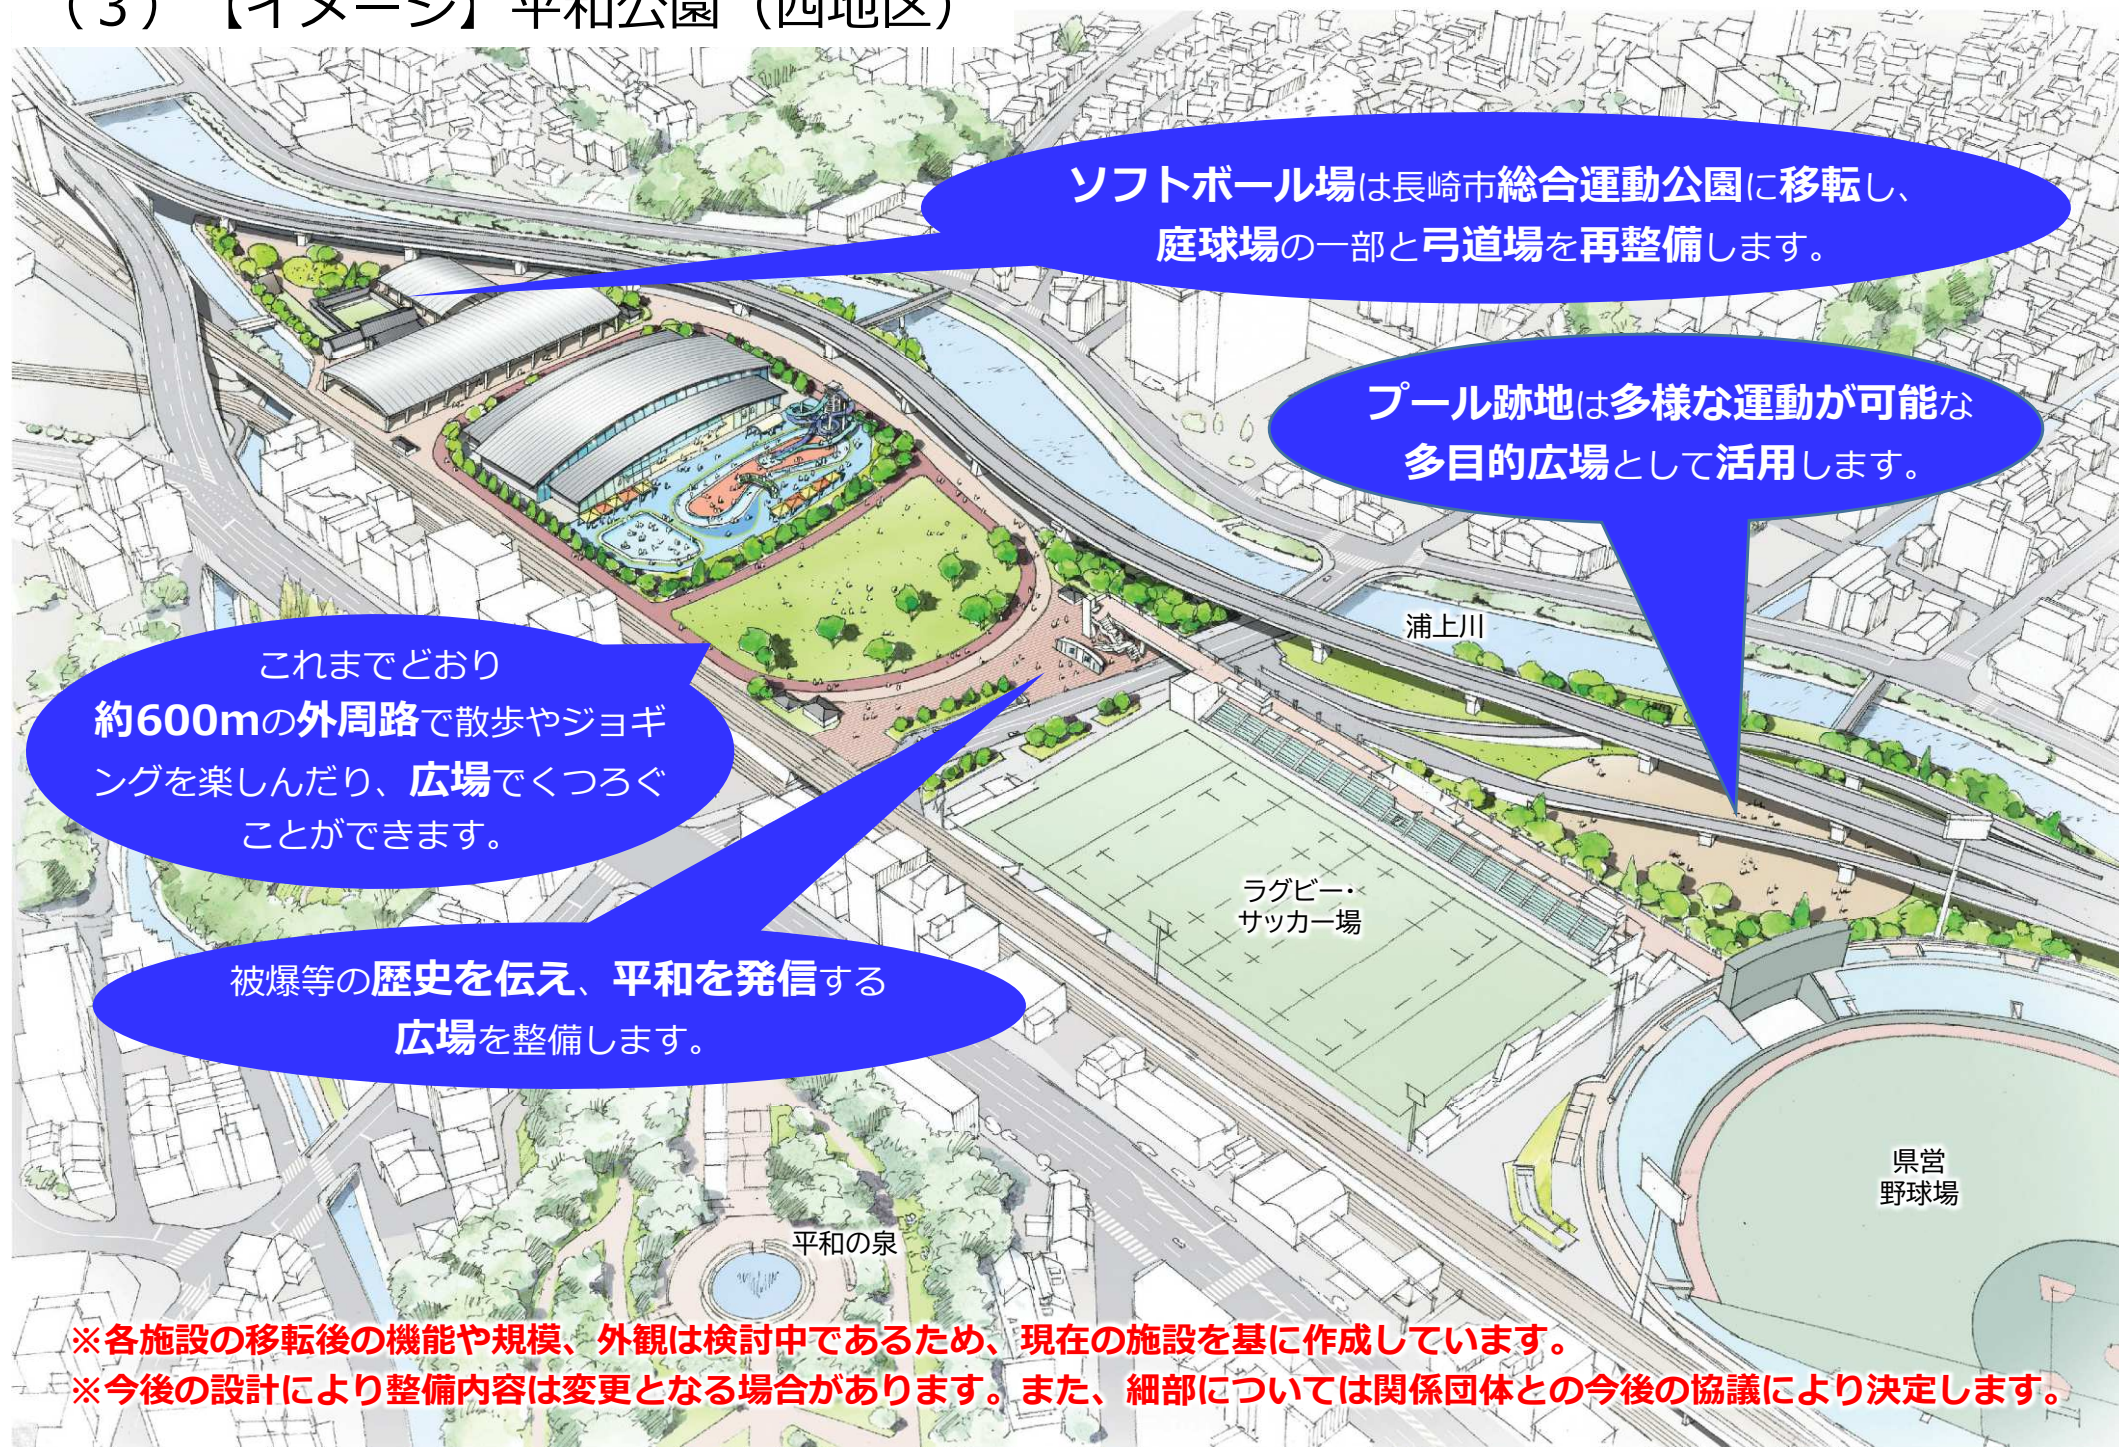

(4) 【イメージ】中部下水処理場跡 スポーツ、憩い、遊び、賑わい、緑のスペースがある多目的広場




※今後の設計により整備内容は変更となる場合があります。また、細部については関係団体との今後の協議により決定します。

(5) 中部下水処理場に関するアンケート結果


スタジアムシティ来場者

(回答者数n=546)


調査月：令和7年7月・8月



跡地に求める使い方




跡地に求める施設や機能




(5) 中部下水処理場に関するアンケート結果

銭座校区連合自治会
(回答者数n=377)
調査月：令和7年7月



跡地に求める使い方

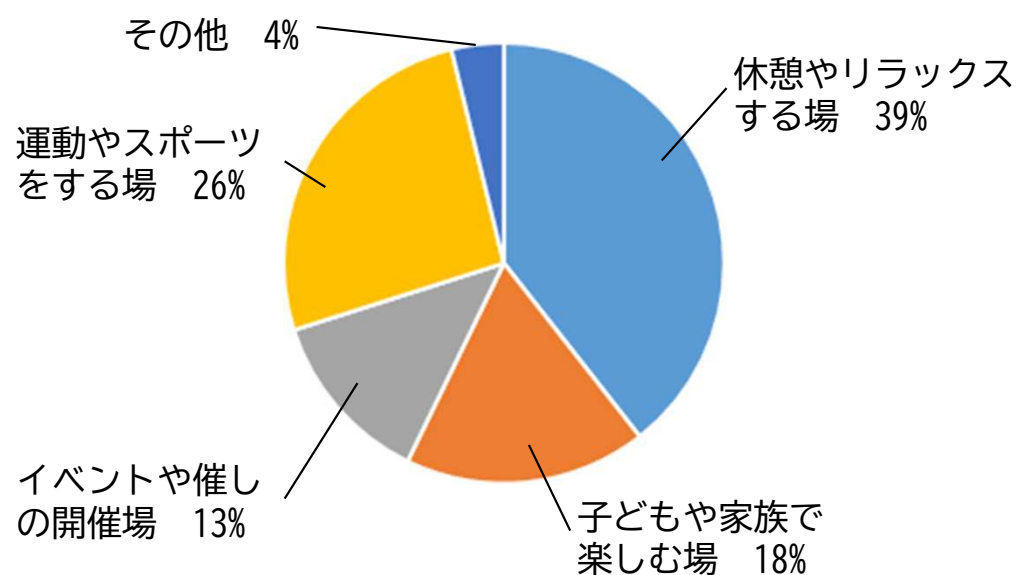

跡地に求める施設や機能

