

平成 31 年 2 月市議会 建設水道委員会資料

第 6 5 号議案		工事の請負契約の一部変更について	
		(仮称) 稲佐山公園斜面輸送施設稲佐岳駅舎新築主体工事	
1	工事の請負契約の一部変更について	1	ページ
2	概要	2	～7 ページ
第 6 6 号議案		工事の請負契約の一部変更について	
		稲佐山公園斜面輸送施設設置工事	
1	工事の請負契約の一部変更について	8	ページ
2	概要	9	ページ
第 6 7 号議案		工事の請負契約の一部変更について	
		稲佐山公園斜面輸送施設整備工事 (3)	
1	工事の請負契約の一部変更について	10	ページ
2	概要	11	ページ
	稲佐山公園 (スロープカー整備) 事業について	12	～13 ページ

理 財 部
ま ち づ く り 部
土 木 部

平成 31 年 2 月


1 工事の請負契約の一部変更について

第65号議案資料		担当	理 財 部 ま ち づ く り 部 土 木 部
工 事 名		(仮称) 稲佐山公園斜面輸送施設稲佐岳駅舎新築主体工事	
契約の金額	変更前	147,960,000円	
	変更後	160,322,760円	
工 期	変更前	平成30年11月14日から平成31年7月26日まで	
	変更後	平成30年11月14日から平成31年11月29日まで	
契約変更の理由		駅舎の鉄骨を接合する高力ボルトの納期が遅れるため、作業工程の延長等を行う必要が生じたことにより工事の設計を変更したことに伴い、契約の金額及び工期を変更するもの。	
相 手 方		長崎市興善町2番8号 株式会社西海建設 代表取締役 寺澤 律子	
工 事 概 要		<p>1 工事場所 稲佐町</p> <p>2 工事内容</p> <p>(1) 建築物の構造及び種別 鉄骨造地下1階地上1階建</p> <p>風除室 1</p> <p>待合室 1</p> <p>便 所 4</p> <p>更衣室 2</p> <p>休憩室 1</p> <p>(2) 建築物の面積 建築面積 449.46平方メートル</p> <p>延べ面積 506.90平方メートル</p>	

(仮称)稲佐山公園斜面輸送施設稲佐岳駅舎新築主体工事




案内図

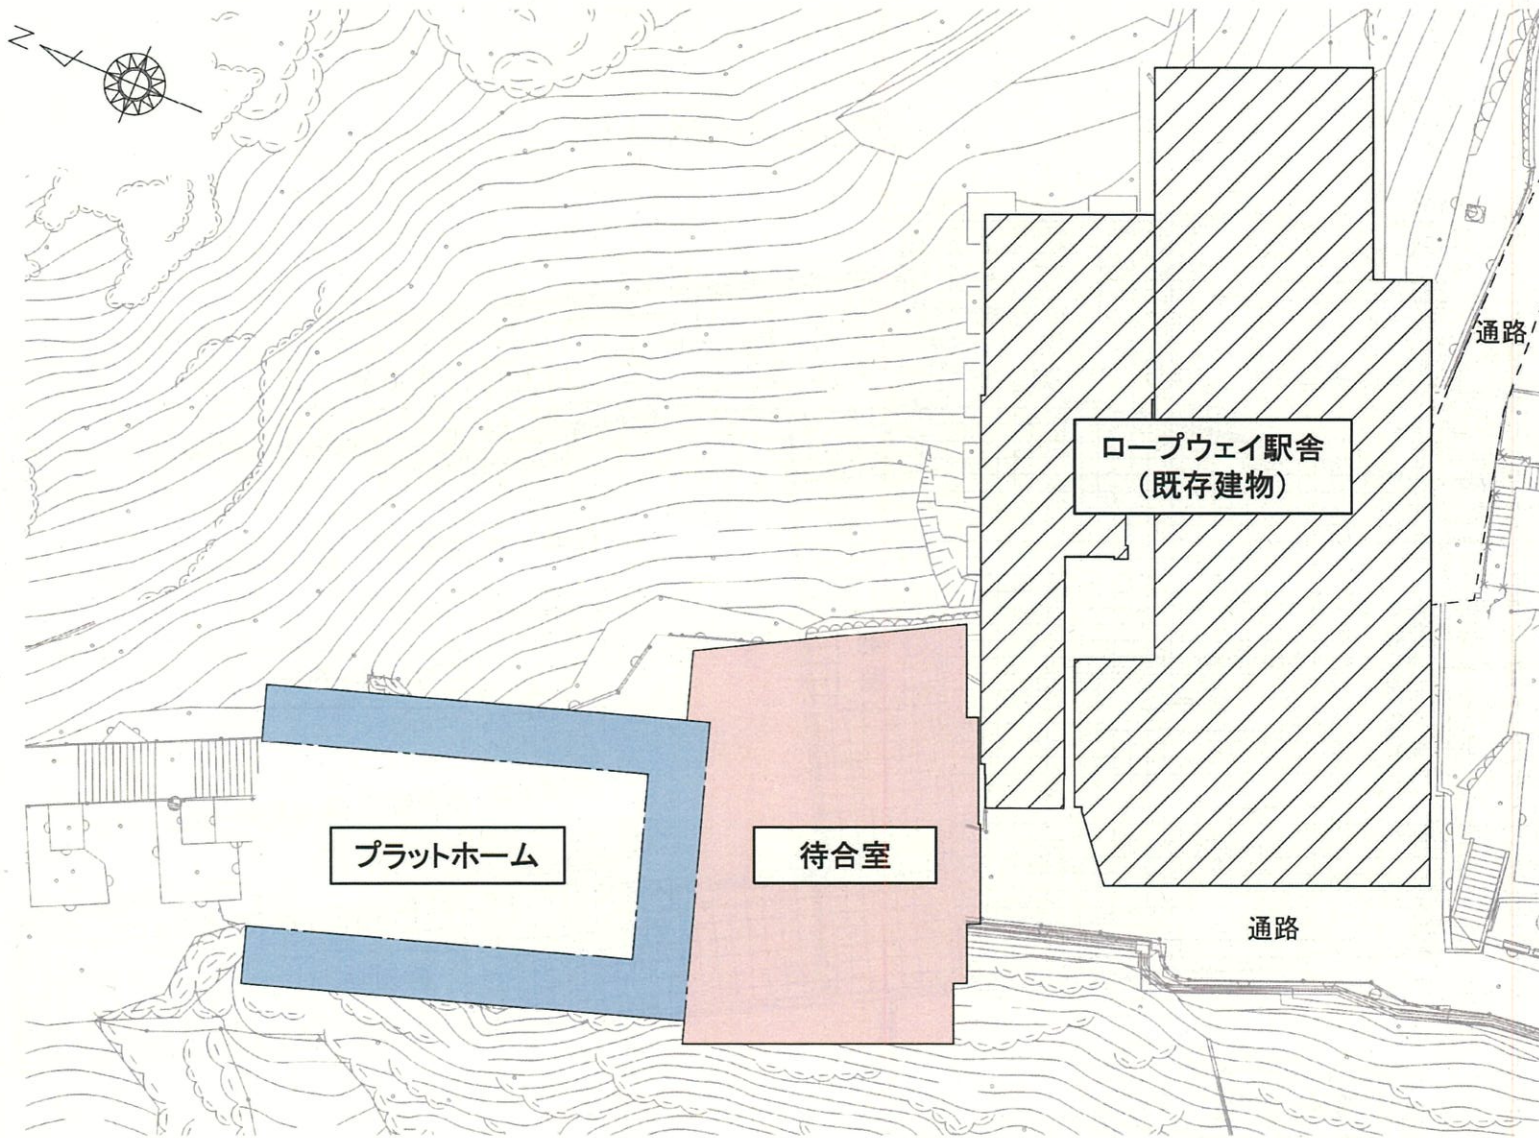


配置図

市街化調整区域
建築面積：449.46m²
延べ面積：506.90m²

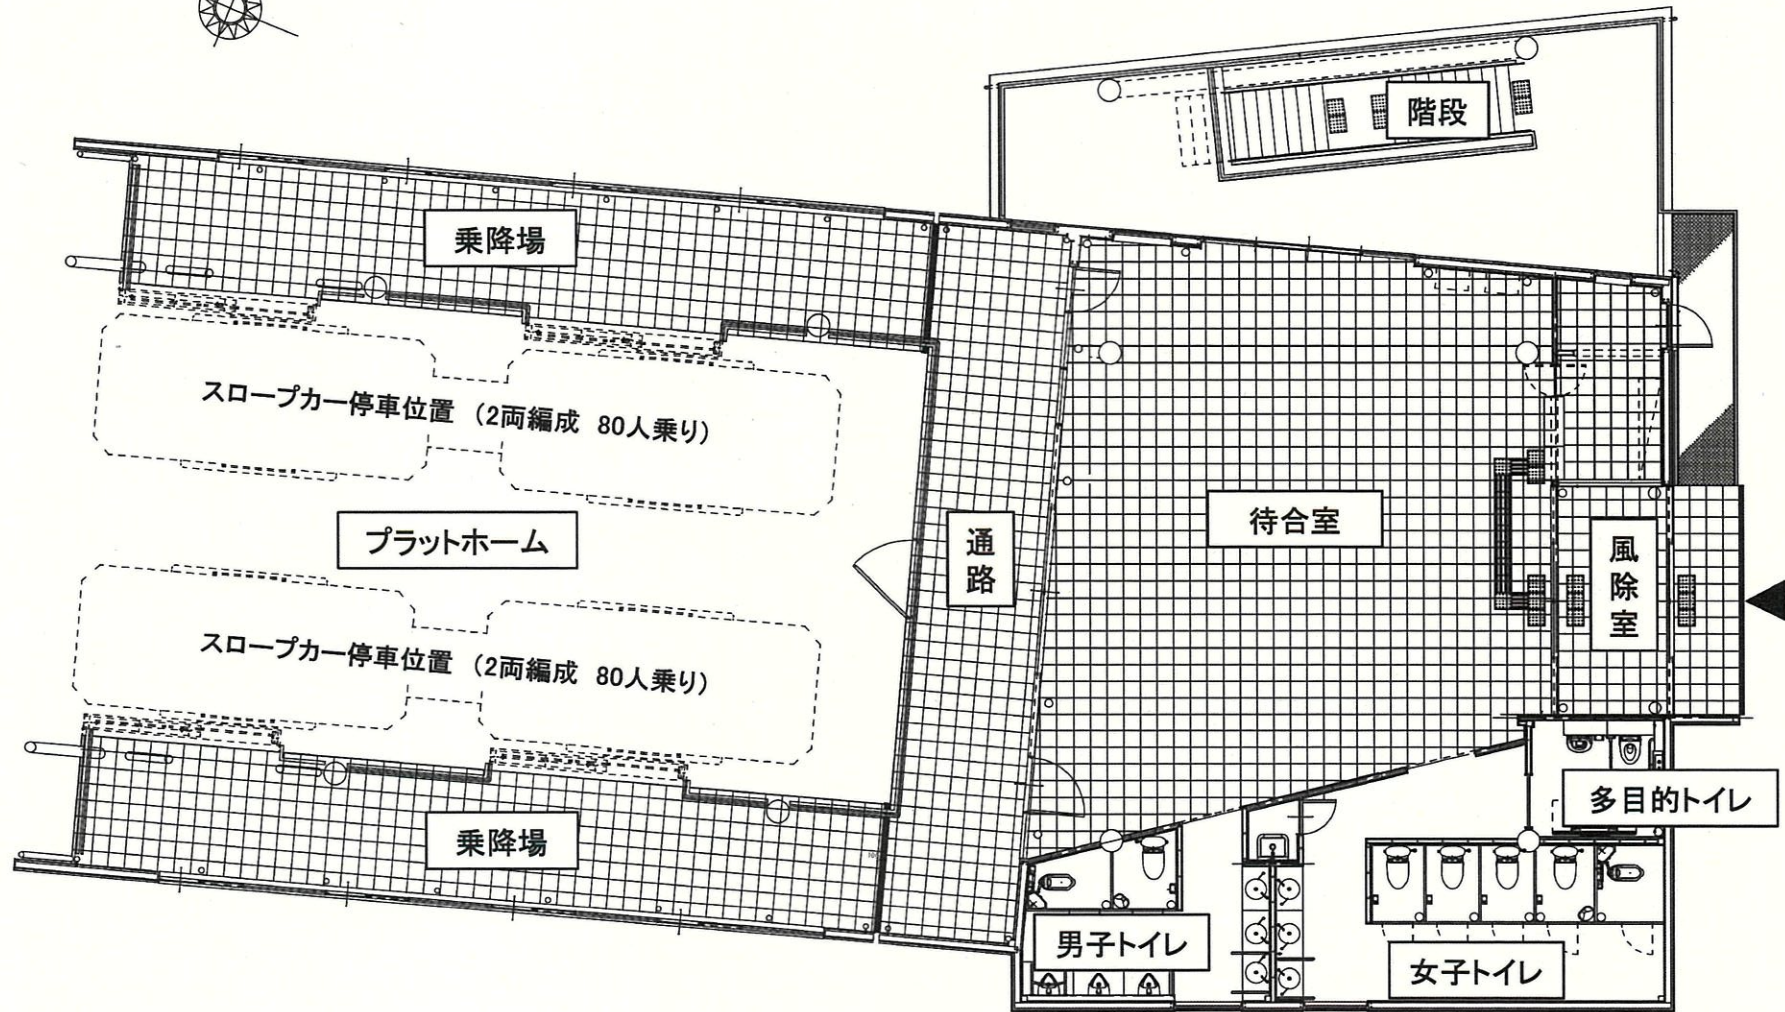


4


1 階 平 面 図

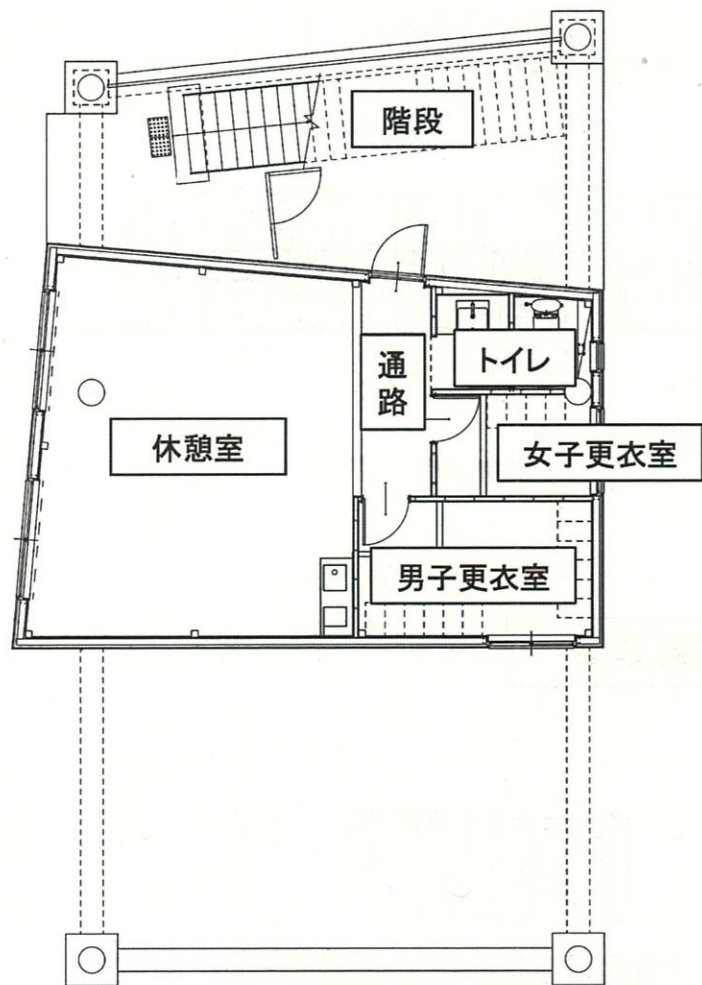


地下1階平面図

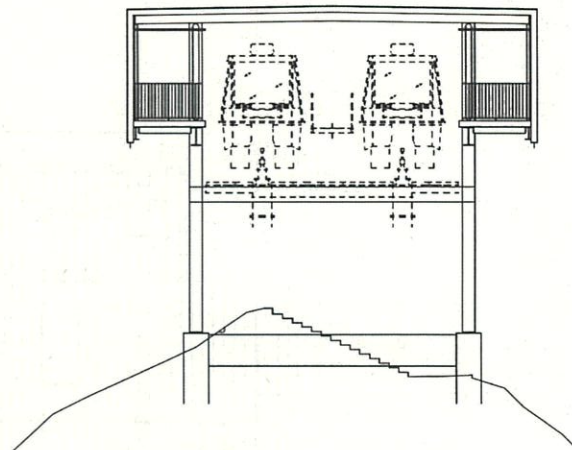


北立面図

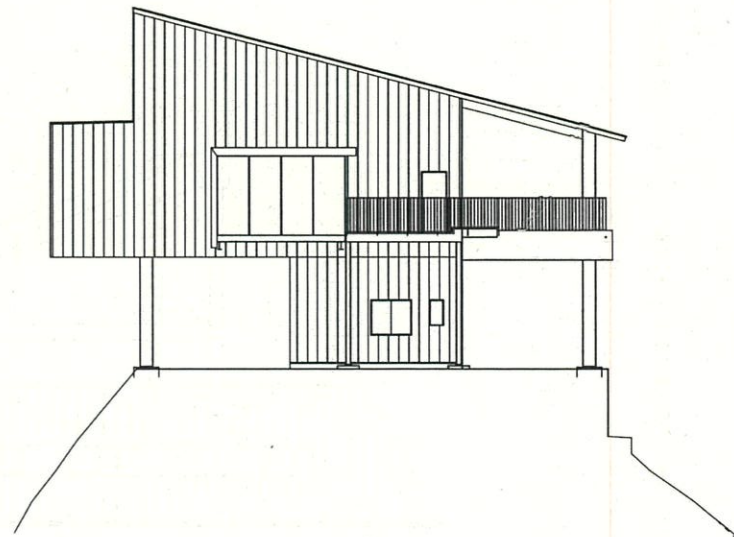

南立面図

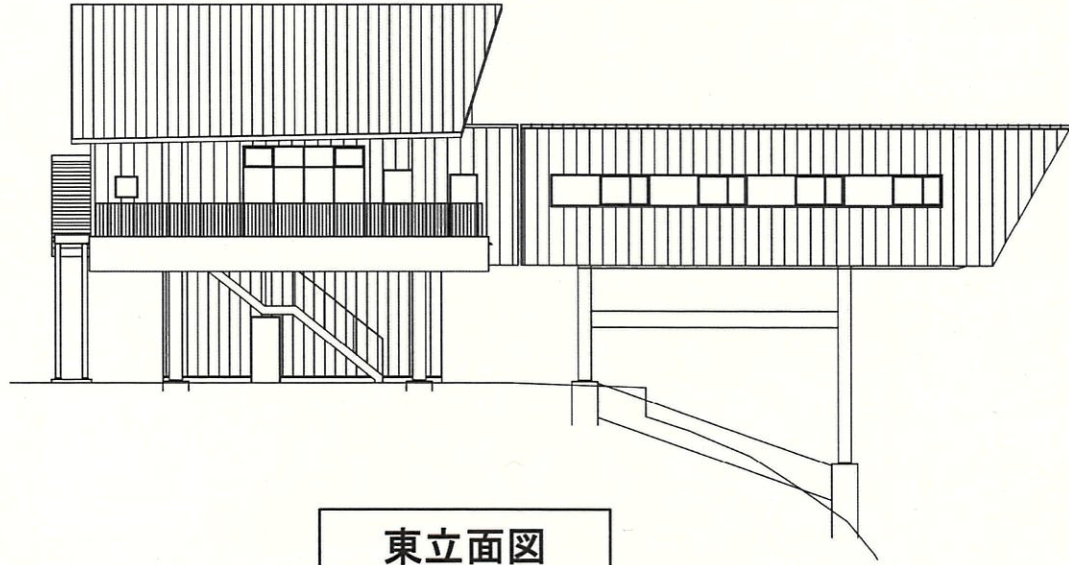

東立面图

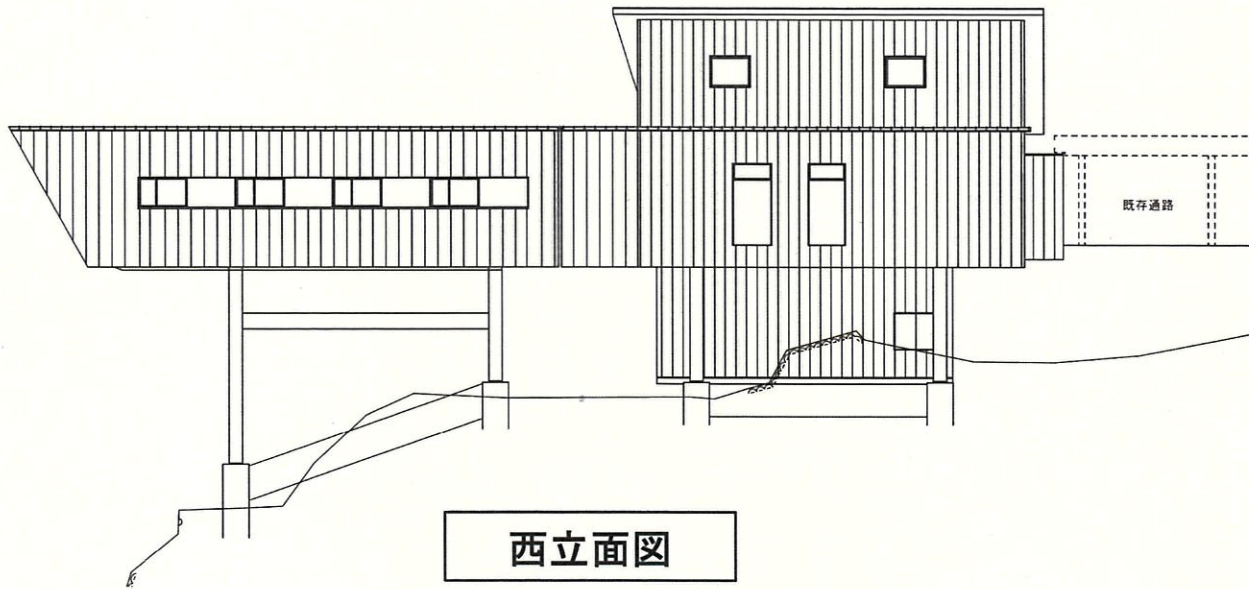

西立面图

施工状況写真




ロープウェイ駅舎側(南側)より

プラットフォーム側(北側)より

1 工事の請負契約の一部変更について

第66号議案資料		担当	理 財 部 ま ち づ くり 部 土 木 部
工 事 名		稲佐山公園斜面輸送施設設置工事	
工 期	変更前	議会の議決を得た日から平成31年7月17日まで	
	変更後	議会の議決を得た日から平成32年1月31日まで	
契約変更の理由		別途建設中の（仮称）稲佐山公園斜面輸送施設稲佐岳駅舎の完成が遅れるため、本件契約における同駅舎の電気工事等に要する期間を延長する必要が生じたことに伴い、工期を変更するもの。	
契約金額		991,053,360円	
相手方		<p>嘉穂・アダチ・三浦特定建設工事共同企業体</p> <p>福岡県飯塚市大分567番地 株式会社嘉穂製作所 代表取締役社長 植村 一雄</p> <p>長崎市元船町11番18号 アダチ産業株式会社 代表取締役 安達 健蔵</p> <p>長崎市竹の久保町16番15号 株式会社三浦工業所 代表取締役 三浦 学</p>	
工事概要		<p>1 工事場所 稲佐町</p> <p>2 工事内容 斜面輸送設備</p> <p>軌 条 2本</p> <p>延長 521.5メートル 1本</p> <p>519.3メートル 1本</p> <p>車 両 4両</p> <p>定 員 1両当たり40名</p> <p>編 成 2両編成</p> <p>形 式 跨座式モノレール</p> <p>走行速度 80メートル毎分</p> <p>安全装置 一式</p> <p>操作制御設備 一式</p>	


位置図

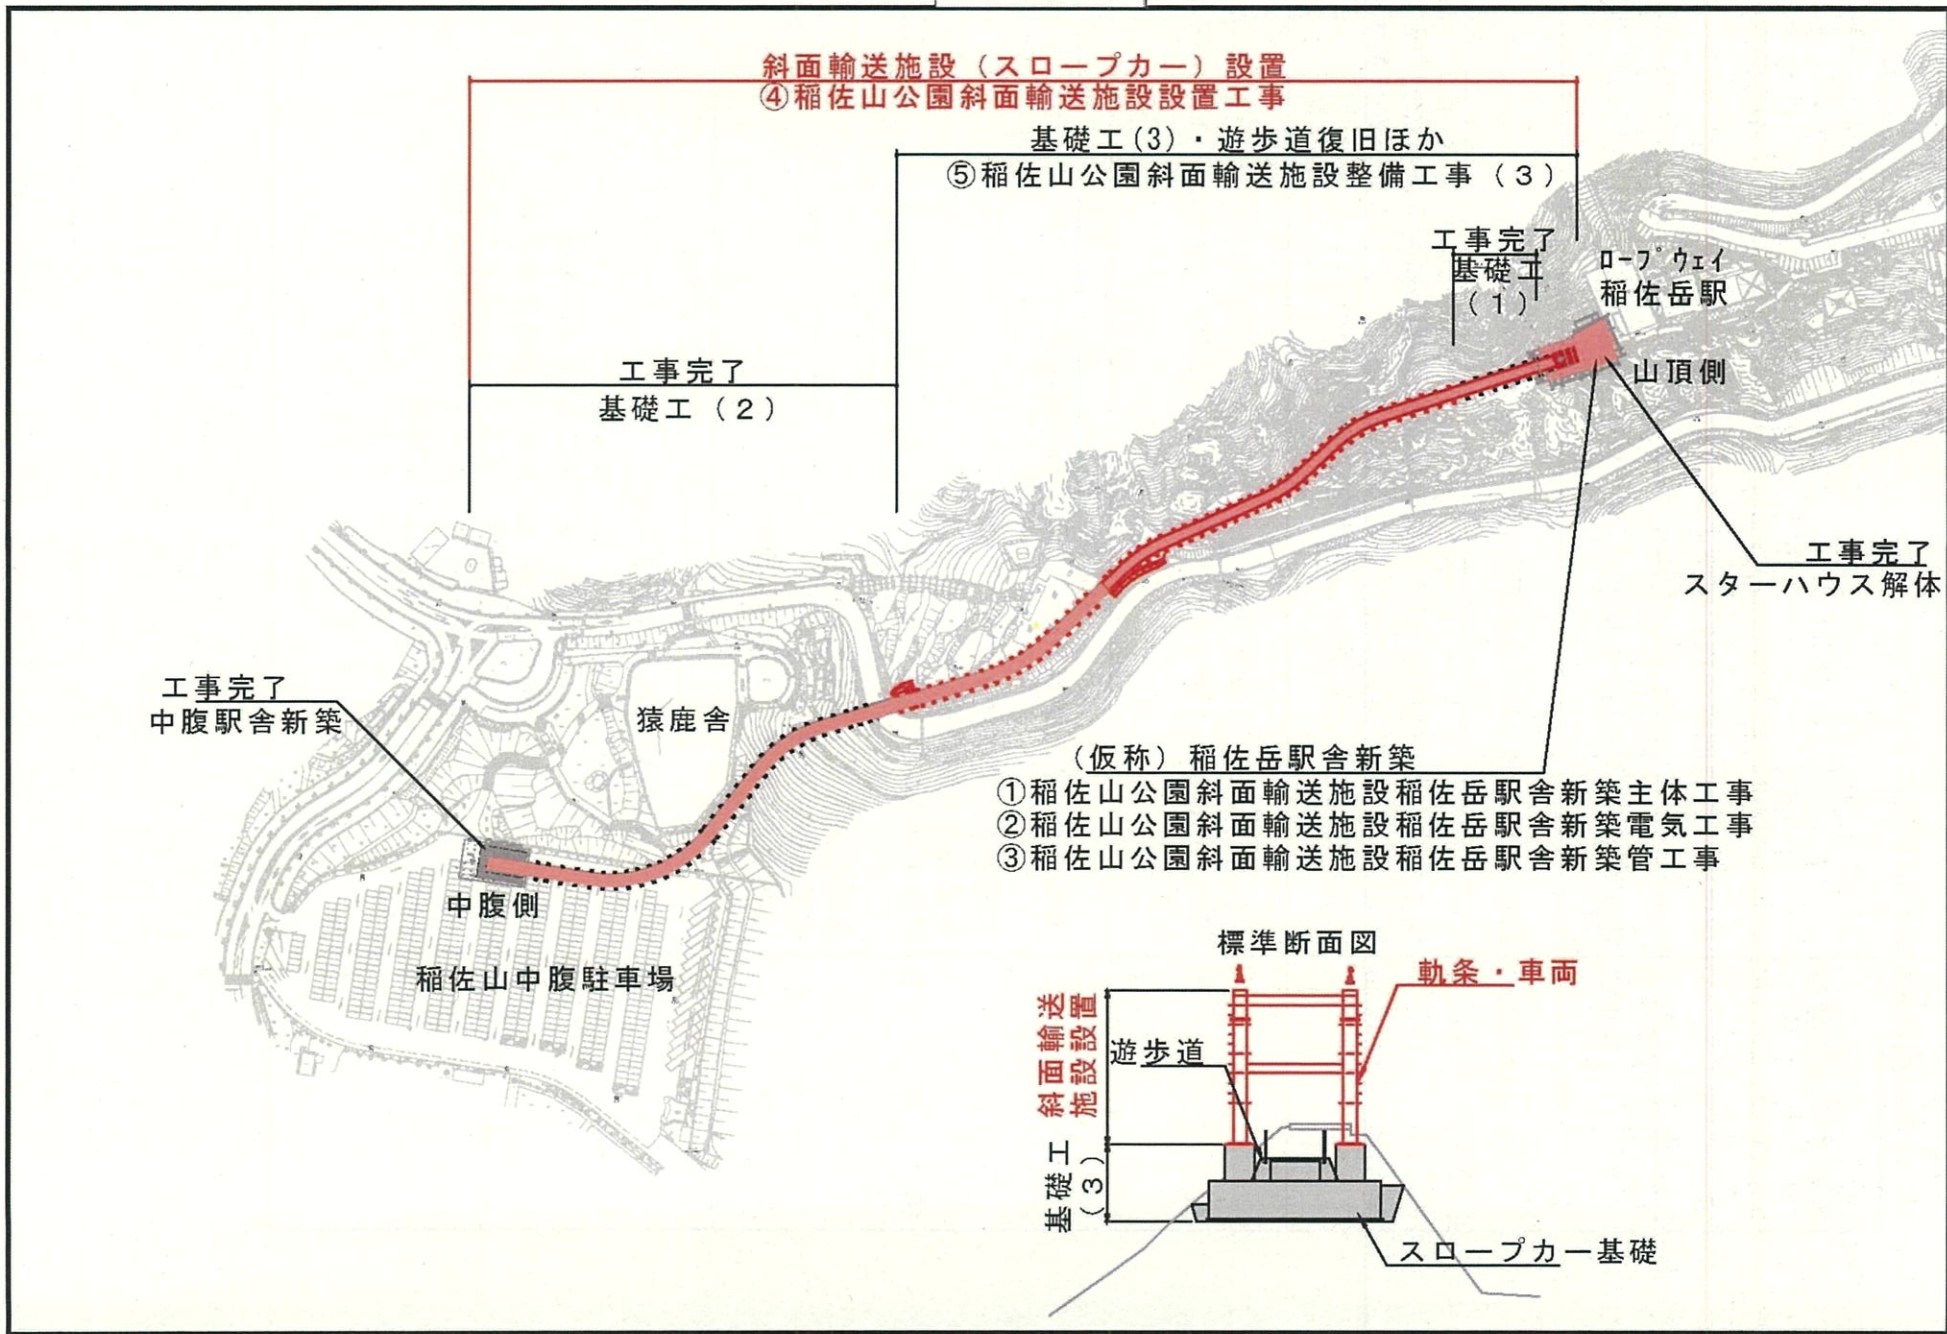


1 工事の請負契約の一部変更について


第67号議案資料		担当	理 財 部 土 木 部 ま ち づ くり 部
工 事 名		稲佐山公園斜面輸送施設整備工事（3）	
工 期	変更前	議会の議決を得た日から平成31年7月26日まで	
	変更後	議会の議決を得た日から平成31年11月29日まで	
契約変更の理由		別途建設中の（仮称）稲佐山公園斜面輸送施設稲佐岳駅舎の完成が遅れるため、本件契約における遊歩道の整備等に要する期間を延長する必要が生じたことに伴い、工期を変更するもの。	
契約金額		256,141,440円 （平成30年11月2日に専決処分して251,323,171円から変更）	
相手方		西海興業・本間建設特定建設工事共同企業体 長崎市平和町5番19号 株式会社西海興業 代表取締役 西山 潤一郎 長崎市宿町570番地4 本間建設株式会社 代表取締役社長 山本 清和	
工事概要		1 工事場所 稲佐町及び大浜町 2 工事内容 基礎工 51基 防護柵工 305.0メートル 重力式擁壁 66.0立方メートル ブロック積擁壁 207.0平方メートル 舗装工 447.0平方メートル 電源盤基礎工 2箇所 汚水管布設 337.0メートル 送水管布設 248.0メートル	

位置図

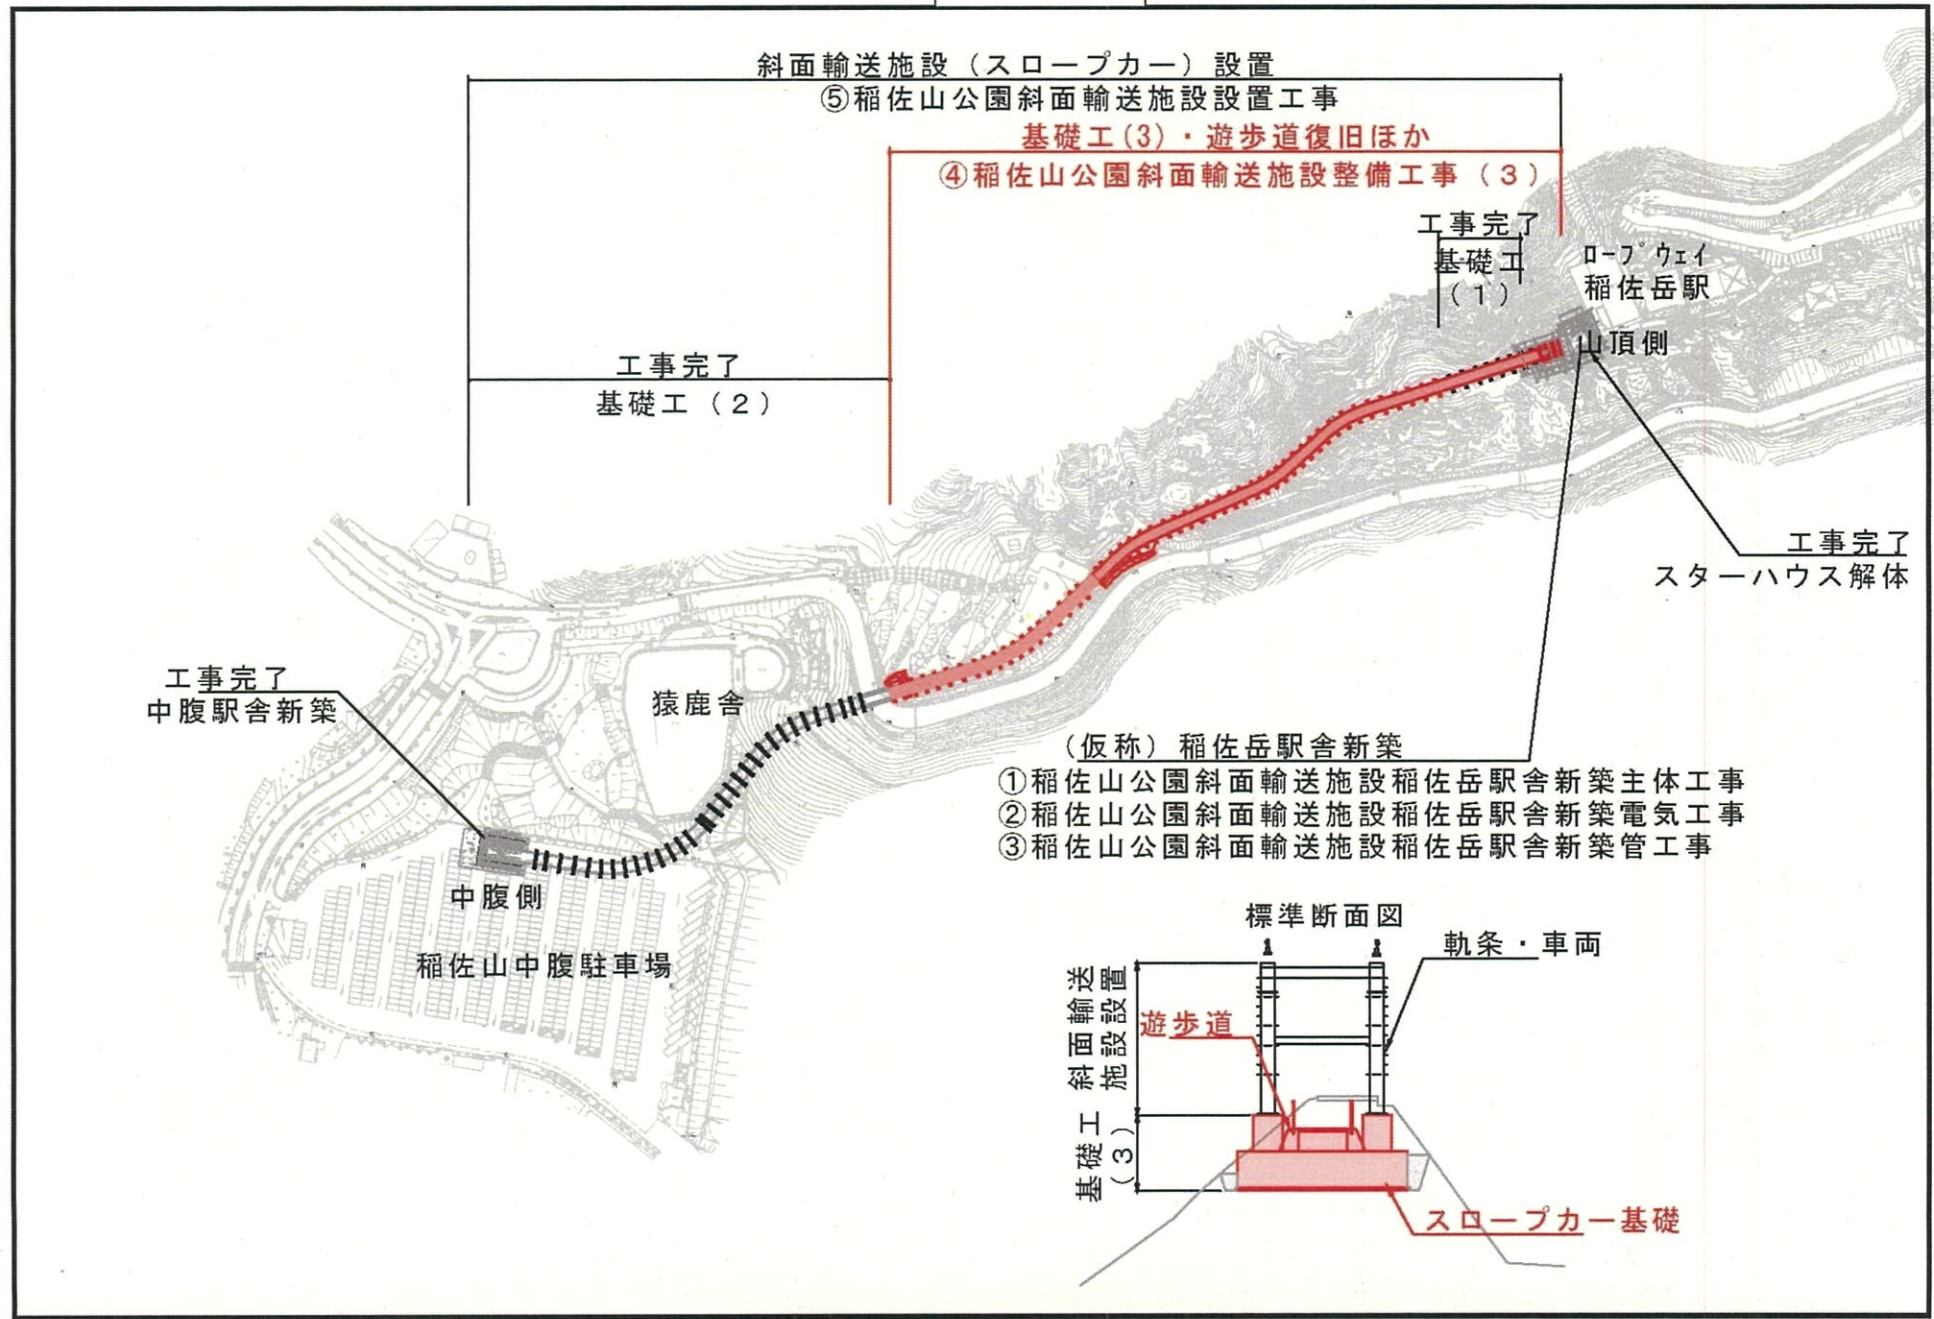

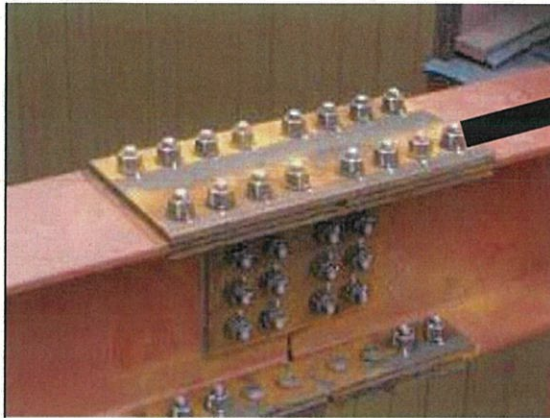

高力ボルトによる接合事例



高力ボルト



ボルトの材料となる
ワイヤーロッド



(仮称) 稲佐岳駅舎イメージ



スロープカーイメージ

航空写真 (平成 31 年 1 月 11 日撮影)



タワークレーン
