

令和元年 11 月市議会 建設水道委員会資料

第 178 号議案 工事の施行協定の一部変更について
市道大橋町赤迫 1 号線道路改良事業に係る立体交差
新設工事（Ⅱ期工事）

目 次

1	工事の施行協定の一部変更について	1 ページ
2	概要	2 ページ

土 木 部

令和元年 11 月




1 工事の施行協定の一部変更について


第178号議案資料		担当	土木部
件名	市道大橋町赤迫1号線道路改良事業に係る立体交差新設工事(Ⅱ期工事)		
施行期間	変更前	議会の議決を得た日(平成30年6月26日)から令和2年3月31日まで	
	変更後	議会の議決を得た日(平成30年6月26日)から令和3年3月31日まで	
協定変更の理由	擁壁工において、想定以上に転石が多く、杭打ち工事に不測の日数を要したこと等に伴い、工期を変更するもの。		
協定金額	340,000,000円		
相手方	福岡市博多区博多駅3丁目25番21号 九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 青柳 俊彦		
工事概要	1 工事場所 長崎市 中園町、赤迫1丁目及び柳谷町 2 工事内容 延長 9.0メートル 橋梁工 9.0メートル 土留擁壁工 86.0メートル 仮設工 一式		

2 概要

(1) 位置図

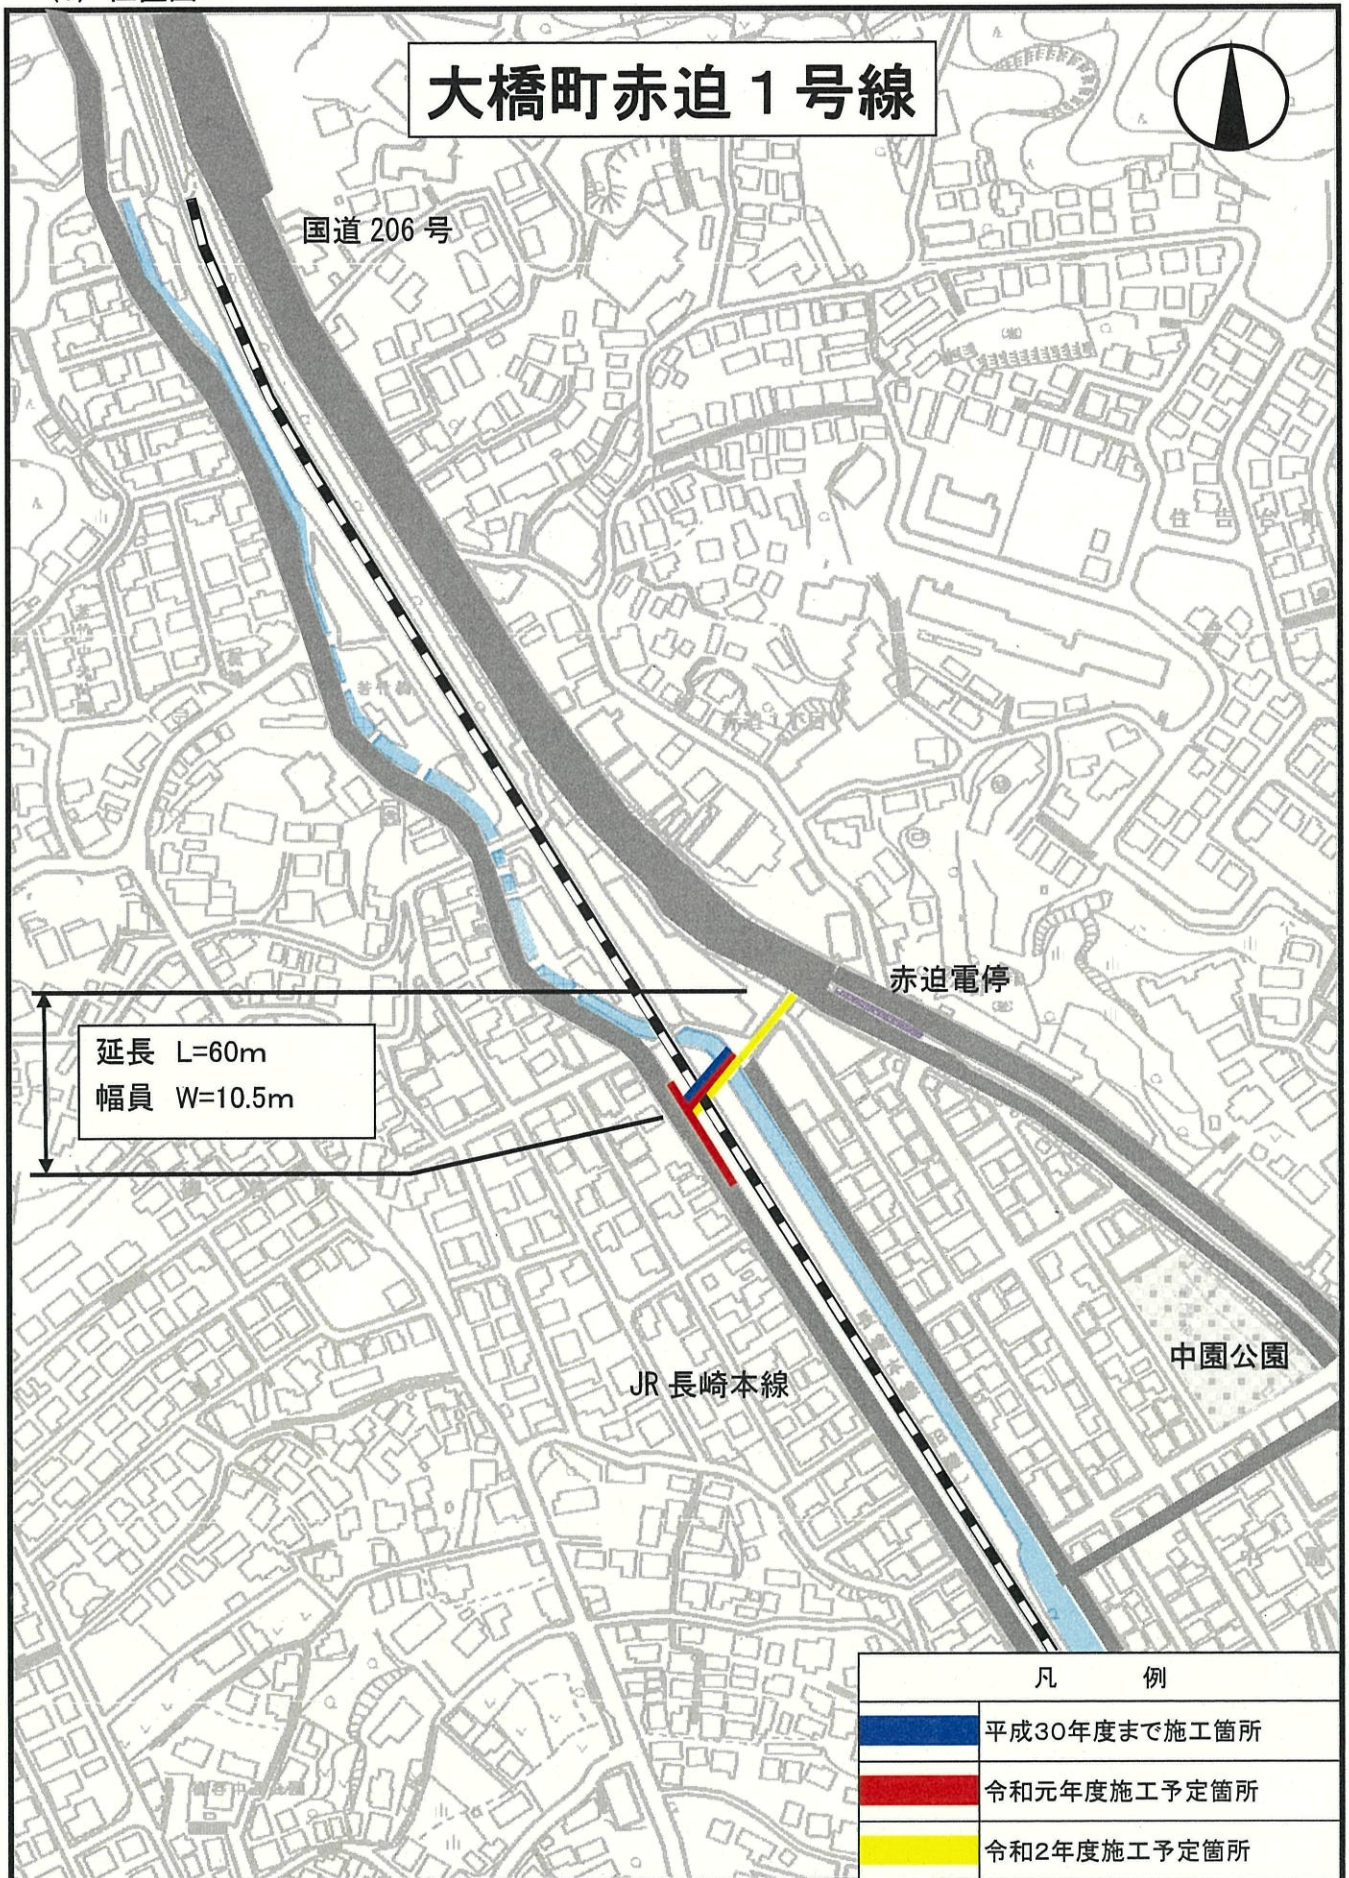

平面図

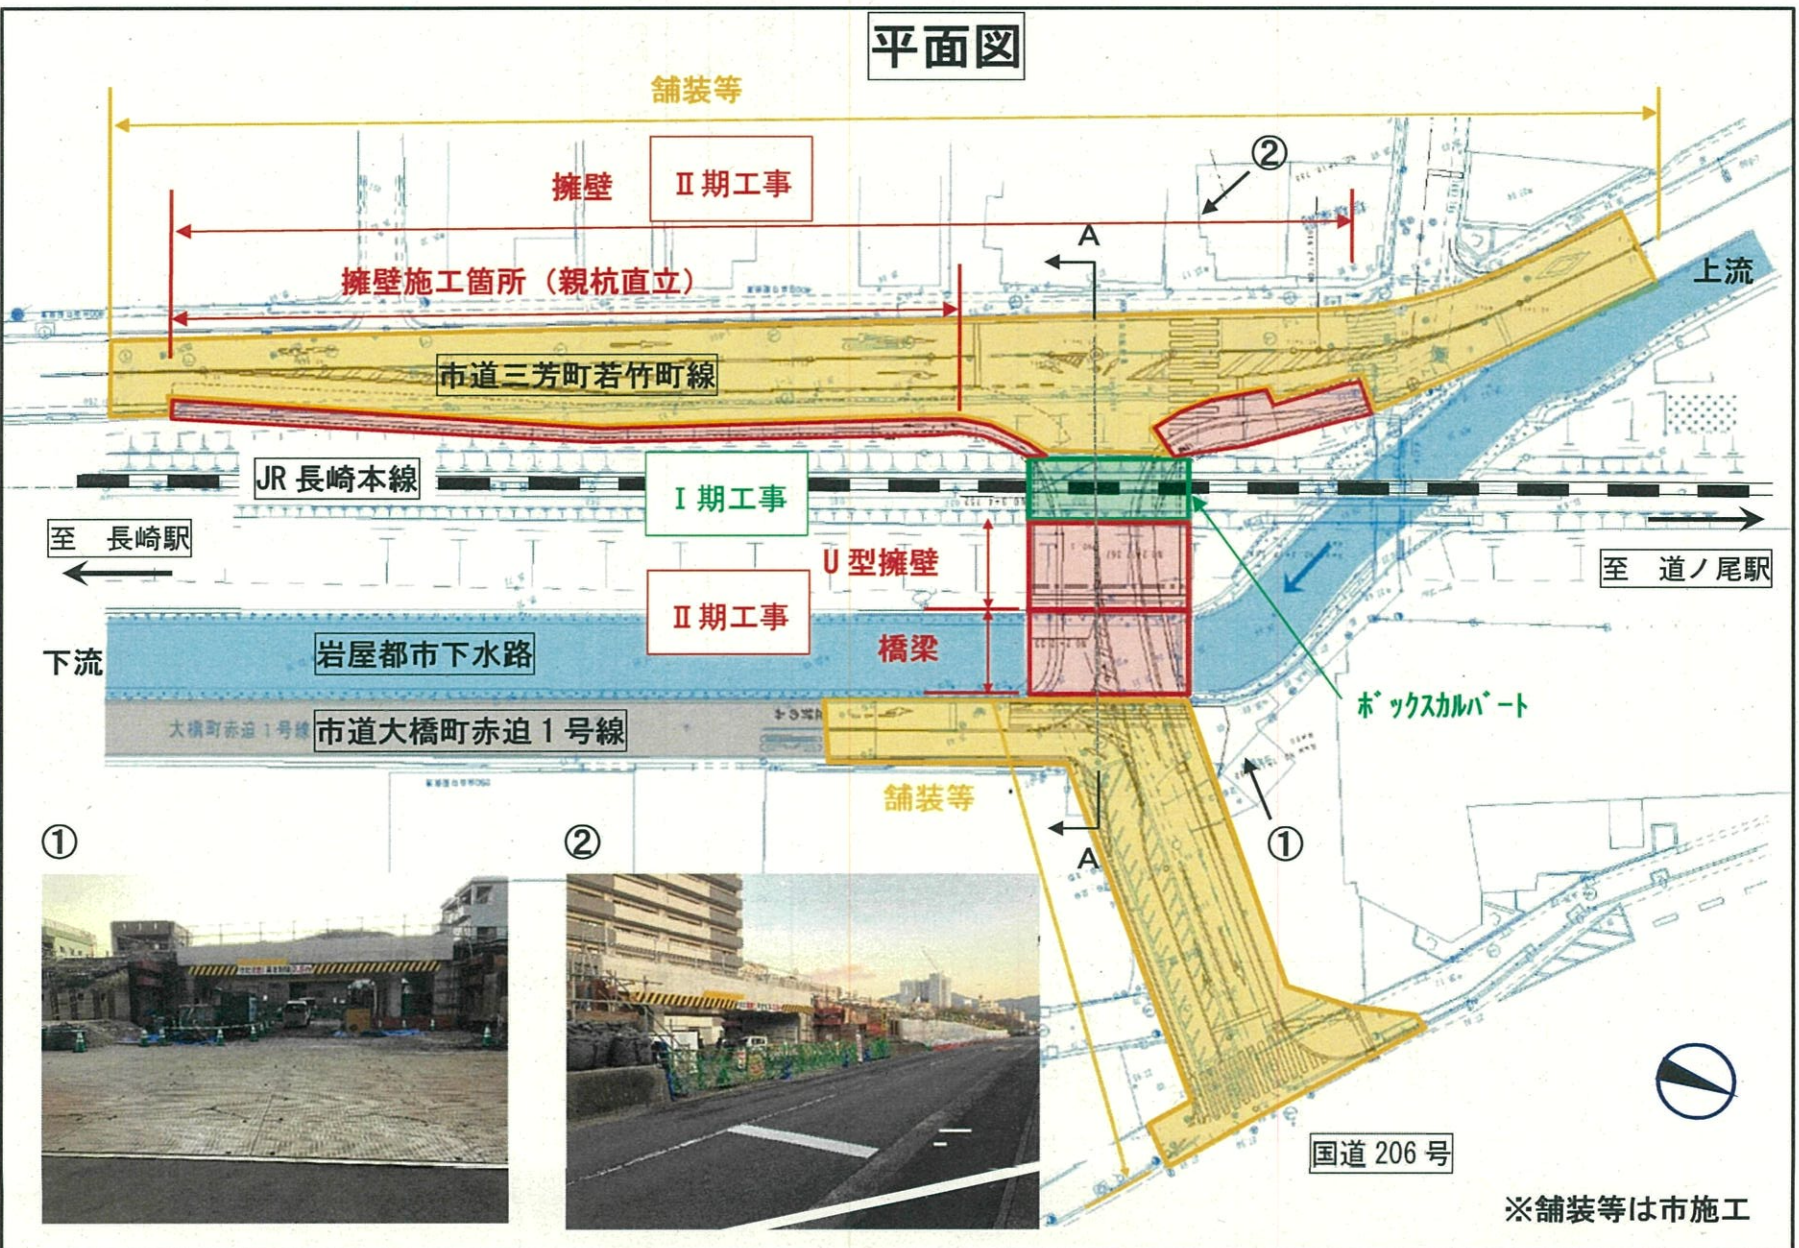


(3) 協定金額等の変更予定

現協定額	変更①	変更②	
仮設工 91,016千円	仮設工 121,849千円	73,440千円	市施工分
橋梁工 39,464千円	橋梁工 46,909千円	仮設工 83,376千円	
土留擁壁工 167,081千円	土留擁壁工 197,535千円	橋梁工 8,566千円	JR九州施工分
負担金工事費 42,439千円	負担金工事費 42,439千円	土留擁壁工 197,535千円	
負担金工事費 42,439千円	負担金工事費 42,439千円	負担金工事費 42,439千円	
合計 340,000千円	合計 408,732千円	合計 331,916千円	405,356千円




変更内容

変更①	工事期間の延長に伴う仮橋鋼材のリース料の増加、警察指示による交通整理員の配置増加などによる工事費の増額。
変更②	JR九州との協議に基づき、鉄道近接工事の範囲対象外である国道206号側の橋台1基及び橋梁上部工を長崎市が実施することに伴う協定金額の減額。

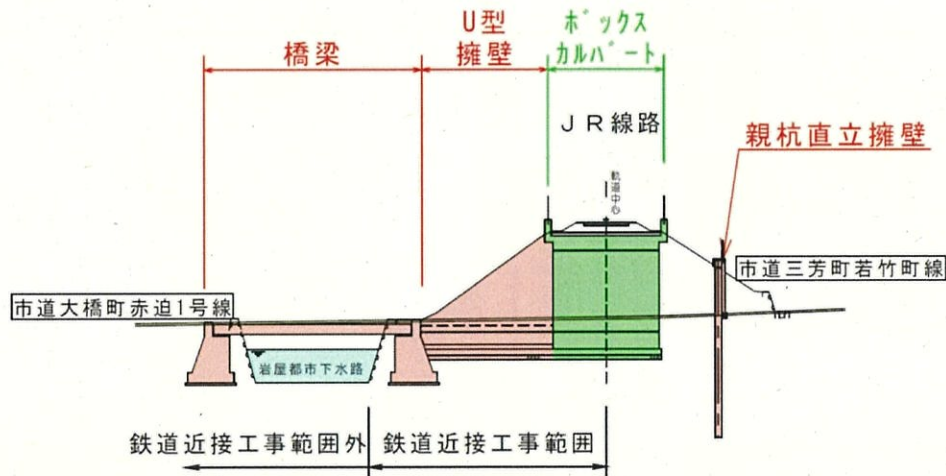A断面図(近接工事対象範囲)



工程表(Ⅱ期工事)

凡 例	
	見直し前(JR九州施工)
	見直し後(JR九州施工分)
	見直し後(市施工分)

(4) スケジュール予定

工 種	平成30年度												令和元年度												令和2年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
擁壁工	← 工法変更に伴う設計期 →												← 親杭直立擁壁 →												← L型擁壁(北側) →											
仮設 ヤード工																									← 仮設ヤード撤去 →											
盛土 復旧工																									← 盛土復旧 →											
橋梁工																									← 仮締切 → 下部工 → 上部工 → ← 仮締切・橋台工(JR側) → 仮締切・橋台工(国道側) → 緑石工 → ← 上部工 →											
護岸 復旧工																									← 護岸復旧(JR側) → 護岸復旧(国道側) → ← 護岸復旧 →											
U型擁壁																									← U型擁壁 → ← U型擁壁 →											
道路舗装 側溝 (当初から長崎市施工)																									← 側溝・重力式擁壁・舗装・区画線 →											
協定期間	← 基本協定(第Ⅱ期工事) 当初 H30.6.26~R2.3.31 →												← 基本協定(第Ⅱ期工事) 変更 H30.6.26~R3.3.31 →												← 基本協定(第Ⅱ期工事) 変更 H30.6.26~R3.3.31 →											
