

# 令和 7 年 6 月市議会 環境経済委員会資料

## 第 7 5 号議案 工事の請負契約の一部変更について 端島炭坑跡護岸施設補強工事（その 3）

| 目 次                          | ページ |
|------------------------------|-----|
| 1 工事の請負契約の一部変更について . . . . . | 2   |
| 2 概要 . . . . .               | 4   |

財務部・文化観光部・水産農林部  
令和 7 年 6 月


# 1 工事の請負契約の一部変更について

|               |       |                                                                                                                                                             |                                 |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 第 7 5 号議案資料   |       | 担 当                                                                                                                                                         | 財 務 部<br>文 化 観 光 部<br>水 産 農 林 部 |
| 工 事 名         |       | 端島炭坑跡護岸施設補強工事（その3）                                                                                                                                          |                                 |
| 契 約 金 額       |       | 3 6 4 , 7 9 0 , 8 0 0 円                                                                                                                                     |                                 |
| 工 期           | 変 更 前 | 議会の議決を得た日から令和7年7月31日まで<br>※議会の議決を得た日 令和6年9月20日                                                                                                              |                                 |
|               | 変 更 後 | 議会の議決を得た日から令和7年9月30日まで<br>※議会の議決を得た日 令和6年9月20日                                                                                                              |                                 |
| 契 約 変 更 の 理 由 |       | 作業船の調達において、荒天の影響により他の工事との調整に日数を要したことに伴い、工期を変更するもの。                                                                                                          |                                 |
| 相 手 方         |       | <p>F a c t o r y ・加藤産業特定建設工事共同企業体</p> <p>代表者 長崎市多以良町1551番地93<br/>株式会社 F a c t o r y<br/>代表取締役社長 山本 清和</p> <p>長崎市竹の久保町20番9号<br/>加藤産業株式会社<br/>代表取締役 加藤 博文</p> |                                 |


|         |                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 概 要 | <p>1 工事場所 高島町、伊王島町2丁目及び高浜町</p> <p>2 工事内容 延 長 38.9メートル</p> <p>護 岸 本 体 工 933立方メートル</p> <p>仮 設 材 製 作 工 106個</p> <p>仮 設 材 据 付 工 116個</p> <p>捨 石 工 1,077立方メートル</p> <p>仮 設 工</p> |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2 概要

護岸全周 1,150m

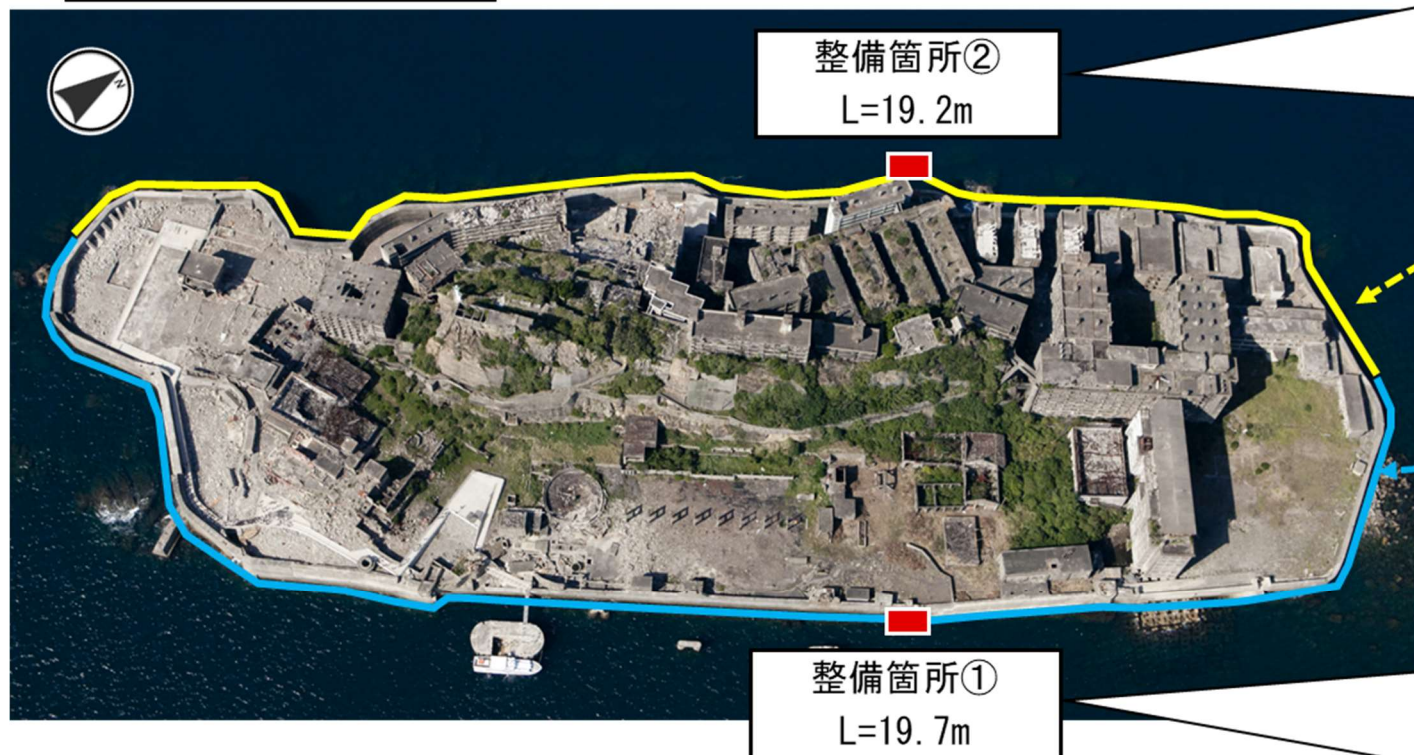

整備位置図

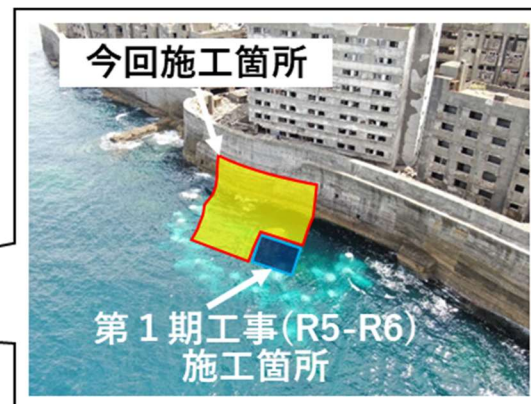


建設海岸（西側 560m）

管轄：国土交通省  
水管理・国土保全局


港湾海岸（東側 590m）

管轄：国土交通省港湾局


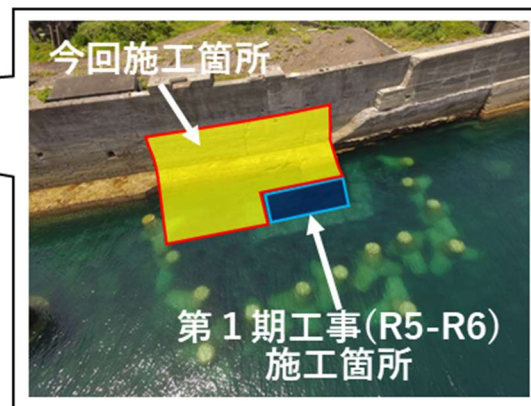


# 整備箇所①の工事概要

## ア 断面図

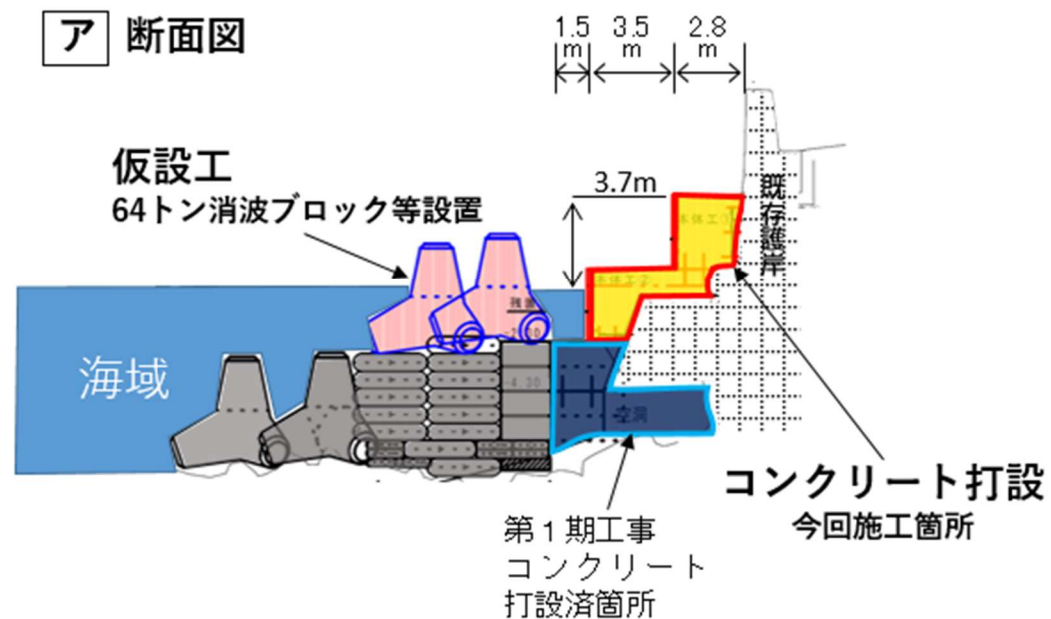


## イ 断面図


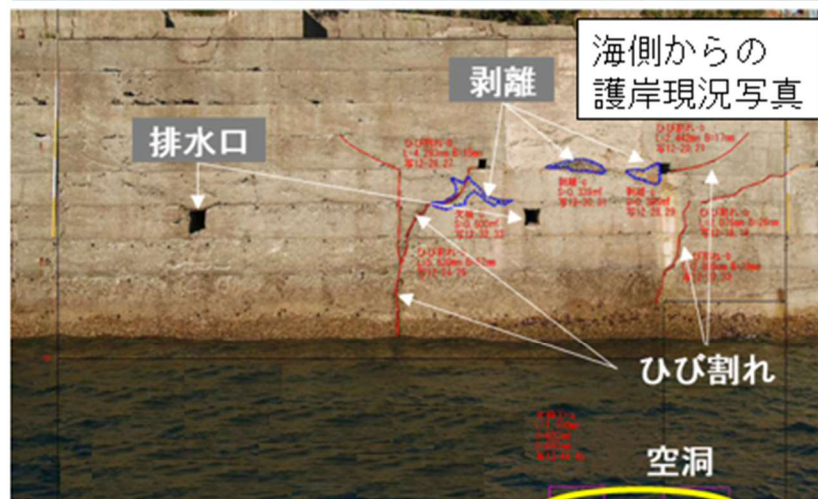
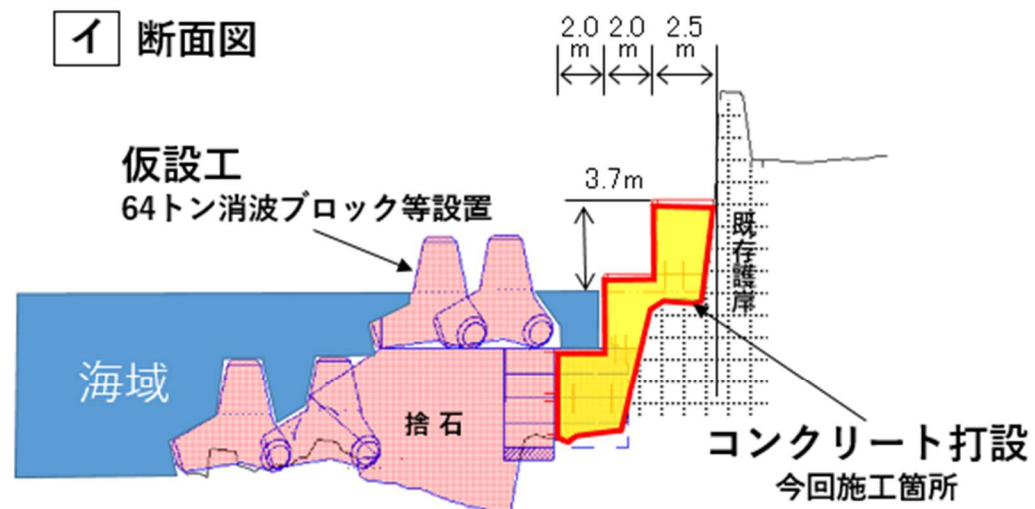


## 整備箇所②の工事概要

### ア 断面図

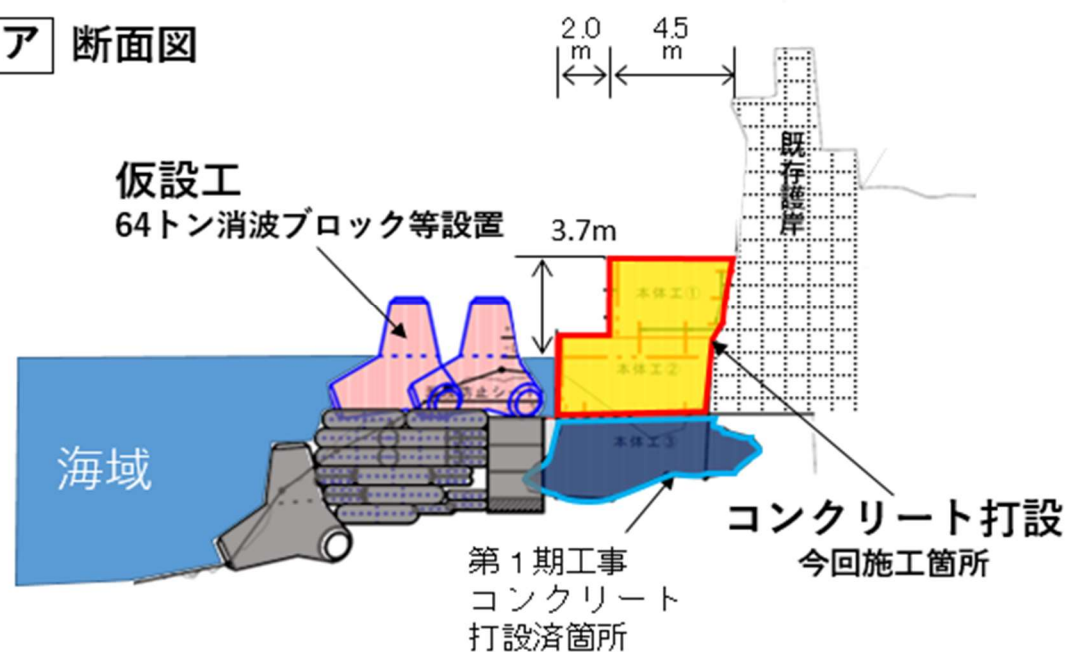

### イ 断面図

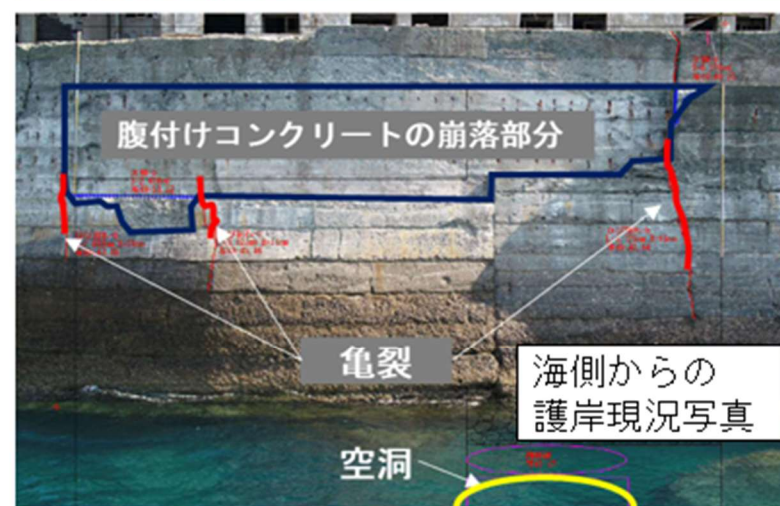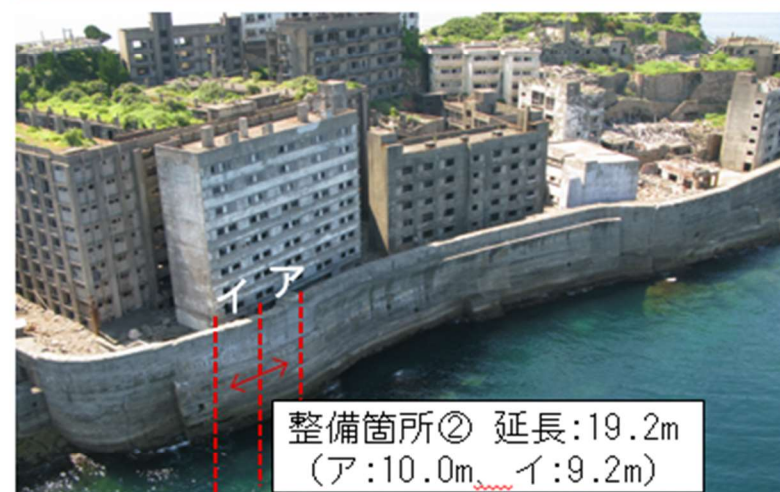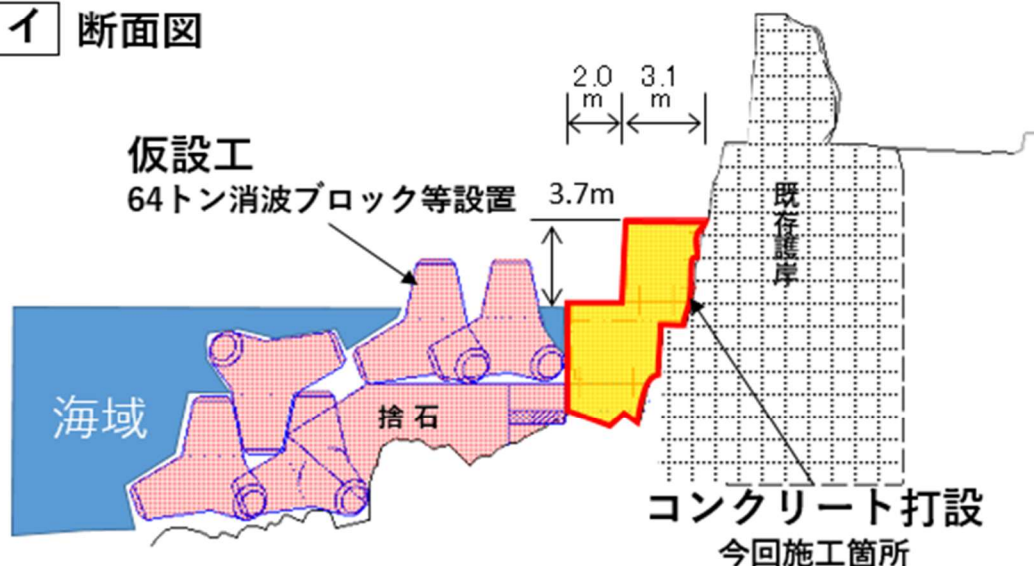

# 端島炭坑跡護岸施設補強工事（その3）工事スケジュール

| 時期<br>区分 | 令和5年度(2023)                                                                                                                                                              |      | 令和6年度(2024) |      |        |      | 令和7年度(2025) |      |        |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
|          | 10～12月                                                                                                                                                                   | 1～3月 | 4～6月        | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月        | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 |
| 整備工事     | <div>第1期 護岸整備工事</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 端島炭坑跡護岸施設補強工事（その1）</li> <li>・ 端島炭坑跡護岸施設補強工事（その2）</li> </ul> <div>【工期：R5年12月7日～R6年9月6日】</div> </div> |      |             |      |        |      |             |      |        |      |
|          | <div>第2期 護岸整備工事</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 端島炭坑跡護岸施設補強工事（その3）</li> </ul> <div>【工期：議決を得た日～R7年9月30日】</div> </div>                                |      |             |      |        |      |             |      |        |      |
| 世界遺産委員会  | <div> <div>●</div> <div>ユネスコ世界遺産センターへ<br/>第2期工事以降の護岸整備<br/>に関する報告書提出（12月）</div> </div> <div> <div>●</div> <div>世界遺産委員会で承認（7月）</div> </div>                               |      |             |      |        |      |             |      |        |      |
