

令和6年2月市議会総務委員会資料

第2号議案 令和5年度長崎市一般会計補正予算（第13号）

目次

繰越明許費補正

【単独】消防施設整備事業費 消防庁舎改修 …………… 2～4ページ

消 防 局

令 和 6 年 2 月

| 予算説明書【繰越明許費補正】 |          |          |            | 事業名                     | 繰越明許額       |
|----------------|----------|----------|------------|-------------------------|-------------|
| ページ            | 款        | 項        | 目          |                         |             |
| 54～55          | 9<br>消防費 | 1<br>消防費 | 3<br>消防施設費 | 【単独】消防施設整備事業費<br>消防庁舎改修 | 千円<br>6,600 |

## 1 繰越事由

南消防署の改修工事の入札において、人手不足の理由から応札業者がいなかったため入札不調となったもの。

再度入札を行うには適切な工期を確保する必要があり、年度内に事業が完了しないことから、予算の繰越が必要となったもの。

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事場所 | 小ヶ倉町3丁目76番78          |
| 工事内容 | ・内部改修工事<br>・電気、機械設備工事 |

## 2 経緯

| 時期      | 内容  |
|---------|---|
| 7月      | ・6月補正予算承認後(7月7日)、建築課及び設備課へ工事施工依頼提出(7月10日)   |
| 8月～9月   | ・建築課及び設備課と現地打合せを実施(8月22日)<br>・建築課及び設備課により、設計図面等の作成及び工事費の設計に係る見積書の徴取   |
| 10月～11月 | ・入札公告(10月31日)<br>・開札の結果(11月17日)<br>入札辞退等による入札不調 業者:0者<br>理由について、業者へヒアリングを実施したところ、現場代理人や下請けとなる設備業者がいなかったという人手不足が原因であることを聴取 |

## 3 入札結果

|            |                                       |      |           |
|------------|---------------------------------------|------|-----------|
| 件名         | 南消防署内部改修工事                            |      |           |
| 公告日        | 令和5年10月31日(火)                         |      |           |
| 予定価格       | 5,435,000円(消費税抜き)事前公表                 |      |           |
| 入札参加者資格事項等 | 工種:建築一式 地域要件:市内・認定市内<br>総合数値:1,000点未満 |      |           |
| 入札日        | 令和5年11月17日(金)                         |      |           |
| 工期         | 令和6年3月8日まで                            | 入札方式 | 制限付一般競争入札 |
| 入札情報       | 相手方名                                  | 結果   |           |
|            | (有)渡辺工業                               | 辞退   |           |
|            | 平石建設(株)                               | 辞退   |           |
|            | (株)稲佐                                 | 辞退   |           |
|            | 東亜電建工業(株)                             | 辞退   |           |

#### 4 スケジュール(予定)

|    | 令和5年度 |      |         |              | 令和6年度   |      |        |              |
|----|-------|------|---------|--------------|---------|------|--------|--------------|
|    | 4~6月  | 7~9月 | 10~12月  | 令和6年<br>1~3月 | 4~6月    | 7~9月 | 10~12月 | 令和7年<br>1~3月 |
| 当初 |       | 議会   | 設計・契約事務 | 工事施工         |         |      |        |              |
| 今後 |       |      |         | 議会           | 設計・契約事務 | 工事施工 |        |              |


#### 5 財源内訳

| 事業名                     | 金額        |             | 財源内訳    |         |             |         |           |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------|-------------|---------|-----------|
|                         |           |             | 国庫支出金   | 県支出金    | 地方債※        | その他     | 一般財源      |
| 【単独】消防施設整備事業費<br>消防庁舎改修 | 予算<br>現額  | 千円<br>6,600 | 千円<br>— | 千円<br>— | 千円<br>6,200 | 千円<br>— | 千円<br>400 |
|                         | 支出<br>予定額 | —           | —       | —       | —           | —       | —         |
|                         | 繰越<br>明許額 | 6,600       | —       | —       | 6,200       | —       | 400       |

※ 合併特例事業債 充当率95%(交付税措置率70%)

## 6 施設の現況等

### (1) 南消防署【小ヶ倉町3丁目】

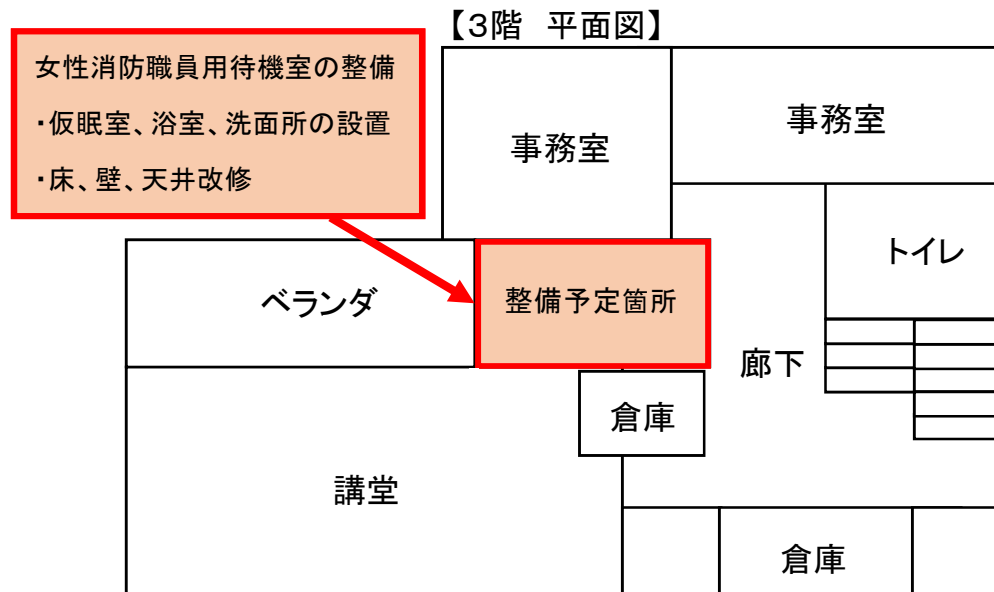

### (2) 改修後のイメージ

