

令和2年2月市議会建設水道委員会資料

第2号議案 令和元年度長崎市一般会計補正予算(第7号)

目次

ページ

[8款 土木費 1項 土木管理費]

2目 建築指導費

・繰越明許費


- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | アスベスト対策費補助金 | 1 |
| 2 | 民間建築物耐震化推進費補助金 | 2 |
| 3 | 【補助】耐震化推進事業費補助金 要緊急安全確認大規模建築物 | 3 |

建築部

令和2年2月



1 アスベスト対策費補助金

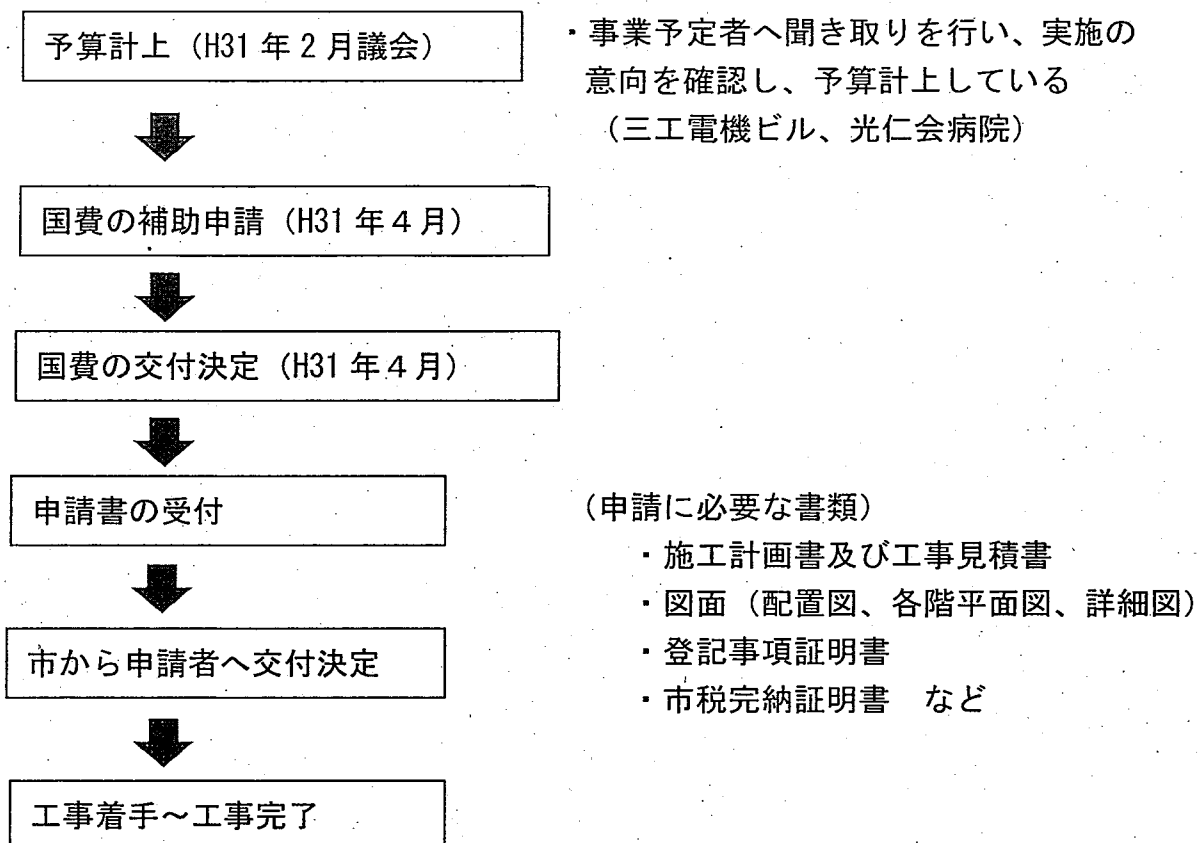


| | アスベスト調査 | 申請書 受付 | 交付決定 | 工事期間 |
|--------|---------|----------|------|-----------|
| 三工電機ビル | 平成30年度 | 令和2年3月予定 | — | 令和2年3月～6月 |

● 理 由

- ・ 建物の所有者が故人のため、相続手続きや兄弟間での同意に時間を要した。
- ・ 見積にあたって、業者によって工法や工事計画の内容の違いがあり、最終的な見積を取るのに時間を要した。

2 民間建築物耐震化推進費補助金

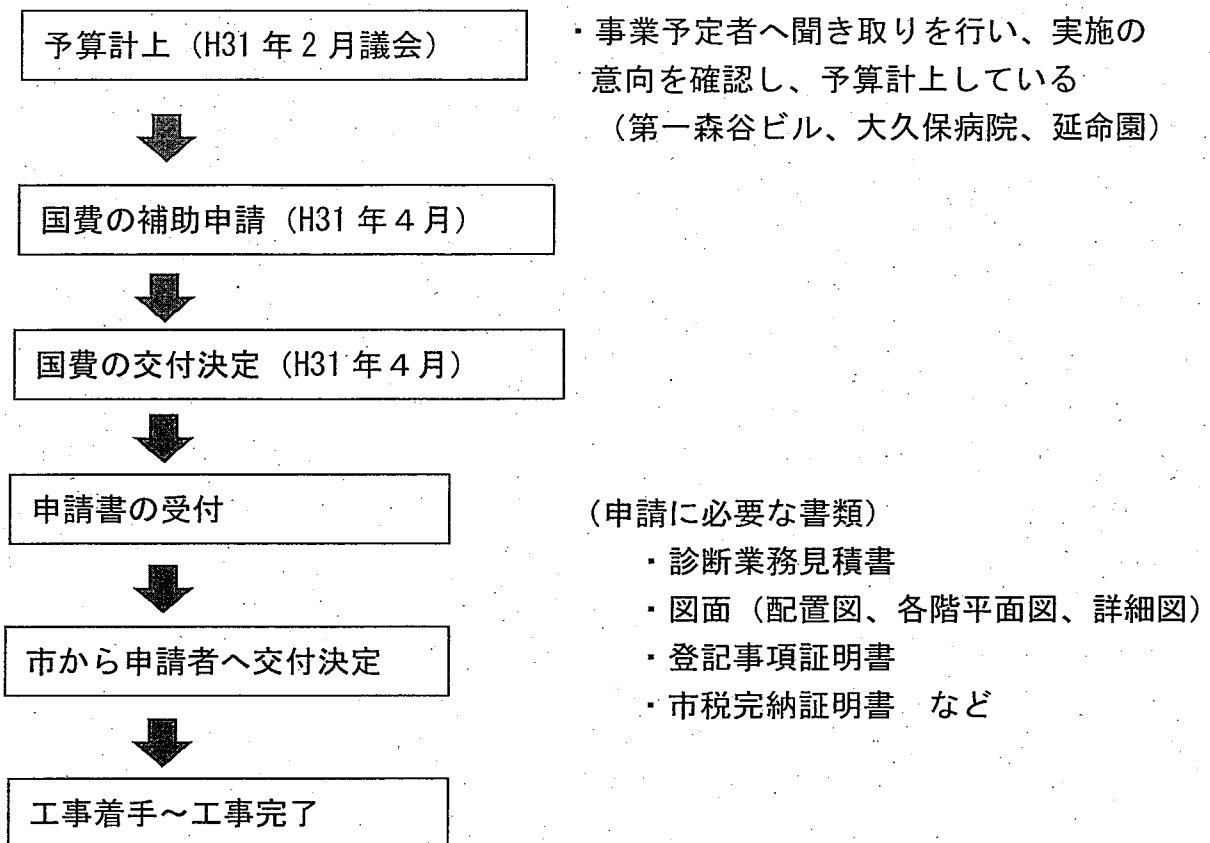


| | 申請書 受付 | 交付決定 | 工事期間 |
|-----|----------|------|-----------|
| 延命園 | 令和2年3月予定 | — | 令和2年3月～8月 |

● 理 由

- ・耐震診断業務は、現地にて、建物の壁の一部をコア抜きし、強度試験等を行う必要があるが、当該施設内で一定の騒音等を生じることから、耐震診断の実施日と施設利用の日程調整に時間を要した。
- ・調査後の耐震判定に時間を要する。

3 【補助】耐震化推進事業費補助金 要緊急安全確認大規模建築物

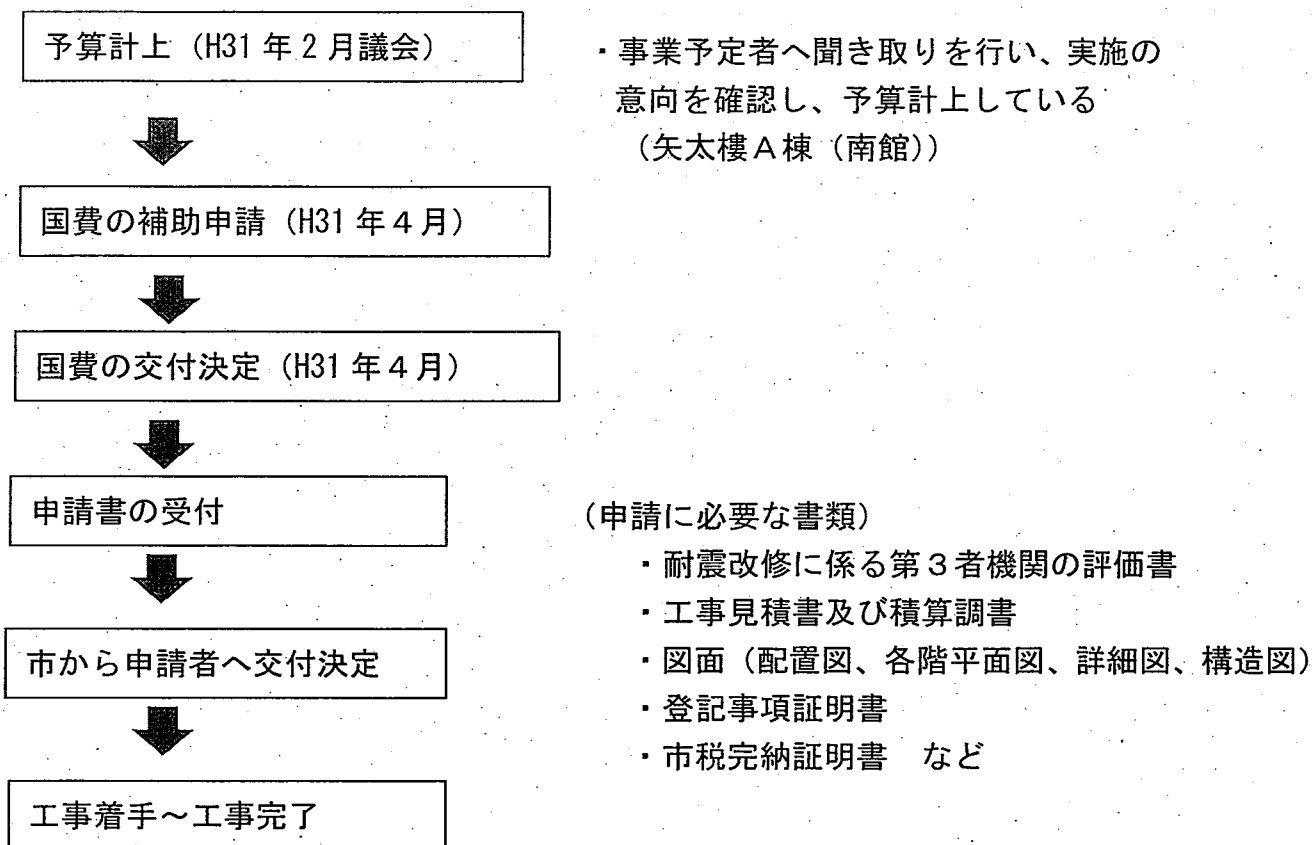

| | 申請書 受付 | 交付決定 | 工事期間 |
|---------------|---------|---------|-----------|
| 矢太樓A棟 (南館) | 令和元年12月 | 令和元年12月 | 令和2年2月～9月 |

● 理由

- ・一般の宿泊者や、2、3年先の修学旅行生の受入れ予約の調整等を踏まえ、ホテルの運営上、宿泊者の適切な受け入れ態勢等を維持することが必要であったことから、具体的な工法の選定に、十分な検討が必要であった。
- ・適切な工事期間を確保するために、工事着手時期や施工スケジュール等の調整・決定に、時間を要した。

