

第4号議案

令和2年度 長崎市一般会計補正予算(第19号)

目次

ページ

《2款 総務費 1項 総務管理費》

1目 一般管理費

〔債務負担行為補正〕

古賀地区市民センター指定管理 1

〔繰越明許費の補正〕

【単独】ふれあいセンター施設整備事業費
施設改修 2

16目 地域振興費

〔繰越明許費の補正〕

指定管理者候補者選定審査会費
(仮称)長崎のもざき恐竜パーク 3

【単独】離島・過疎地域振興対策事業費
野母崎田の子地区再整備 4

(参考)

長崎のもざき恐竜パーク整備の進捗状況について 5～7



債務負担行為補正		期 間	限度額 (設定額)
第4表 ページ	事 項		
11	古賀地区市民センター指定管理	令和3年度から 令和7年度まで	千円 44,760

1 債務負担行為の目的

長崎市古賀地区市民センターの管理において、古賀地区市民センター運営委員会を指定管理者として指定するにあたり、指定期間である令和3年度から令和7年度までの委託に係る経費について、債務負担行為の設定を行うもの。

2 債務負担行為限度額の内訳

(1) 限度額の年度内訳

【単位：千円】

令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計
8,952	8,952	8,952	8,952	8,952	44,760

(2) 限度額の積算内訳（年間運営経費）

【単位：千円】

年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計
収入	施設利用料	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	5,210
	収入計(A)	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	5,210
支出	人件費	7,206	7,206	7,206	7,206	7,206	36,030
	事務費	2,568	2,568	2,568	2,568	2,568	12,840
	修繕料	220	220	220	220	220	1,100
	支出計(B)	9,994	9,994	9,994	9,994	9,994	49,970
市所要額(B)-(A)		8,952	8,952	8,952	8,952	8,952	44,760

3 財源内訳

事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
千円 44,760	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 44,760


〔繰越明許費〕予算説明書 48～49 ページ

2款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】ふれあいセンター 施設整備事業費 施設改修	予算現額	17,538	—	—	16,600	—	938
	支出予定額	11,018	—	—	10,500	—	518
	繰越明許額	6,520	—	—	6,100	—	420
繰越事由	地権者との用地交渉に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和3年6月						

【位置図】

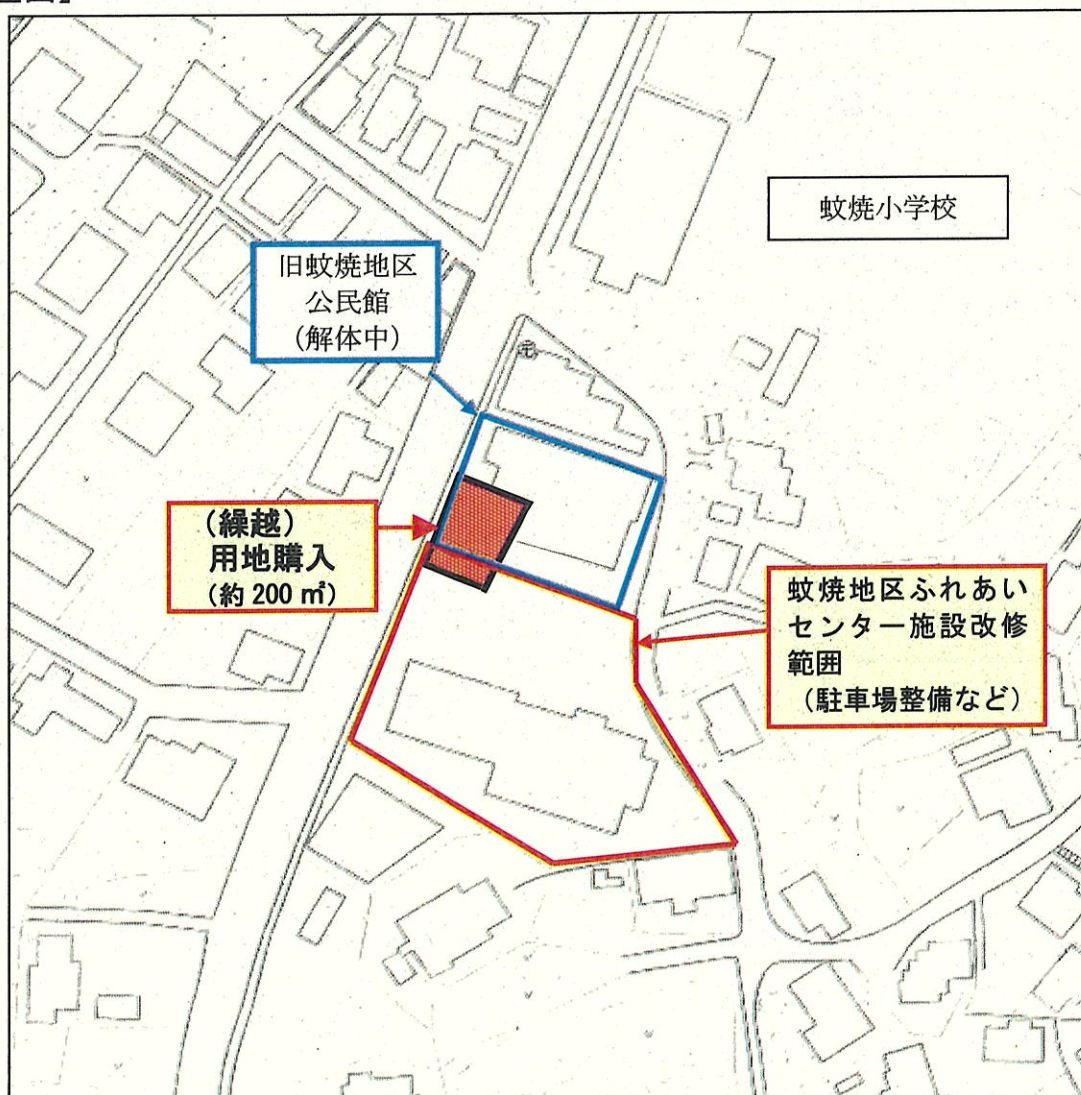

[繰越明許費]予算説明書 50～51 ページ

2款 総務費 1項 総務管理費 16目 地域振興費

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
指定管理者候補者選定 審査会費 (仮称)長崎のもぞき恐 竜パーク	予算現額	357	—	—	—	—	357
	支出予定額	47	—	—	—	—	47
	繰越明許額	310	—	—	—	—	310
繰越事由	指定管理者の応募がなかったことにより、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和3年6月						

1 経過と今後のスケジュール

時期	内容
令和2年10月27日	第1回長崎のもぞき恐竜パーク指定管理者候補者選定審査会 (募集要項及び審査基準の検討)
令和2年10月30日から 令和3年1月7日	公募実施
令和3年2月8日	第2回長崎のもぞき恐竜パーク指定管理者候補者選定審査会 (現地視察及び再公募の募集要項の検討)
令和3年2月15日から 令和3年4月19日	再公募実施
令和3年4月下旬	第3回長崎のもぞき恐竜パーク指定管理者候補者選定審査会 (書類審査)
令和3年5月初旬から中旬	第4回長崎のもぞき恐竜パーク指定管理者候補者選定審査会 (面接審査)

〔繰越明許費〕 予算説明書 50～51 ページ

2 款 総務費 1 項 総務管理費 16 目 地域振興費

(単位:千円)

事業名	金額		財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】離島・ 過疎地域振興 対策事業費 野母崎田の子 地区再整備	予算現額	556,800	—	—	556,800	—	—
	支出予定額	148,300	—	—	148,300	—	—
	繰越明許額 11月補正	286,500	—	—	286,500	—	—
	繰越明許額 2月補正	122,000	—	—	122,000	—	—
	繰越明許額	408,500	—	—	408,500	—	—

1 概要

「恐竜博物館建設」に伴い来場者の増加が見込まれるため、こども広場や駐車場など博物館周辺施設の再整備を行うことにより、市民が憩える安全・快適な広場環境の充実に図るもの。

2 繰越内容

工事費：408,500千円

造成工事 一式、駐車場ほか舗装工事 一式 等

3 繰越理由

恐竜広場において、施工方法の検討などに不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

4 事業完了予定 令和3年8月

長崎のもぎき恐竜パーク整備の進捗状況について

1 長崎のもぎき恐竜パークについて

【長崎のもぎき恐竜パーク設置目的】

野母崎地区において学習、文化、スポーツ及び地域交流の場を一体的に提供することにより、市内外の人々の来訪及び市民の活動を促し、もって地域の活性化及び観光の振興に資する。



【恐竜パークの構成】

- ・長崎市恐竜博物館
- ・恐竜広場（体育館、庭球場、インフォメーションセンター、休憩所、こども広場、駐車場、多目的広場、水仙の丘）
- ・長崎市野母崎文化センター
- ・長崎市軍艦島資料館

【供用開始に向けての主な取り組み】

- ・供用開始 令和3年10月29日
- ・供用開始までの取り組み
 - 2～3月 旅行代理店等へのPR（下期旅行商品プロモーション）
 - 4月～ 市民向けプロモーション（パブリシティ、広報誌等を活用）
 - 8月～ 県外全国向けプロモーション（指定管理者等と連携 テレビスポット等含む）

【管理運営（指定管理）】

恐竜パーク全体を一体的に活用するために、全体を指定管理で運営する。

1回目公募 締切 令和3年1月7日（木） 応募者なし
説明会参加者を対象にアンケート調査及び課題等を分析

課題等の分析概要


- ①委託料関係 ・野母崎まで誘客するためのPR経費
- ②仕様書等 ・一体的管理運営を行うための事務の簡素化
・企画展の開催方法
- ③新型コロナウイルス感染症関係 ・目標設定や影響の考え方
- ④その他 ・応募資格の範囲の拡大（市外事業者の単独応募可）

2回目公募 2月15日（月）～4月19日（月）
選定委員会（予定）4月下旬～5月上旬（ゴールデンウィーク前後）
7月1日から一部の指定管理業務を行い10月29日開設

2 恐竜博物館整備について

【事業概要】 長崎半島において白亜紀後期の三ツ瀬層（約8100万年前）からティラノサウルス科の歯の化石をはじめ、恐竜・翼竜など多種多様な化石が発見されており、それらをもとにその当時の長崎の情景が描けることは専門家からも高い評価を受けている。これら長崎の自然史における貴重な財産を有効に活用して、調査研究、資料の収集、展示、教育活動に資するため、恐竜博物館を建設する。

- (1) 全体計画
事業期間：平成30年度～令和3年度
総事業費：2,097,040千円（予算ベース）
- (2) 施設概要
開館日：令和3年10月29日
観覧者数：年間約12万人（目標）
構造：鉄筋コンクリート造（一部2階建）
延床面積：2,594㎡（1階2,401㎡、2階193㎡）
- (3) 令和2年度事業
事業費：1,037,900千円
事業内容 ①建築工事（建築主体工事、展示室内装工事ほか）
②研究機器、標本、備品等の取得
③案内・広告看板、
恐竜オブジェの制作（博物館前1基）
- (4) 令和3年度事業
事業費：216,400千円
事業内容 ①展示物製造請負業務
②恐竜オブジェの制作（国道沿線3基）

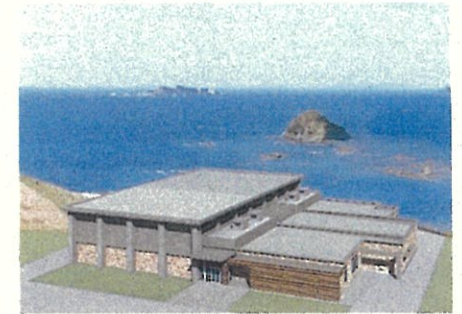

3 恐竜パーク整備（野母崎田の子地区再整備）について

【事業概要】 長崎のもぎき恐竜パーク開設に伴い、来場者が憩える安全・快適な施設環境を整備し、地域の活性化を図る。

- (1) 全体計画
事業期間：平成31年度～令和3年度
総事業費：654,620千円
- (2) 令和2年度事業
事業費：558,800千円
事業内容 ①用地買収（4筆）、建物等移転補償（既存建物1棟）
②恐竜広場の整備工事（8月末完了予定）
③インフォメーションセンターの建物改修
- (3) 令和3年度事業
事業費：72,500千円
事業内容 ①国道側から見た博物館への景観整備
②恐竜広場の環境整備（トイレ整備1棟）
③インフォメーションセンターの玄関口整備



長崎のもぎき恐竜パーク整備の進捗状況について

4 項目（工事）別スケジュール

番号	項目	令和2年度			令和3年度							1月末時点 進捗率(%)		
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1-1	恐竜博物館建設工事 (主体)	本体工事			3/19									83 予定 82 実施
1-2	主体電気工事	電気工事			3/19									60 57
1-3	主体管工事	管工事			3/19									53 58
2-1	恐竜博物館展示室内装及び 外構工事(建築)	展示室内装・外構工事			5/14完了予定							18 17		
2-2	展示室電気工事	電気工事			4/23完了予定							31 20		
2-3	展示室管工事	管工事			4/23完了予定							20 20		
2-4	恐竜博物館展示施工業務				展示施工							35 35		
3-1	トリックス骨格標本				6/30							10/23 契約		
3-2	恐竜オブジェ(博物館前)				6/30							11/6 契約		
3-3	標本取得				10/28							6/15 契約		
4	野母崎文化センター外壁・ 屋根、内部改修工事	外壁・屋根工事			3/19	内部改修工事				9/15	70 70			
5	敷地造成工事 ①	造成工事		2/12	3/26	4/30							63 64	
6	駐車場ほか舗装工事 ①	舗装工事		2/26	3/26	4/30							87 13	
7	公園便所解体工事	解体工事			4/16								1/20 契約	
8	倉庫解体工事	解体工事			4/9								1/27 契約	
9	給排水管布設ほか工事 ②	給排水管布設ほか工事			6/30							1/26 公告		
10	広場等舗装工事 ③	広場等舗装工事			8/26							1/26 公告		
11	公園施設整備等工事 ③	施設整備等工事			8/31							2/9 公告		
12	公園遊具等整備工事 ④	遊具等設置工事			8/23							1/27 契約		
13	公園灯設置工事 ④	公園灯設置工事			6/30							2/16 公告		
14	インフォメーションセンター 改修工事	改修工事			3/18								50 45	
15	インフォメーションセンター エントランス・外構整備工事				エントランス・外構整備工事							8/30	令和3年度 工事	
16	国道499号歩道舗装工事	舗装工事			3/25								1/27 契約	
17	公園トイレ設置工事				トイレ設置工事							9/30	令和3年度 工事	
18	物産センター、ふれあい市場、 公園管理棟撤去、広場整備				解体・広場整備工事							10/15	令和3年度 工事	
19	恐竜パーク指定管理(予定)	公募	選定	議決	公募	選定	議決	指定管理業務						
20	恐竜パークプロモーション	下期旅行商品プロモーション			市民向プロモーション				県外向プロモーション					

計画工程 → 変更工程 →

5 工事等の状況写真

体育館側からの入口




北側展望所側



テニスコート側からの入口




東側展望所側

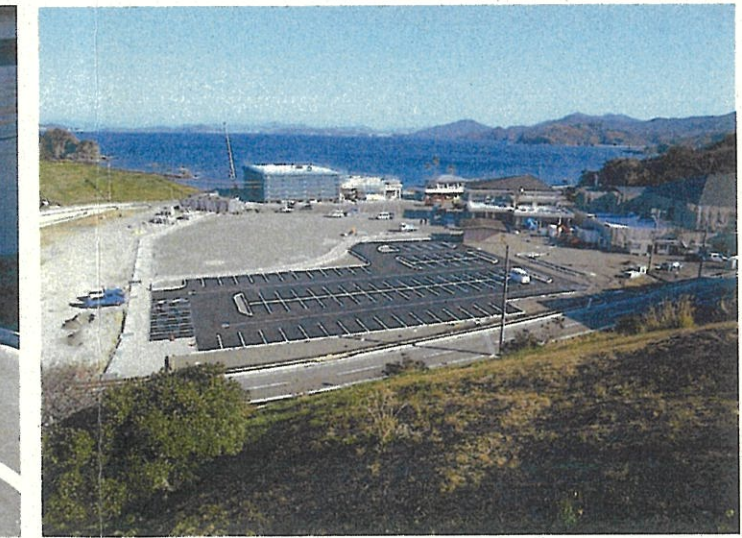


長崎のもぎき恐竜パーク整備の進捗状況について


① 造成工事・駐車場ほか舗装工事

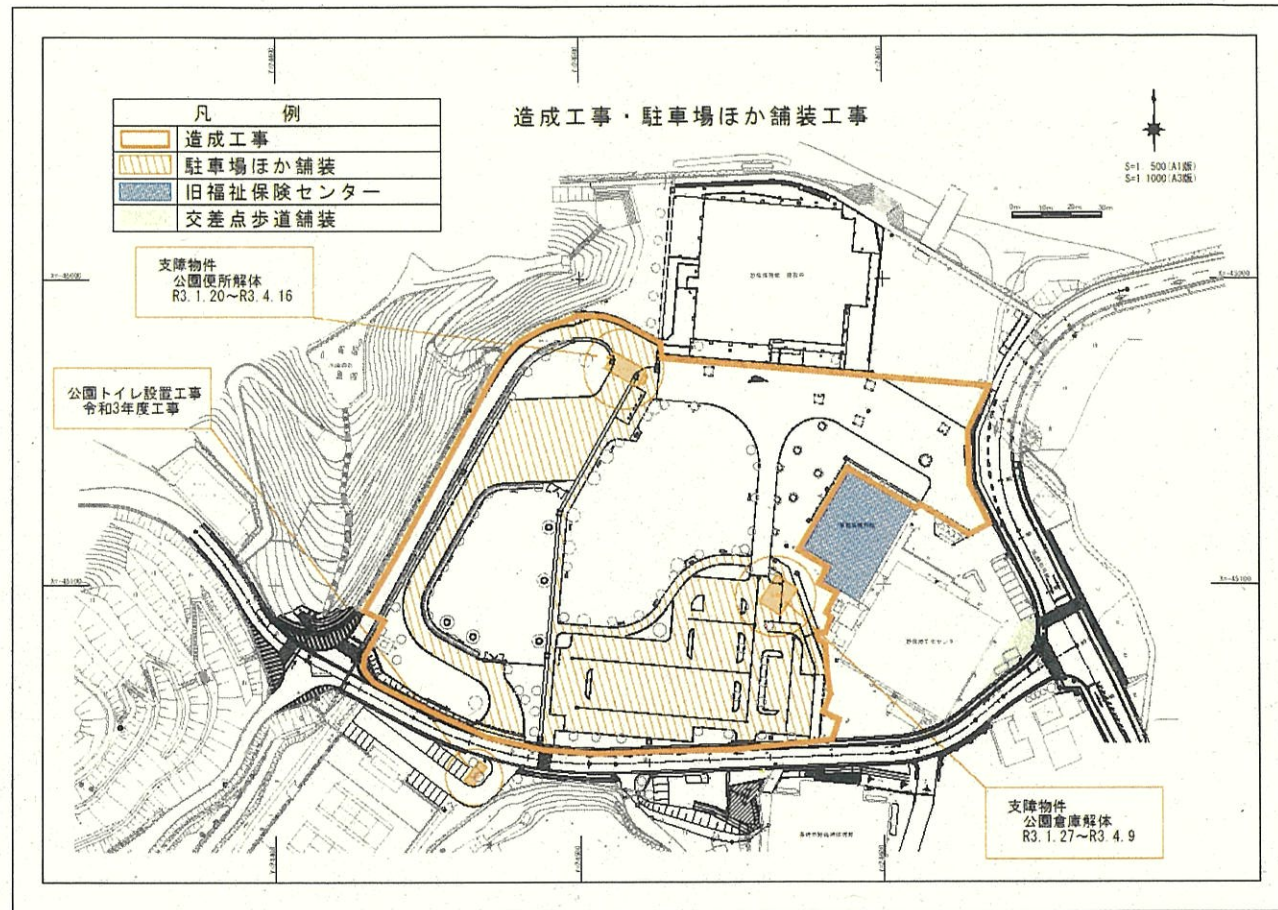

② 給排水管布設ほか工事

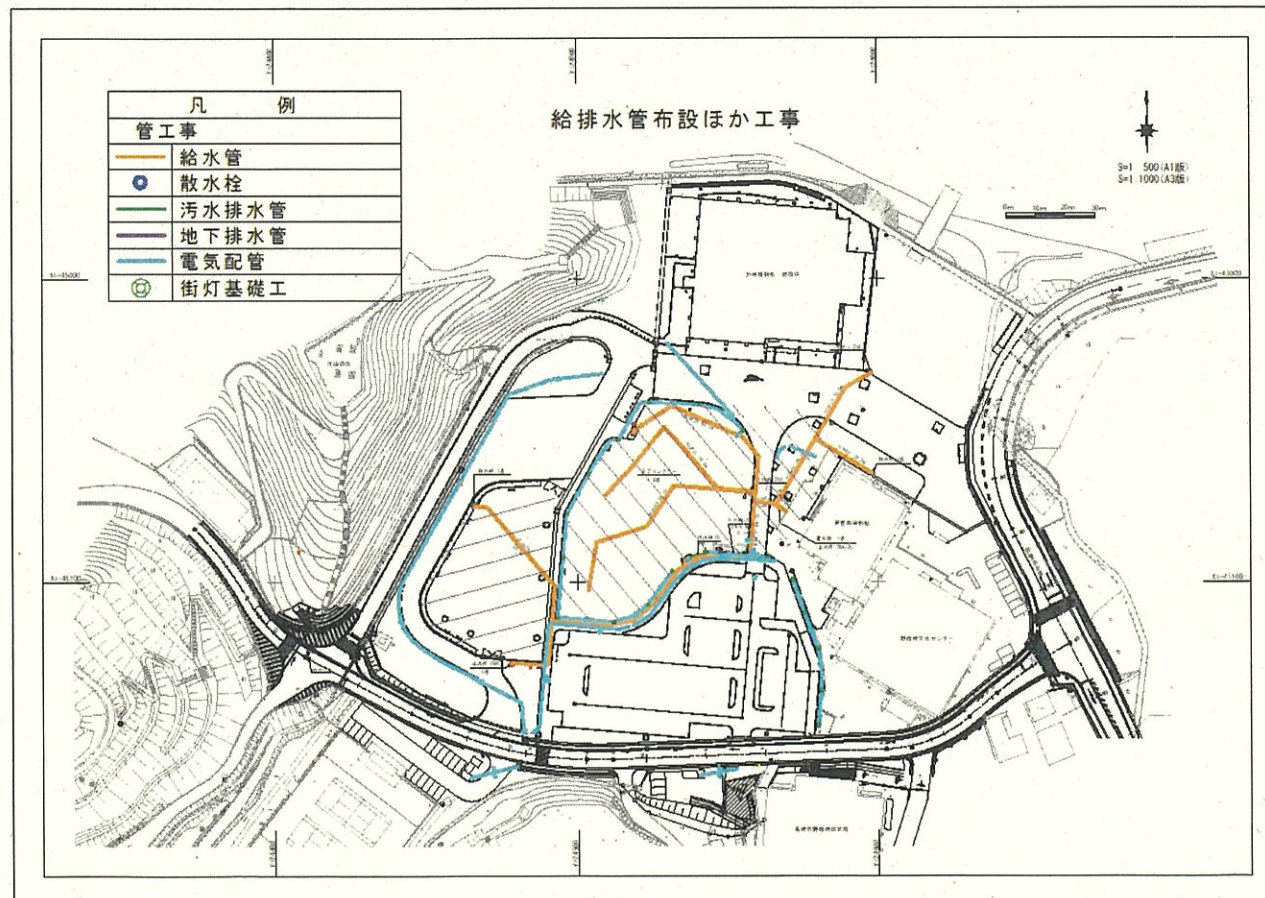

③ 広場舗装工事・施設整備等工事

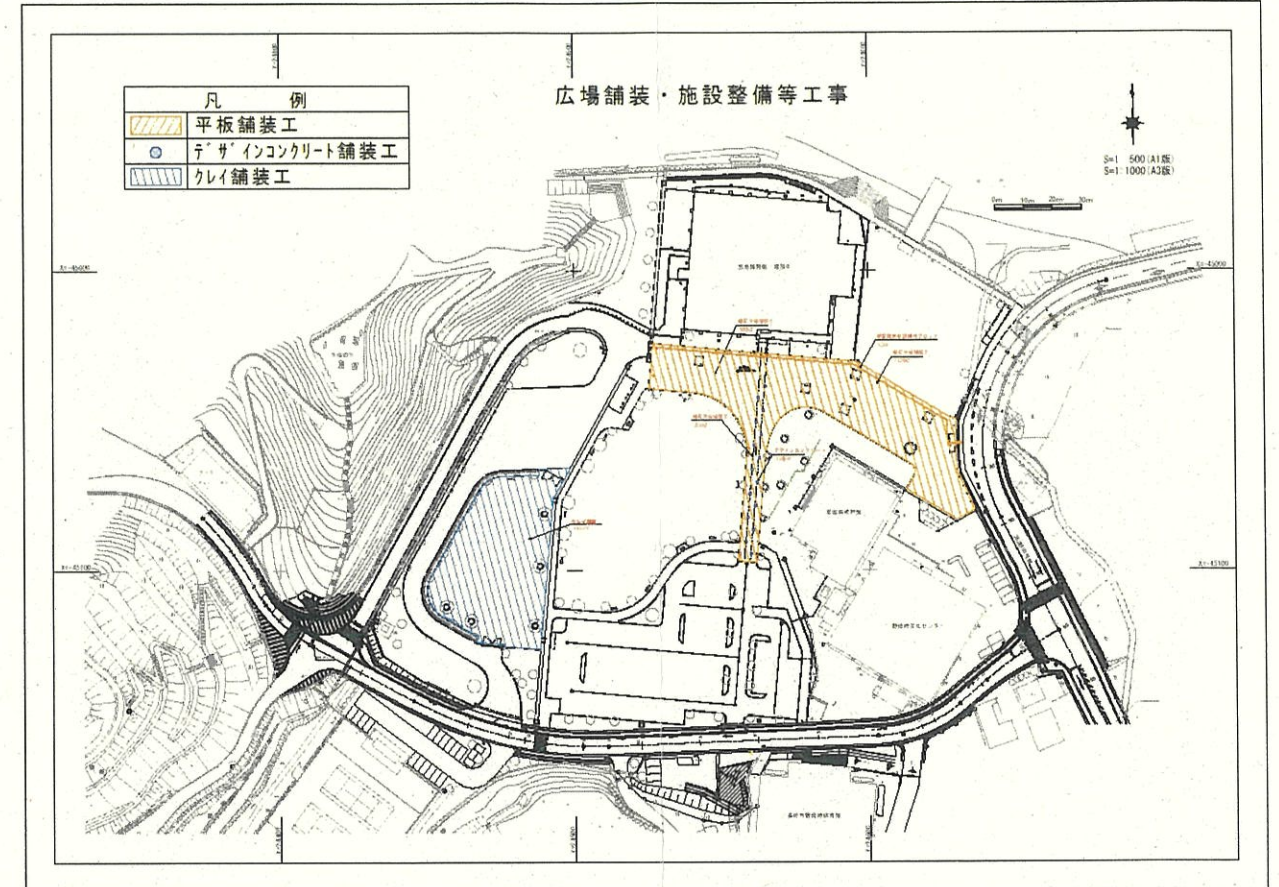

④ 公園遊具等整備工事・公園灯設置工事

