

**第142号議案 令和5年度長崎市一般会計補正予算(第8号)**

目次	ページ
《2款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費》 〔繰越明許費の補正〕	
【単独】ふれあいセンター施設整備事業費 施設改修 .....	2～5

中央総合事務所  
令和5年9月

## 1 繰越明許費

【予算説明書】 6ページ～7ページ

2款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】ふれあいセンター施設整備事業費 施設改修	予算現額	千円 76,700	千円 -	千円 -	千円 75,300	千円 -	千円 1,400
	支出予定額	14,000	-	-	12,600	-	1,400
	繰越明許額	62,700	-	-	※62,700	-	-
繰越事由	木鉢地区ふれあいセンター昇降機設置工事において、コロナ禍の中、止まっていた受注が集中するなどの社会情勢の変化により、昇降機メーカーの技術者が不足し、確保が困難となっていることから、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和6年12月						

※緊急防災・減災事業債 充当率100%(交付税措置率70%)

## 2 事業概要

ふれあいセンターの利用環境の向上を図るため、設備等の機能強化や維持補修を行うもの。


## 3 事業内訳

施設名 (建築年月)	事業内容		繰越明許額
木鉢地区ふれあいセンター (昭和52年1月)	エレベーター等新設工事 (昇降機設置及び昇降路増築等)	エレベーター1基 多目的トイレ1箇所	62,700千円

## 4 施設の現況




外観

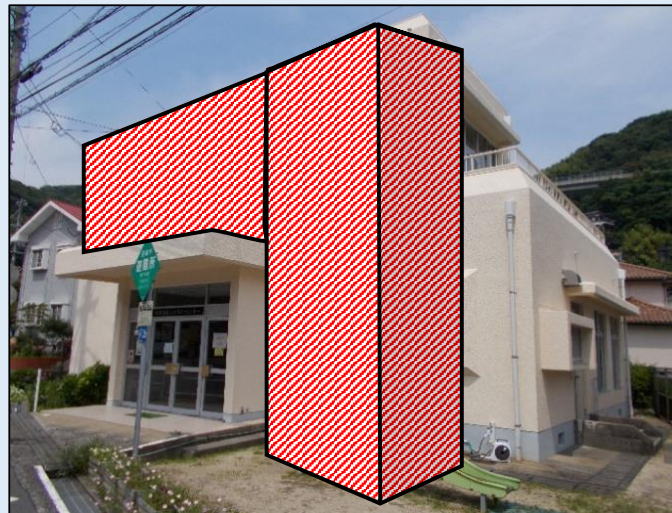



エレベーター設置予定箇所

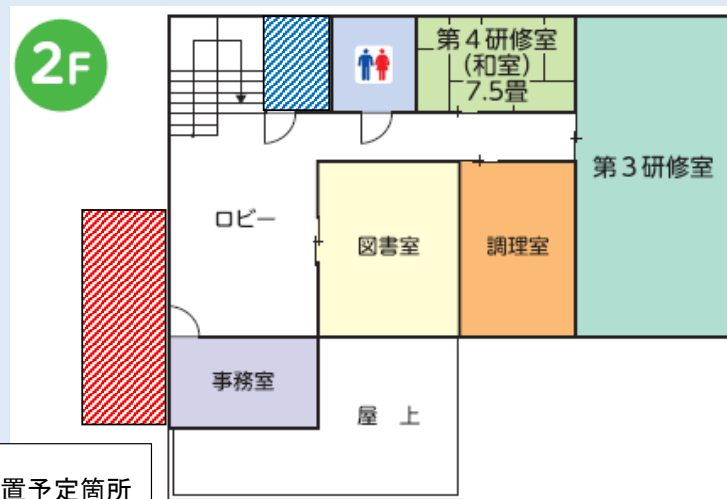

平面図(1階)



平面図(2階)

-  エレベーター設置予定箇所
-  多目的トイレ設置予定箇所

## 5 経緯

時 期	内 容
令和5年6月	工事費の設計のための見積もり徴取時に、昇降機メーカーへ完成時期の聞き取りを行った結果、令和5年度中に完成できる旨を確認した。
令和5年7月	入札の準備段階の時に、再度メーカーに聞き取りを行った結果、令和5年度中に完成できる旨を確認した。
令和5年8月	入札情報の公開中に業者より工期延長についての質疑があり、複数のメーカーに確認を行ったところ、令和5年度中の完成が困難との回答があり、今の時期の発注では工事の開始が令和6年5月頃になることが判明した。

## 6 9月議会での計上の理由

- ・令和5年度中の完成が見込めなくなったため、入札を取り下げることとなり、また、工事の完成のためには年度をまたぐ工期が必要となったため、現在の予算措置では発注ができなくなり、予算の繰り越しが必要となっている。
- ・工事の時期について、現時点で発注を行うのであれば、令和6年5月の着工の見込であるが、現在の社会情勢において、全国的に昇降機関係の工事が集中しており、今後、発注が遅くなれば遅くなるほど、着工の見込みが遅くなっていくおそれがあり、令和6年度中に完成ができなくなる可能性が高くなっていくため、できる限り早期発注ができる状態にする必要がある。
- ・今回の案件は本来であれば11月議会において繰越明許費を計上すべき時期に発生したものであるが、9月議会に計上を行い、少しでも着工時期を早め、確実に令和6年度中に工事を完成させる必要がある。

## 7 スケジュール

### (1) 当初のスケジュール

項目	令和4年度			令和5年度												
	7月	12月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
設計業務委託	△成果品納品 (12/16)															
設計				△工事依頼受付 (4/6)				昇降機設置・昇降路増築等				▽公告 (8/8)				
契約事務												▽契約 (9/7)				
施工												▽完成 (2/29)				
												機器納期・準備期間4.9ヶ月				現場施工(1ヶ月)

### (2) 今後のスケジュール

項目	令和5年度							令和6年度									
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
設計・起案	9月議会議決(9月末)																
	昇降機設置							昇降路増築等									
契約事務	公告△ (10月初旬)		△契約(11月初旬)					公告△ (5月初旬)		△契約(6月初旬)							
昇降機設置	機器納期・準備期間(4.9ヶ月)							技術者手配期間(12ヶ月)									▽完成 (12月初旬)
										現場施工(1ヶ月)							
昇降路増築等										準備期間(1.9ヶ月)			現場施工(4ヶ月)				△完成 (12月初旬)
