

令和5年12月市議会 建設水道委員会資料

第158号議案

令和5年度長崎市一般会計補正予算(第9号)

目次	ページ
《8款 土木費 2項 道路橋りょう費》	
3目 道路橋りょう新設改良費 (繰越明許費の補正)	..... 2~24
5目 県施行事業費負担金 (繰越明許費の補正)	..... 25~29
《8款 土木費 3項 河川海岸費》	
2目 河川改良費 (歳出・繰越明許費の補正)	..... 30~37
《8款 土木費 5項 都市計画費》	
3目 街路事業費 (繰越明許費の補正)	..... 38~43
6目 公園費 (歳出・繰越明許費の補正)	..... 44~58
7目 県施行事業費負担金 (繰越明許費の補正)	..... 59~66

土木部

令和5年12月

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
40～41	8 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金) 中川鳴滝3号線	41,500 千円

### 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 80,000	千円 39,000	千円 —	千円 36,900	千円 —	千円 4,100
支出予定額	38,500	18,500	—	18,000	—	2,000
繰越明許額	41,500	20,500	—	18,900	—	2,100

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

### 2 全体計画

【事業期間】平成12年度から令和12年度まで (認可期間 平成12年度から令和7年度まで)

【事業計画】延長 L=1,200m 幅員 W=10～12m

【総事業費】4,100,000千円

【進捗率】44%(令和5年3月末)

### 3 繰越概要

【工事】L=90m

【用地取得】A=200m<sup>2</sup>


【建物補償】2棟

### 4 繰越事由

地権者1名との建物移転補償において、移転に係る調整に不測の日数を要したことに加え、入札不調により事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和6年9月

### 5 位置図

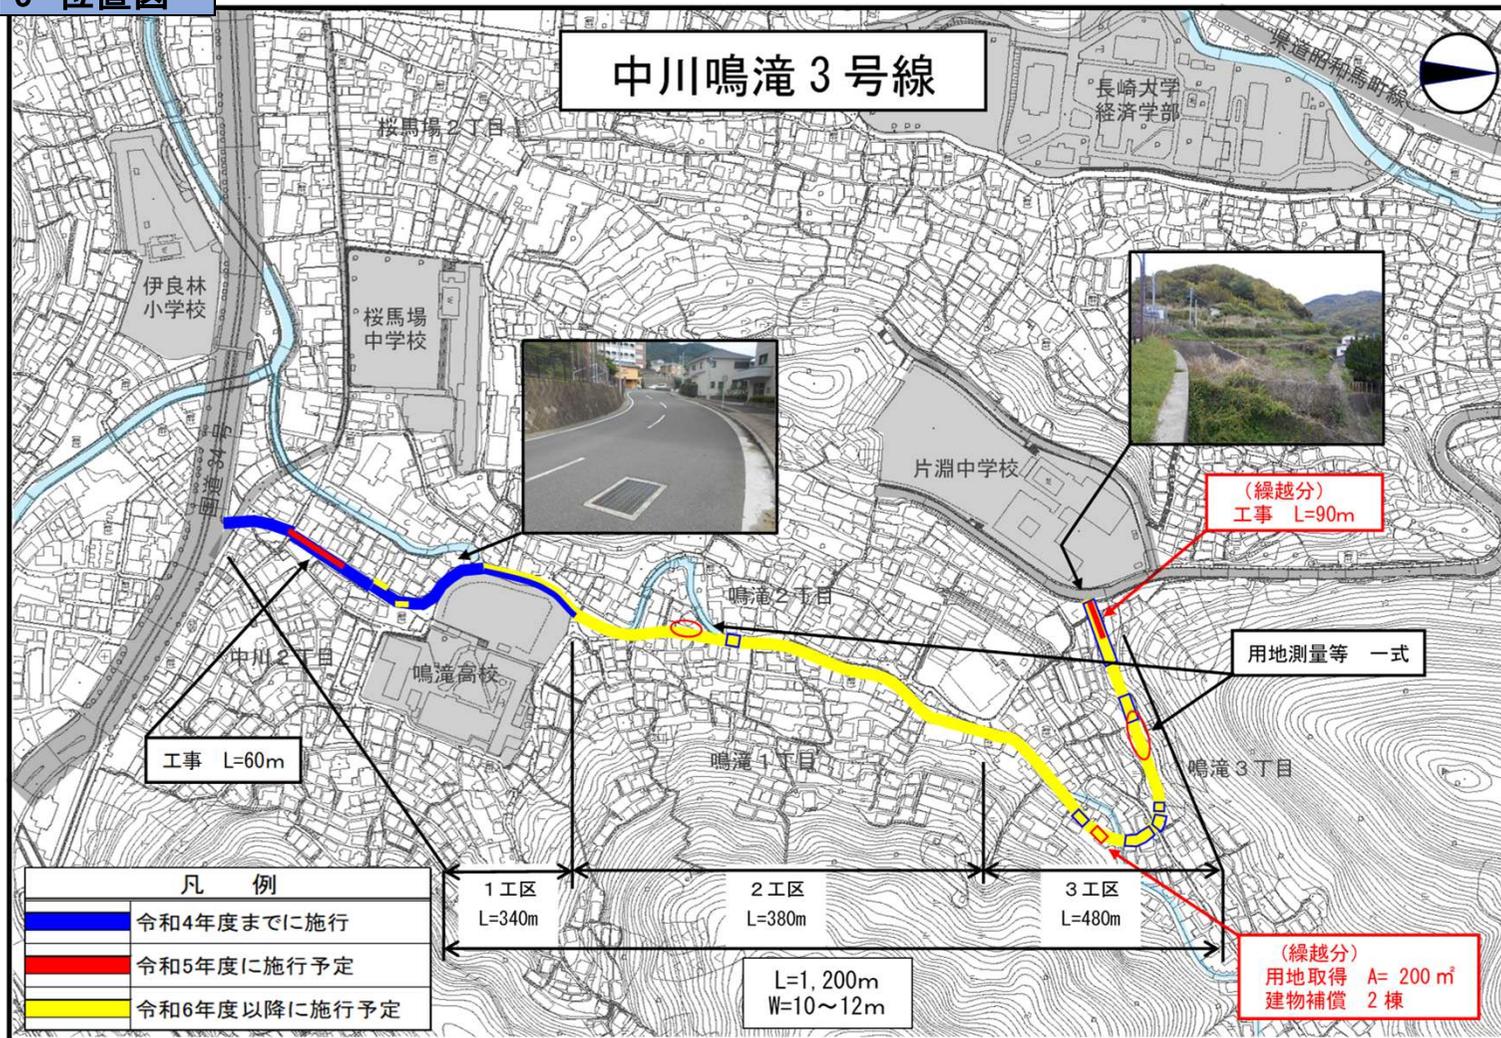

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
40～41	8 土木費	2 道路橋 りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金) 川上町出雲線	32,700 千円

### 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 54,000	千円 26,000	千円 —	千円 25,200	千円 —	千円 2,800
支出予定額	21,300	9,650	—	10,500	—	1,150
繰越明許額	32,700	16,350	—	14,700	—	1,650

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

### 2 全体計画

【事業期間】平成3年度から令和10年度まで（認可期間 平成3年度から令和10年度まで）

【事業計画】延長 L=576m 幅員 W=10.5m

【総事業費】1,800,000千円

【進捗率】87%(令和5年3月末)

### 3 繰越概要

【工事】L=51m

### 4 繰越事由

関連工事(先行工事)において、支障物件の移設等に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定:令和6年9月

### 5 位置図



予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
40～41	8 土木費	2 道路橋 りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【補助】道路新設改良事業費 (地方創生道整備推進交付金) 相川町四杖町1号線	7,400 千円

### 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 18,600	千円 9,150	千円 —	千円 8,500	千円 —	千円 950
支出予定額	11,200	5,510	—	5,200	—	490
繰越明許額	7,400	3,640	—	3,300	—	460

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

### 2 全体計画

【事業期間】平成20年度から令和7年度まで (認可期間 平成20年度から令和7年度まで)

【事業計画】延長 L=1,020m 幅員 W=8.75～11.5m

【総事業費】2,960,000千円

【進捗率】87%(令和5年3月末)


### 3 繰越概要

【用地取得】A=1,430㎡  
【その他通損補償】一式

### 4 繰越事由

地権者との協議に不測の日数を要し、用地取得及び損失補償が年度内に完了しない見込みであるため。  
繰越箇所の完了予定：令和6年9月

### 5 位置図

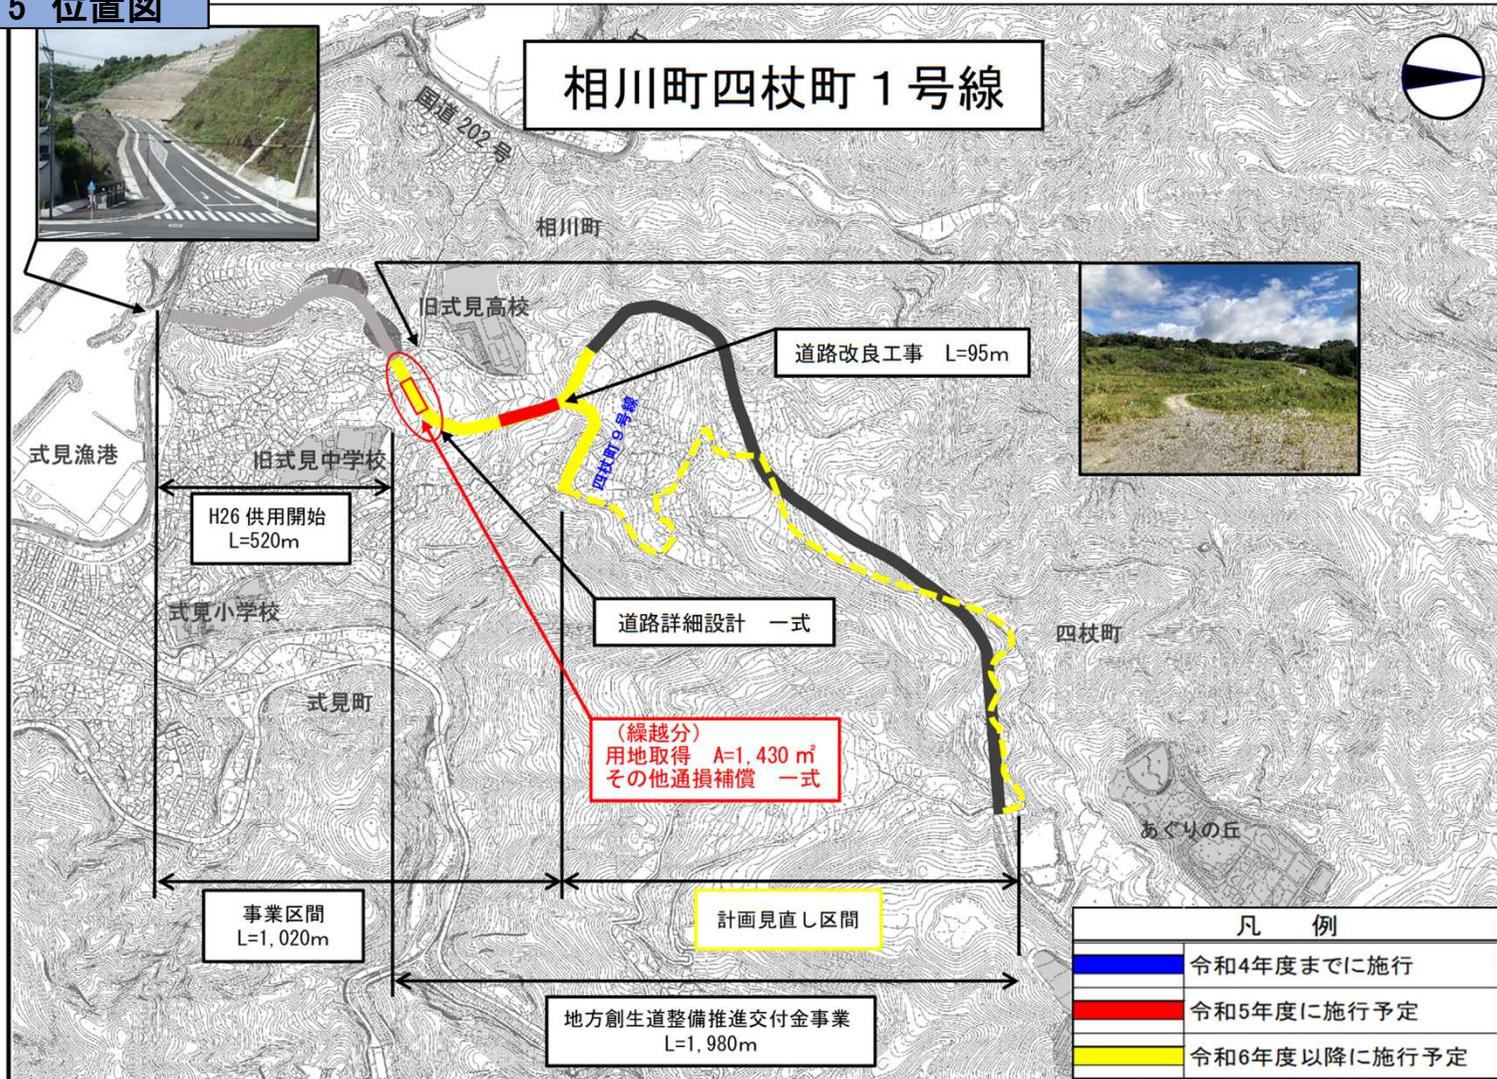

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
42～43	8 土木費	2 道路橋 りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【補助】道路新設改良事業費 (地方創生道整備推進交付金) 虹が丘町西町1号線	36,300 千円

## 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 218,000	千円 107,300	千円 —	千円 99,600	千円 —	千円 11,100
支出予定額	181,700	89,600	—	82,900	—	9,200
繰越明許額	36,300	17,700	—	16,700	—	1,900

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

## 2 全体計画

【事業期間】平成9年度から令和11年度まで (認可期間 平成9年度から令和7年度まで)

【事業計画】延長 L=1,950m 幅員 W=10m

【総事業費】6,500,000千円

【進捗率】45%(令和5年3月末)

### 3 繰越概要

【工事】 水路整備 L=91m

【用地取得】 A=425㎡


【その他損失補償】 一式

### 4 繰越事由

水路整備箇所において、県発注の急傾斜工事と水路整備箇所が重複しており、協議・調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和6年5月

### 5 位置図

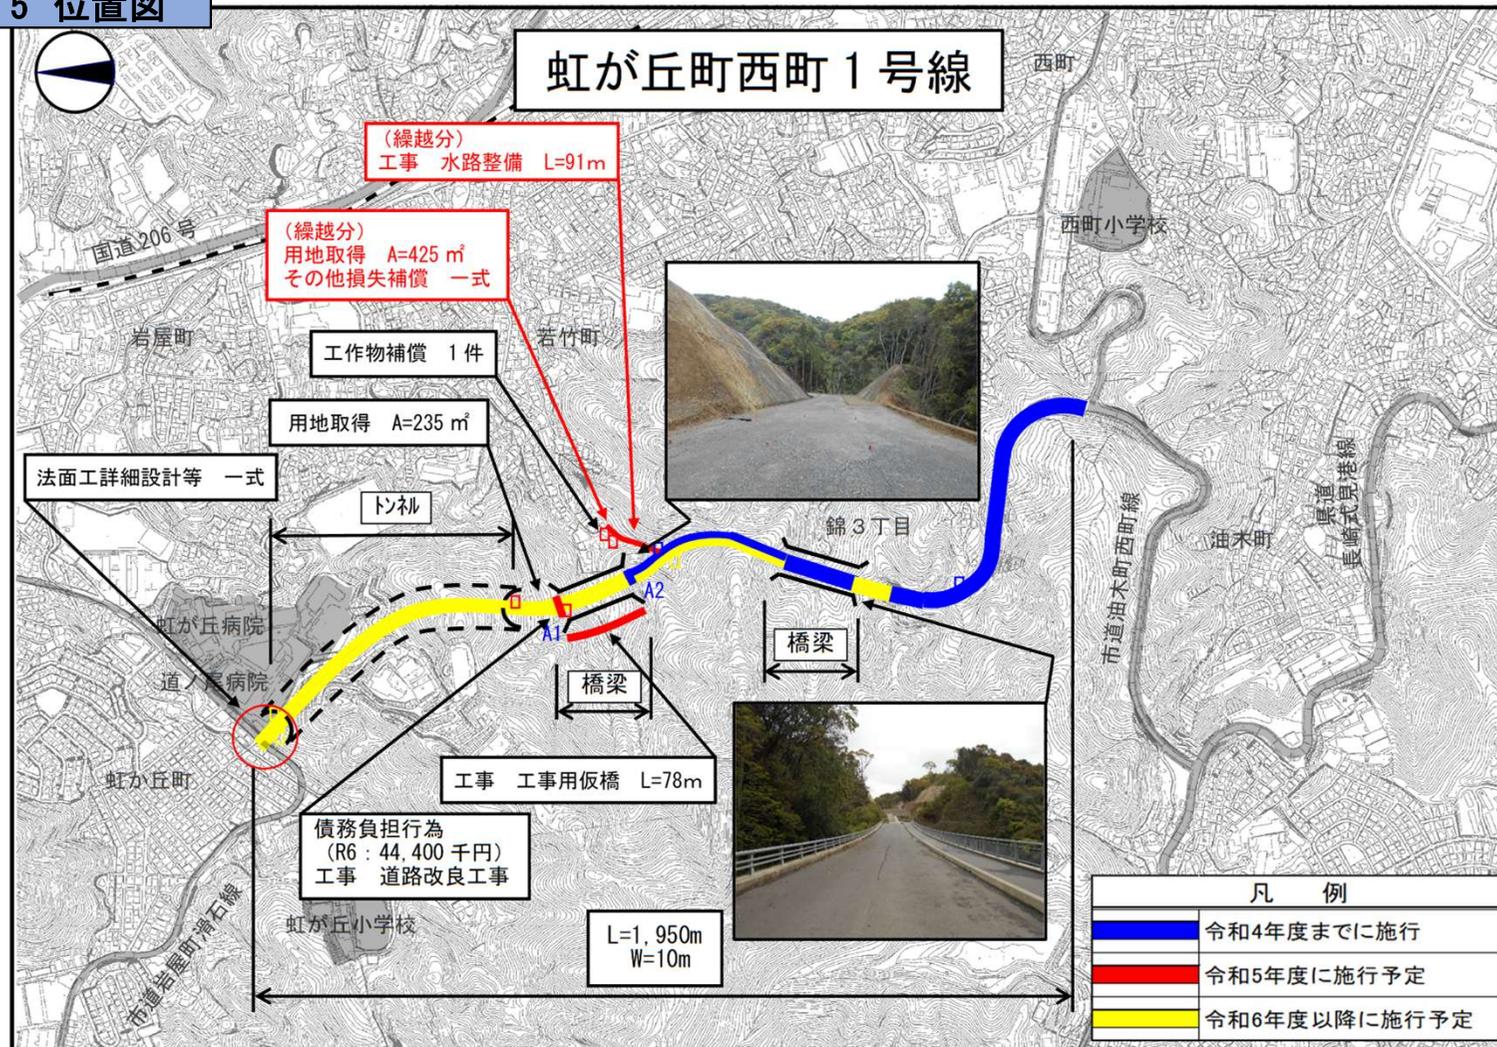

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
42～43	8 土木費	2 道路橋 りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【補助】道路新設改良事業費 (道路メンテナンス事業) 道路構造物等補強	13,500 千円

### 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 174,200	千円 93,500	千円 —	千円 42,600	千円 —	千円 38,100
支出予定額	160,700	86,075	—	37,200	—	37,425
繰越明許額	13,500	7,425	—	5,400	—	675

※1 国庫補助率 55%

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

### 2 事業内容

国の道路メンテナンス事業を活用し、道路等の災害を防止するため、道路構造物等について、緊急性に応じた補修・補強を行うもの。

### 3 繰越概要

【工事】伊王島町41号線(後口平橋)

### 4 繰越事由


伊王島町41号線(後口平橋)において、台風などによる波の影響を受けた巨石が橋脚部分に堆積し、作業スペースの確保に不測の日数を要したことから、補修工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定:令和6年5月

### 5 位置図



(繰越分)  
工事: 伊王島町41号線  
(後口平橋)

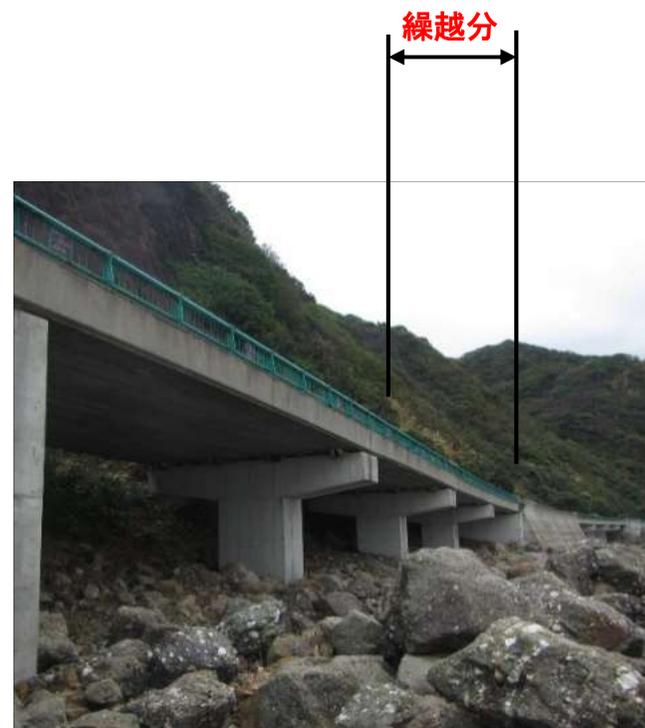

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
42～43	8 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【補助】都市構造再編事業費 新市庁舎周辺道路	120,600 千円

## 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 169,000	千円 83,000	千円 —	千円 77,400	千円 —	千円 8,600
支出予定額	48,400	23,500	—	22,500	—	2,400
繰越明許額	120,600	59,500	—	54,900	—	6,200

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

## 2 全体計画

【事業期間】平成28年度から令和9年度まで (認可期間 平成28年度から令和9年度まで)

【事業計画】延長 L=560m 幅員 W=9～37.6m

【総事業費】1,080,000千円

【進捗率】48%(令和5年3月末)

### 3 繰越概要

- 【委託】 工事委託 一式
- 【補償】 電柱移設補償 3本

### 4 繰越事由

関係機関が多岐にわたり、電柱移設や埋設管路整備にかかる協議に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。  
繰越箇所の完了予定：令和6年9月

### 5 位置図



予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
42～43	8 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【補助】都市構造再編事業費 新市庁舎周辺道路 (電線類地中化)	千円 4,000

### 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 54,000	千円 26,000	千円 —	千円 25,200	千円 —	千円 2,800
支出予定額	50,000	24,000	—	23,400	—	2,600
繰越明許額	4,000	2,000	—	1,800	—	200

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

### 2 全体計画

【事業期間】令和2年度から令和9年度まで (認可期間 令和2年度から令和9年度まで)

【事業計画】延長 L=290(580)m

【総事業費】 362,000千円

【進捗率】 47%(令和5年3月末)

### 3 繰越概要

【委託】 工事委託 一式

### 4 繰越事由

電線管理者との埋設管路整備にかかる協議に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和6年9月

### 5 位置図



予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
42～43	8 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【補助】都市構造再編事業費 幸町周辺地区	40,600 千円

### 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 40,600	千円 20,300	千円 —	千円 18,200	千円 —	千円 2,100
支出予定額	0	0	—	0	—	0
繰越明許額	40,600	20,300	—	18,200	—	2,100

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

### 2 全体計画

【事業期間】令和4年度から令和8年度まで（認可期間 令和4年度から令和8年度まで）

【事業計画】道路新設・改良等 4路線 延長 L=270m

【総事業費】364,700千円

【進捗率】2%(令和5年3月末)

### 3 繰越概要


【工事】 L=110m(4箇所)

### 4 繰越事由

先行する県の工事が遅延するなど関係機関との調整に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和6年9月

### 5 位置図

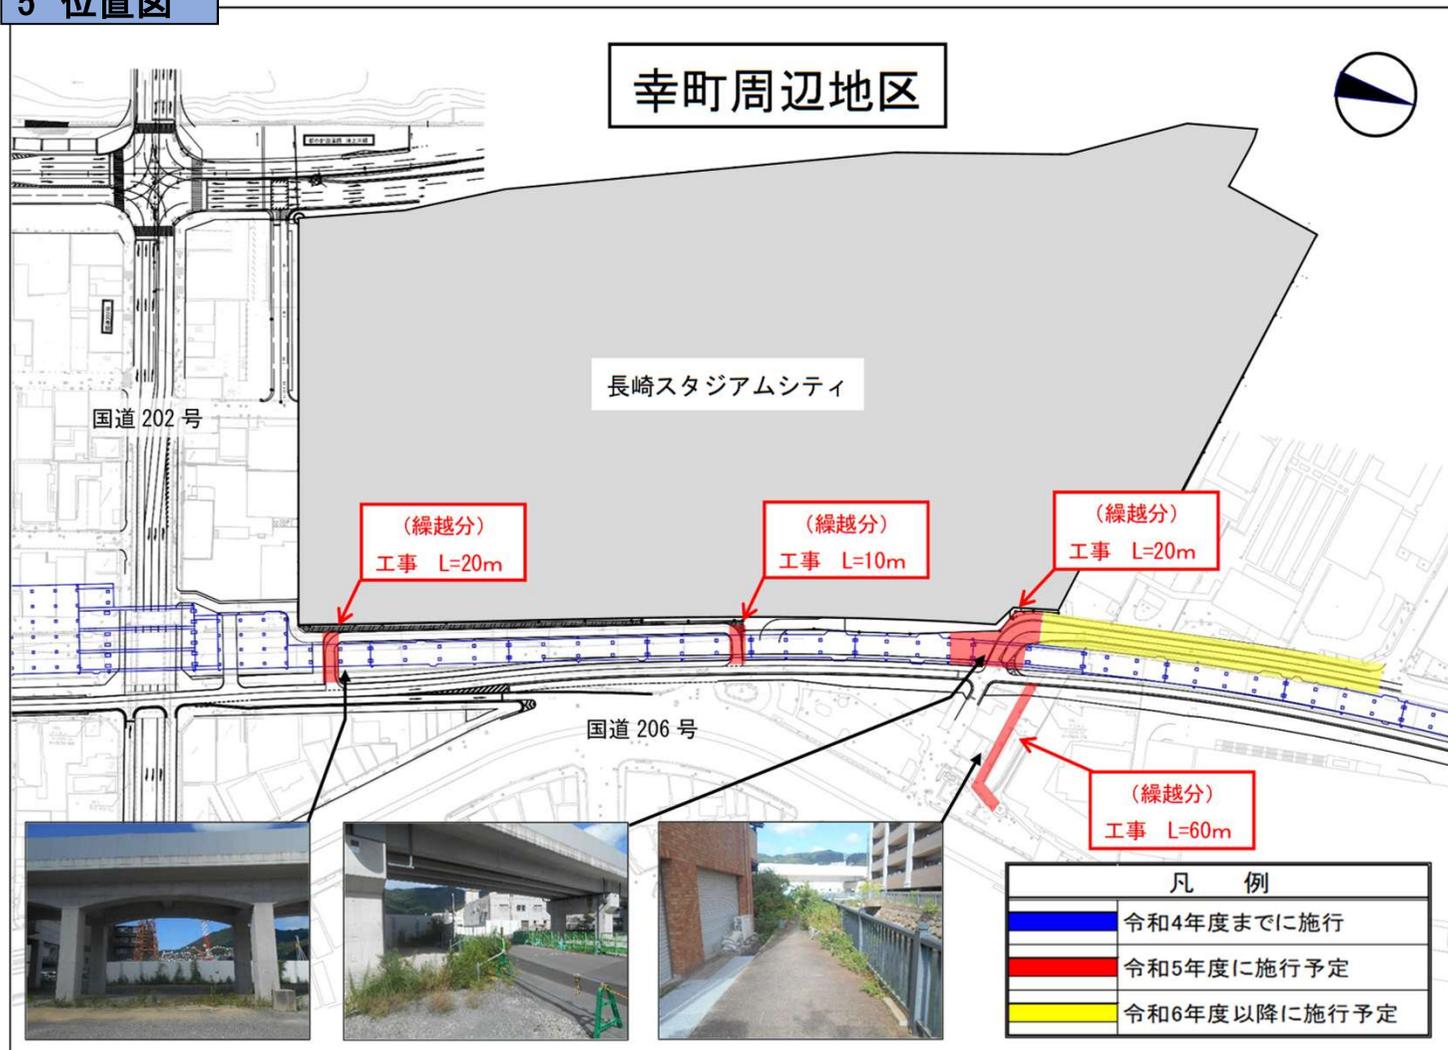

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
44～45	8 土木費	2 道路橋 りよう費	3 道路橋りよう 新設改良費	【単独】道路新設改良事業費 地方道路等整備事業費	86,000 千円

### 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
予算現額	千円 185,100	千円 —	千円 —	千円 166,500	千円 —	千円 18,600
支出予定額	99,100	—	—	89,100	—	10,000
繰越明許額	86,000	—	—	77,400	—	8,600

※ 起債充当率 90%(地方道路等整備事業債)(交付税措置率 ー%)

### 2 事業内容

交通の円滑化と安全性の向上等を図ることを目的に、補助事業と併せ整備を行うもの。

# ①中川鳴滝3号線

## 3 繰越概要


【工事】L=90m

【繰越明許額】2,100千円

## 4 繰越事由

入札不調により工事が年度内に完了しない見込みであるため。  
繰越箇所の完了予定：令和6年5月

## 5 位置図

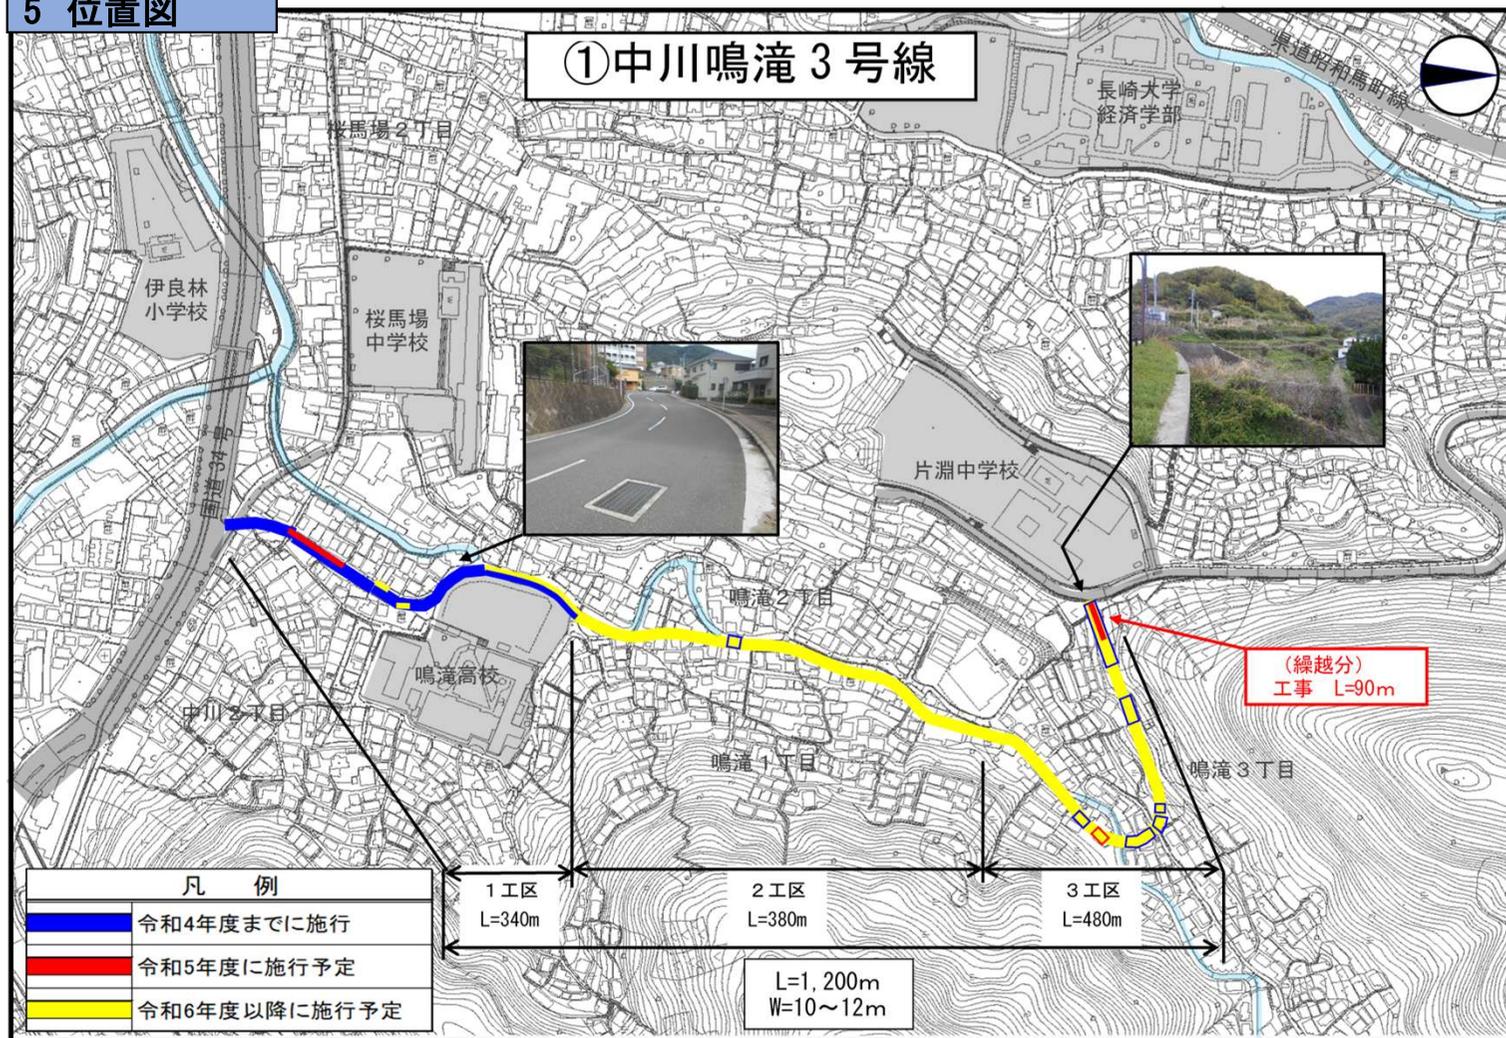

## ②川上町出雲線

### 3 繰越概要

【工事】L=51m

【繰越明許額】300千円

### 4 繰越事由

関連工事(先行工事)において、支障物件の移設等に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定:令和6年9月

### 5 位置図



### ③虹が丘町西町1号線

#### 3 繰越概要

【工事】水路整備 L=91m

【繰越明許額】12,000千円

#### 4 繰越事由

水路整備箇所において、県発注の急傾斜工事と水路整備箇所が重複しており、協議・調整に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和6年5月

#### 5 位置図



## ④幸町周辺地区


### 3 繰越概要

【工事】L=110m(4箇所)  
 【繰越明許額】14,600千円

### 4 繰越事由

先行する県の工事が遅延するなど関係機関との調整に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。  
 繰越箇所の完了予定：令和6年9月

### 5 位置図

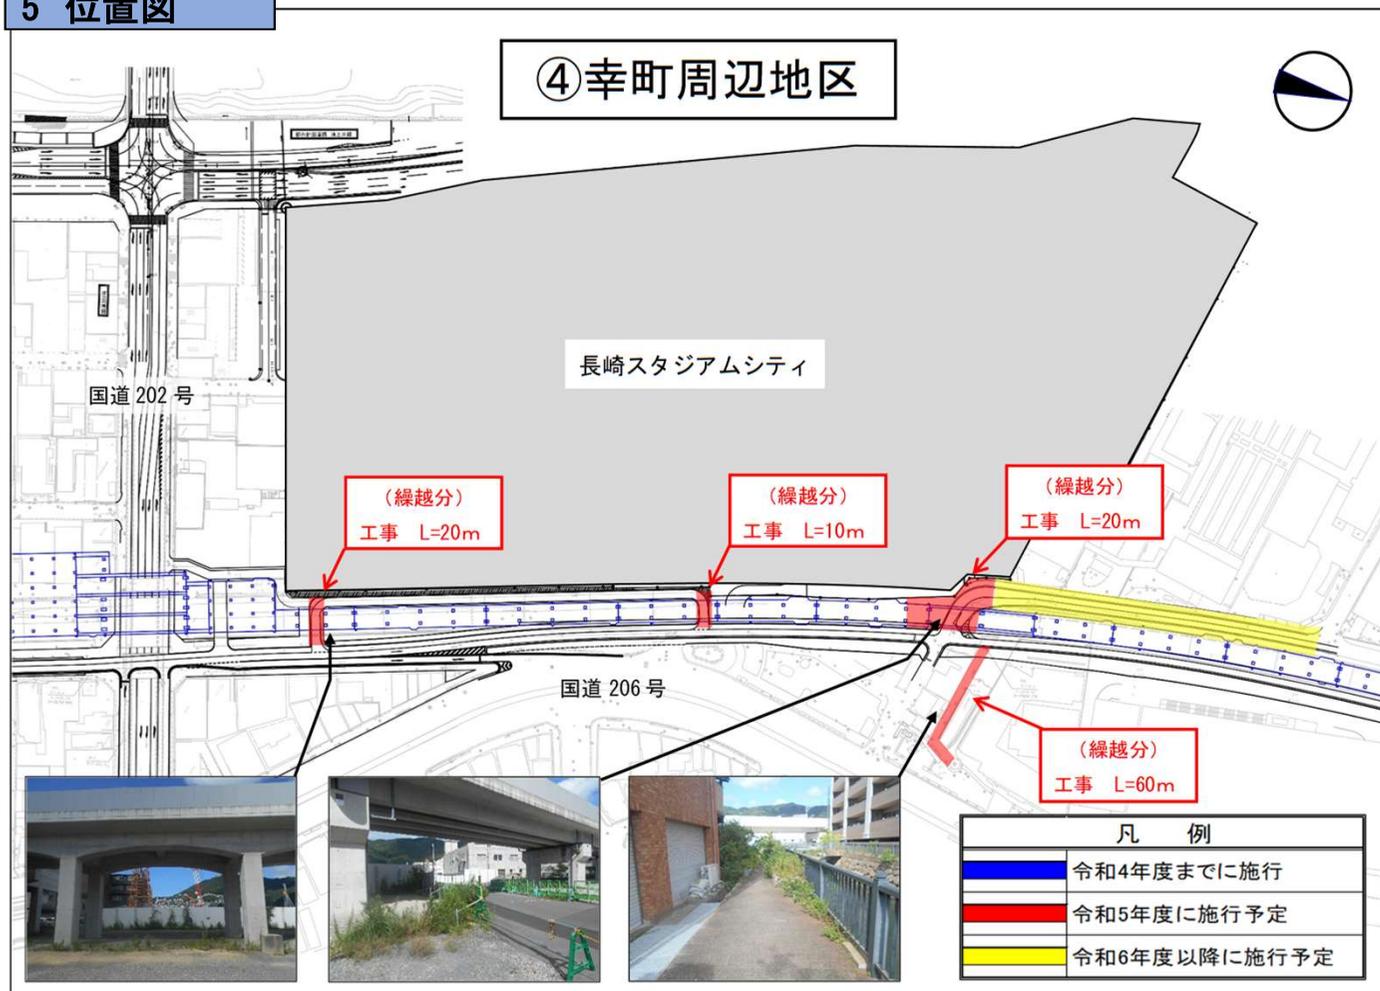



## ⑥磯道町柳田町線

### 3 繰越概要

【委託】交差点設計等 一式


【繰越明許額】12,000千円

### 4 繰越事由

関係機関との協議に不測の日数を要し、交差点設計等委託が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和6年5月

### 5 位置図

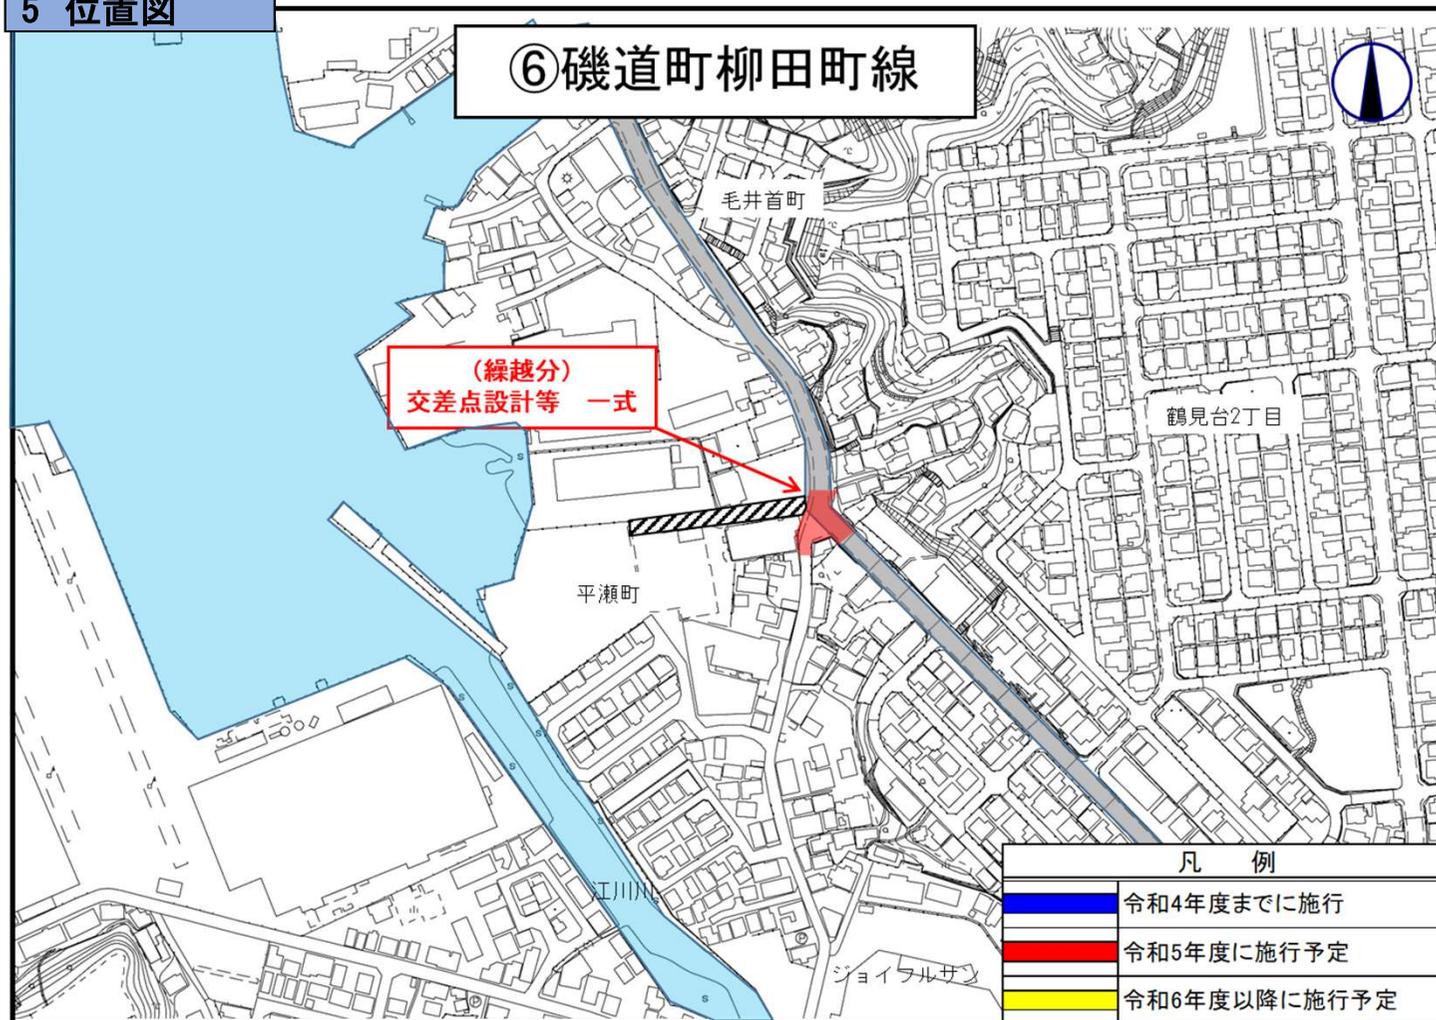

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
44～45	8 土木費	2 道路橋りょう費	5 県施行事業費 負担金	道路橋りょう費負担金 道路事業費	13,658 千円

### 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
予算現額	千円 50,310	千円 —	千円 —	千円 45,200	千円 —	千円 5,110
支出予定額	36,652	—	—	33,000	—	3,652
繰越明許額	13,658	—	—	12,200	—	1,458

※起債充当率 地方負担分の90%(地方道路等整備事業債)(交付税措置 ー%)

## 2 路線別内訳

図面 番号	路線名	県施行 事業費	負担額内訳 ( )内は負担割合			
			県 (8.5/10)	市(1.5/10)		
				市負担額 (予算現額)	支出予定額	繰越明許額
①	(国)206号 (琴海村松町ほか)	千円 47,775	千円 40,609	千円 7,166	千円 2,722	千円 4,444
②	(主)野母崎宿線(網場～千々) (大崎町)	97,500	82,875	14,625	5,411	9,214
3	(主)野母崎宿線 (為石町)	39,000	33,150	5,850	5,850	0
4	(主)神ノ浦港長浦線 (長浦町～琴海戸根原町)	29,250	24,862	4,388	4,388	0
5	(主)神ノ浦港長浦線 (琴海戸根町)	19,500	16,575	2,925	2,925	0
6	(県)長崎漁港村松線 (松崎町)	35,100	29,835	5,265	5,265	0
7	(県)深堀三和線 (深堀町6丁目)	47,775	40,609	7,166	7,166	0
8	(主)長崎南環状線 (上戸町4丁目～江川町)	19,500	16,575	2,925	2,925	0
合 計		千円 335,400	千円 285,090	千円 50,310	千円 36,652	千円 13,658

※図面番号○：繰越予定路線

### 3 事業内容



# ① (国)206号(琴海村松町ほか)


## 4 繰越概要

- ア)【工事】道路改良(車道拡幅) L=143m
- イ)【委託】バイパス検討業務 一式

## 5 繰越事由

- ア) 用地交渉や支障物件の移設における関係者との調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。  
繰越箇所の完了予定:令和6年5月
- イ) 現地調査における地権者等との調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。  
繰越箇所の完了予定:令和6年8月

## 6 位置図

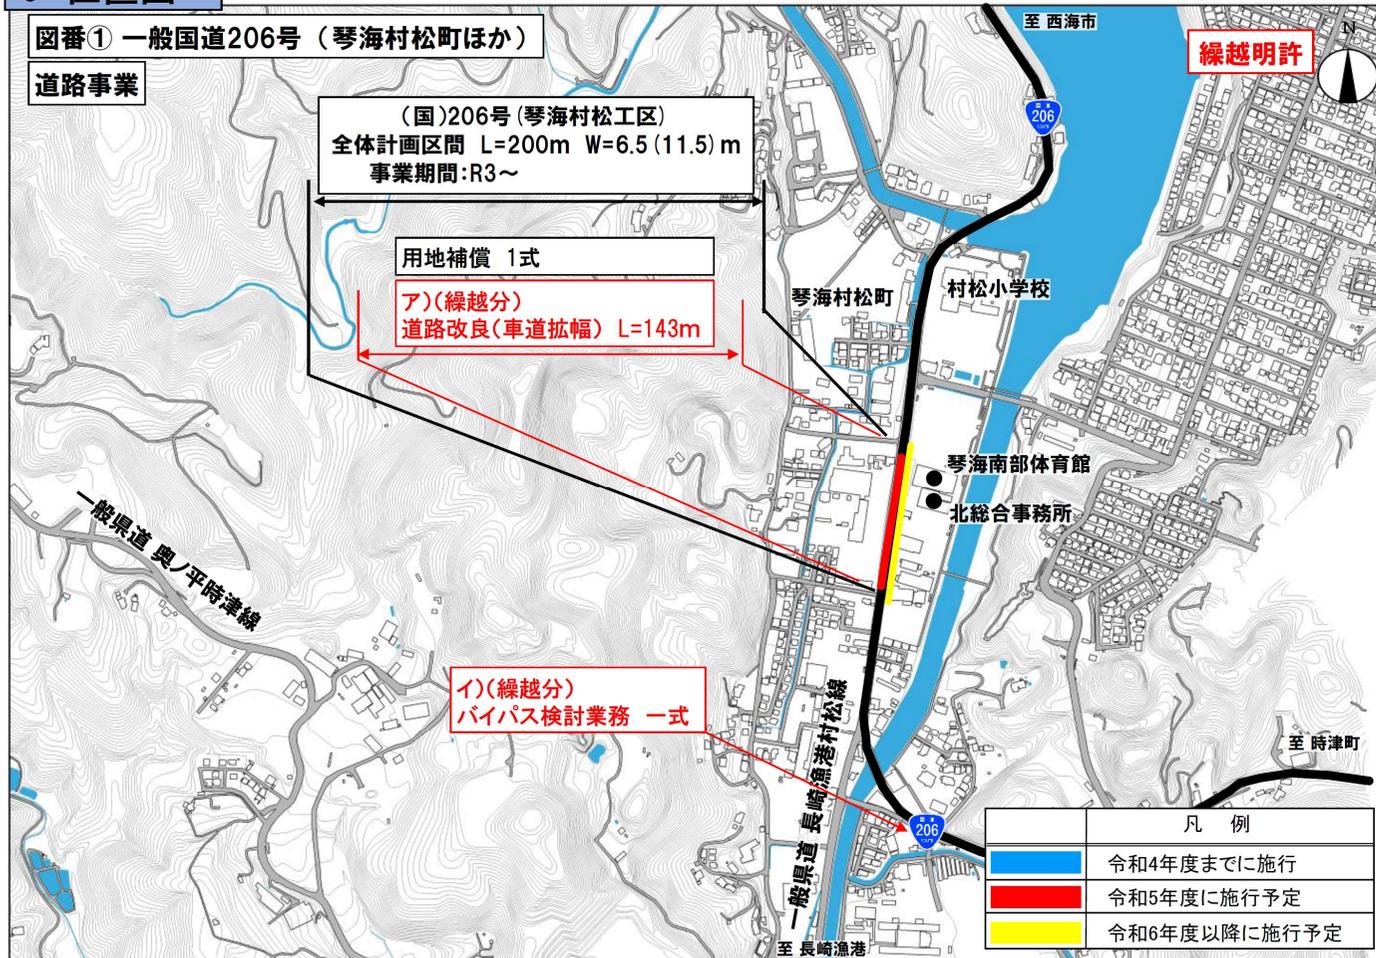

## ② (主)野母崎宿線(網場～千々)(大崎町)

### 4 繰越概要


【工事】道路改良(補強土壁) L=60m

### 5 繰越事由

先行工事の施工中に周辺地盤に変状が確認され、その対策検討に時間を要したことにより、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定:令和6年8月

### 6 位置図

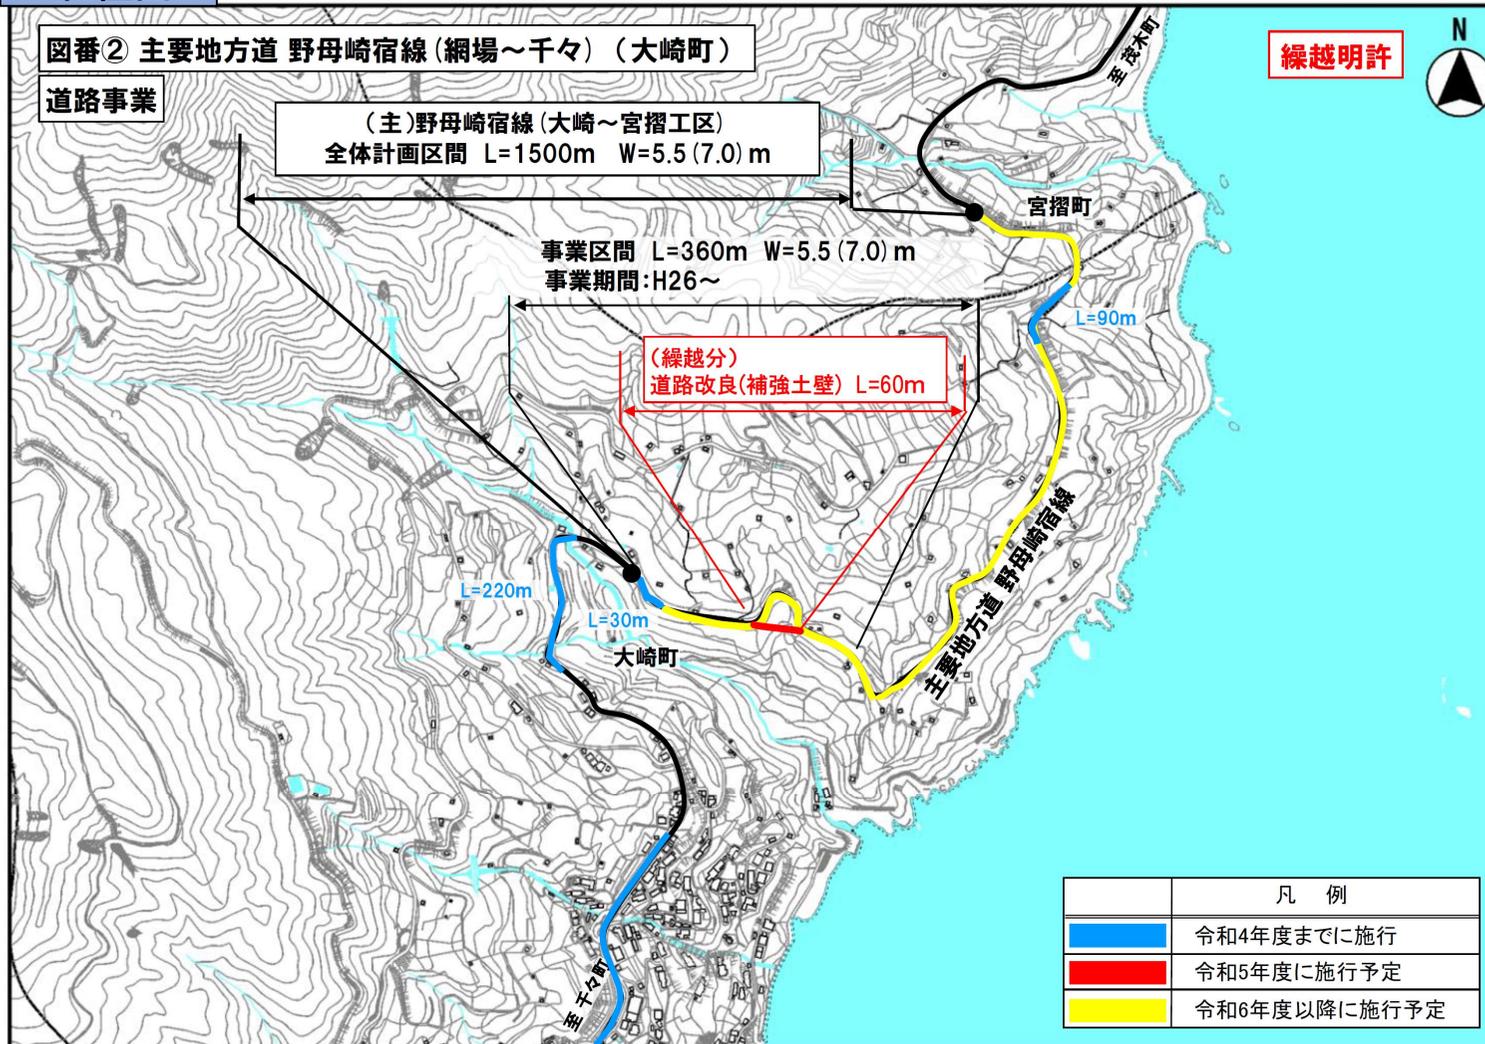

予算説明書					事業名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
34~35	8 土木費	3 河川海岸費	2 河川改良費	1-1	【単独】自然災害防止事業費 急傾斜地崩壊対策	千円 20,000

## 1 事業概要

### (1)事業目的

急傾斜地の崩壊による被害から市民の生命と身体を守るため、急傾斜地崩壊対策工事等を実施するもの。

### (2)補正予算理由

県補助事業費の内示増に伴い、事業の進捗を図るため、予算を増額するもの。

## 2 事業内容

地区名	事業期間	事業延長 (m)	総事業費 (千円)	補正前事業 費(千円)	補正事業 費(千円)	補正後事業 費(千円)	事業内容
女ノ都2丁目(2)	令和3年度から令和5年度まで	45	100,000	20,000	—	20,000	工事
三原(8)	令和4年度から令和10年度まで	85	200,000	15,000	—	15,000	工事
ひがしあげ かきどう 東上筋道	令和4年度から令和6年度まで	50	60,000	15,000	—	15,000	工事
小ヶ倉2丁目(4)	令和4年度から令和6年度まで	45	60,000	5,000	20,000	25,000	工事(12月補正) 用地測量
深堀5丁目	平成30年度から令和7年度まで	120	220,000	9,000	—	9,000	測量・調査・設計、 用地測量
滑石5丁目(4)	令和5年度から令和11年度まで	65	100,000	9,000	—	9,000	測量・調査・設計、 用地測量
滑石5丁目(6)	令和5年度から令和7年度まで	25	50,000	8,000	—	8,000	測量・調査・設計、 用地測量
分筆登記・点検	—	—	—	4,000	—	4,000	
合計			790,000	85,000	20,000	105,000	

### 3 財源内訳


区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金 ※1	地方債 ※2	その他 ※3	一般財源
補正前の額	千円 85,000	千円 -	千円 40,000	千円 37,900	千円 3,100	千円 4,000
12月補正額	千円 20,000	千円 -	千円 10,000	千円 9,600	千円 351	千円 49
補正後の額	千円 105,000	千円 -	千円 50,000	千円 47,500	千円 3,451	千円 4,049

※1 県費補助率 対象事業費20,000千円の50%

※2 起債充当率 地方負担金の100%(緊急自然災害防止対策事業債)  
(交付税措置率70%)

※3 急傾斜地崩壊対策事業費寄附金

#### 4 位置図

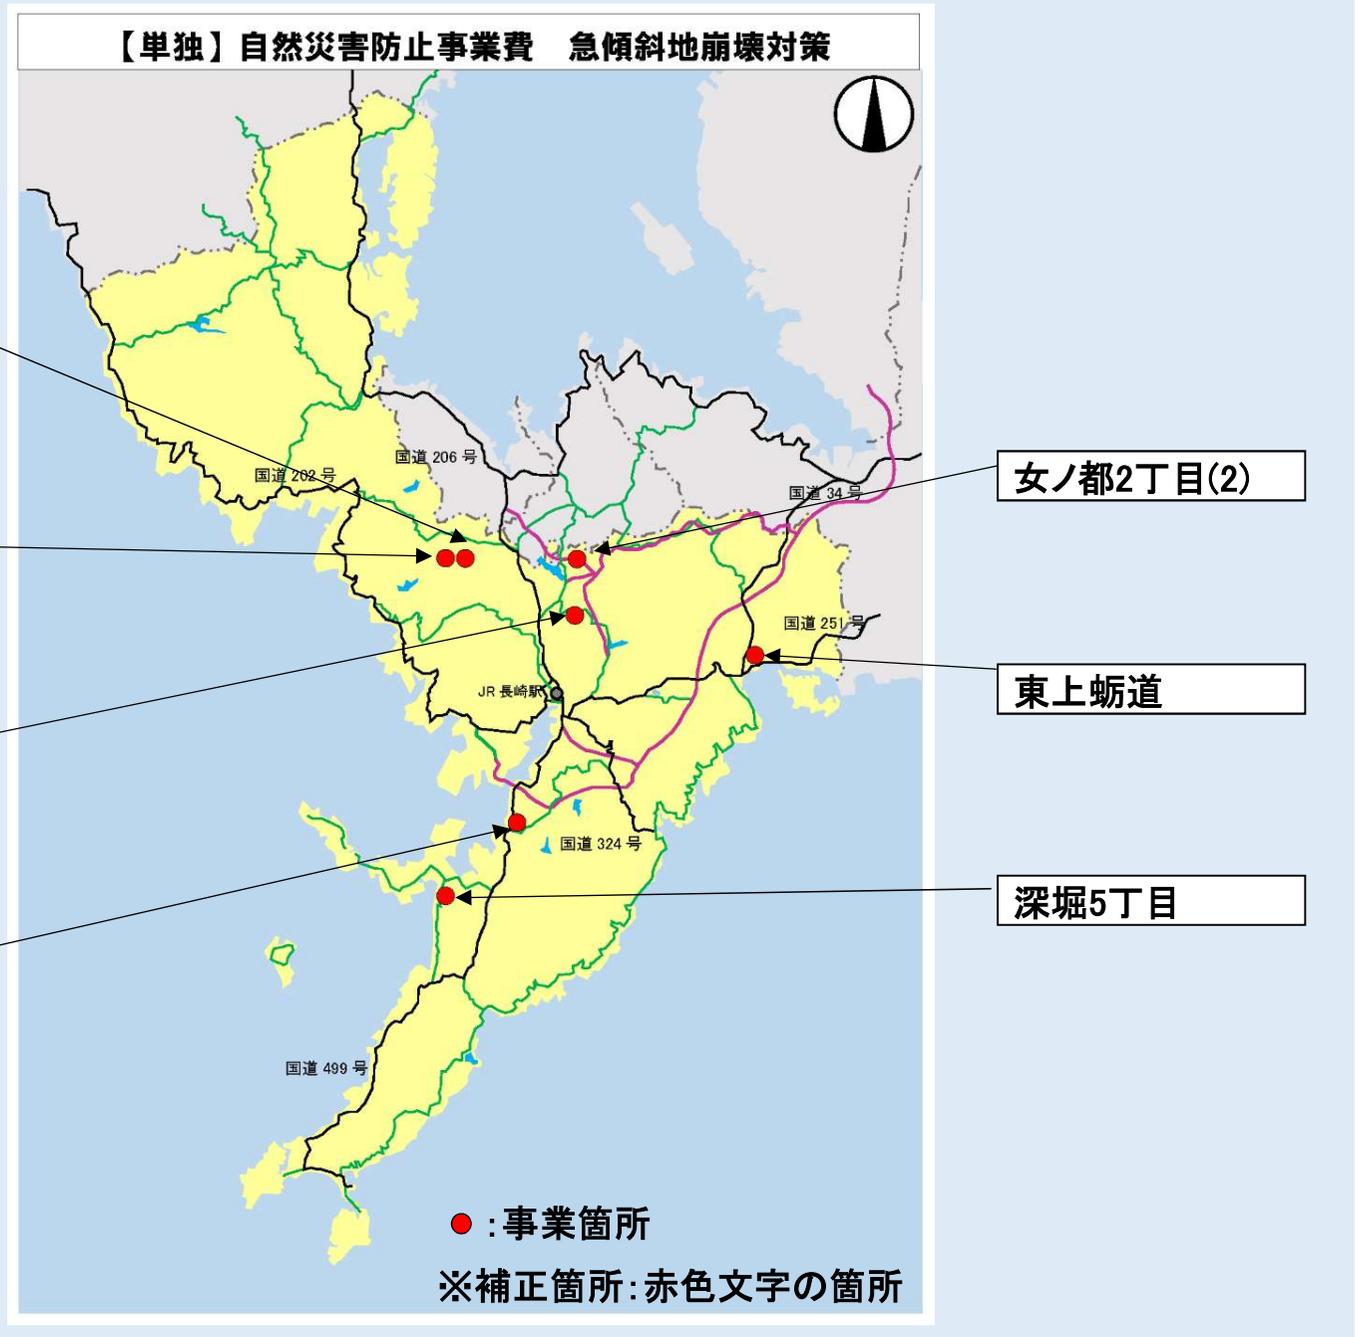

5 平面図

小ヶ倉 2 丁目 (4)



(補正前) 用地測量  
 (補正後) 用地測量、工事 (L=20m)



凡 例	
	令和4年度までに施行
	令和5年度に施行予定
	令和6年度以降に施行予定

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
44～45	8 土木費	3 河川海岸費	2 河川改良費	【単独】自然災害防止事業費 急傾斜地崩壊対策	20,000 千円

### 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金 ※1	地方債 ※2	その他 ※3	一般財源
12月補正後 予算現額	千円 105,000	千円 —	千円 50,000	千円 47,500	千円 3,451	千円 4,049
支出予定額	85,000	—	40,000	37,900	3,100	4,000
繰越明許額	20,000	—	10,000	9,600	351	49

※1 県費補助率 対象事業費20,000千円の50%

※2 起債充当率 地方負担金の100%(緊急自然災害防止対策事業債)  
(交付税措置率70%)

※3 急傾斜地崩壊対策事業費寄附金

### 2 事業内容

・急傾斜地の崩壊による被害から市民の生命と身体を守るため、急傾斜地崩壊対策工事等を実施するもの。

### 3 繰越概要

【工事】小ヶ倉2丁目(4) L=20m

### 4 繰越事由

県費補助金の追加内示に伴う対策工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和6年9月

### 5 位置図



(繰越分)  
工事：小ヶ倉2丁目(4)

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
44～45	8 土木費	3 河川海岸費	2 河川改良費	【補助】河川等整備事業費 (社会資本整備総合交付金) 大井手川	27,600 千円

### 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金※2	地方債※3	その他	一般財源
予算現額	千円 71,300	千円 23,100	千円 23,100	千円 22,500	千円 —	千円 2,600
支出予定額	43,700	13,900	13,900	14,300	—	1,600
繰越明許額	27,600	9,200	9,200	8,200	—	1,000

※1 国庫補助率 1/3

※2 県負担率 1/3

※3 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

### 2 全体計画

【事業期間】平成13年度から令和12年度まで（認可期間 平成13年度から令和10年度まで）

【事業計画】延長 L=2,150m 【総事業費】2,500,000千円 【進捗率】78%(令和5年3月末)

### 3 繰越概要

【工事】L=28m


【補償】電柱移設補償 一式

### 4 繰越事由

支障物件の移設等に不測の日数を要し、河川整備工事及び電柱移設補償が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和6年5月

### 5 位置図

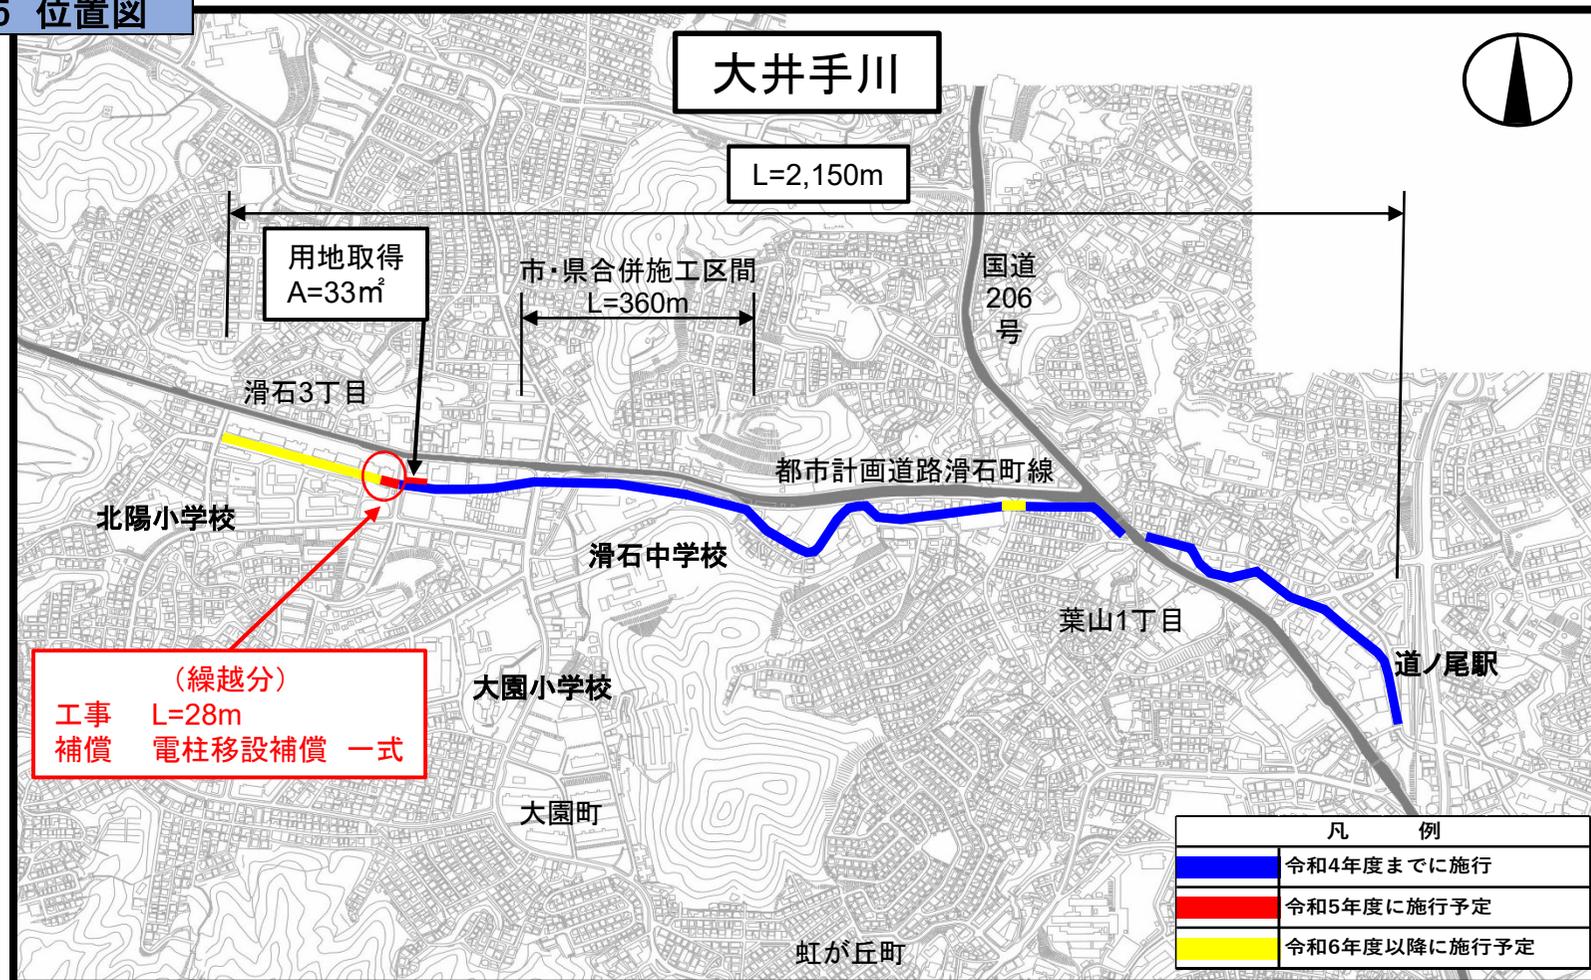

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
46～47	8 土木費	5 都市計画費	3 街路事業費	【補助】都市計画街路整備事業費 (社会資本整備総合交付金) 新地町稲田町線	34,600 千円

### 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 49,700	千円 24,050	千円 —	千円 23,000	千円 —	千円 2,650
支出予定額	15,100	7,550	—	6,800	—	750
繰越明許額	34,600	16,500	—	16,200	—	1,900

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

### 2 全体計画

【事業期間】平成12年度から令和9年度まで (認可期間 平成12年度から令和9年度まで)

【事業計画】延長 L=400m 幅員 W=15m

【総事業費】4,100,000千円

【進捗率】80%(令和5年3月末)

### 3 繰越概要


【工事】L=100m

### 4 繰越事由

道路整備箇所において、本年度、電線管理者と委託契約した電線共同溝整備工事(先行工事)と重複した箇所の工程調整に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定:令和6年5月

### 5 位置図

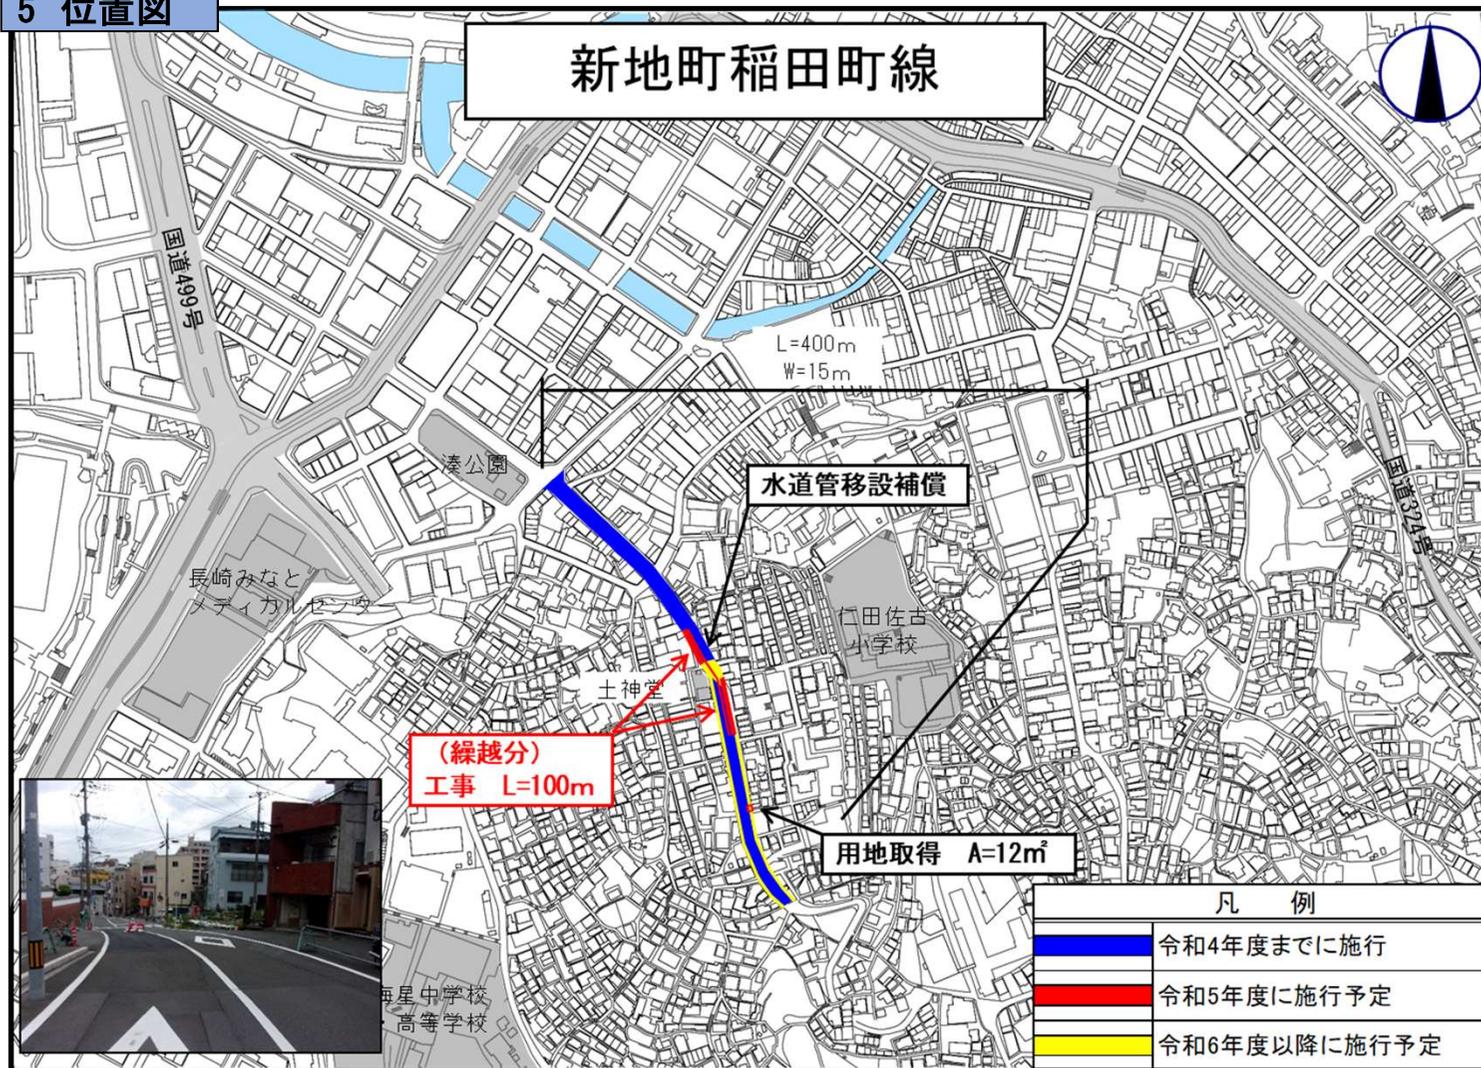

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
46～47	8 土木費	5 都市計画費	3 街路事業費	【補助】都市計画街路整備事業費 (社会資本整備総合交付金) 片淵線(新大工工区)	10,900 千円

### 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 33,300	千円 15,930	千円 —	千円 15,600	千円 —	千円 1,770
支出予定額	22,400	10,741	—	10,500	—	1,159
繰越明許額	10,900	5,189	—	5,100	—	611

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

### 2 全体計画

【事業期間】平成28年度から令和9年度まで (認可期間 平成28年度から令和6年度まで)

【事業計画】延長 L=270m 幅員 W=8m

【総事業費】674,600千円

【進捗率】33%(令和5年3月末)

### 3 繰越概要


【工事】L=100m

### 4 繰越事由

地下埋設物等の移設に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和6年5月

### 5 位置図

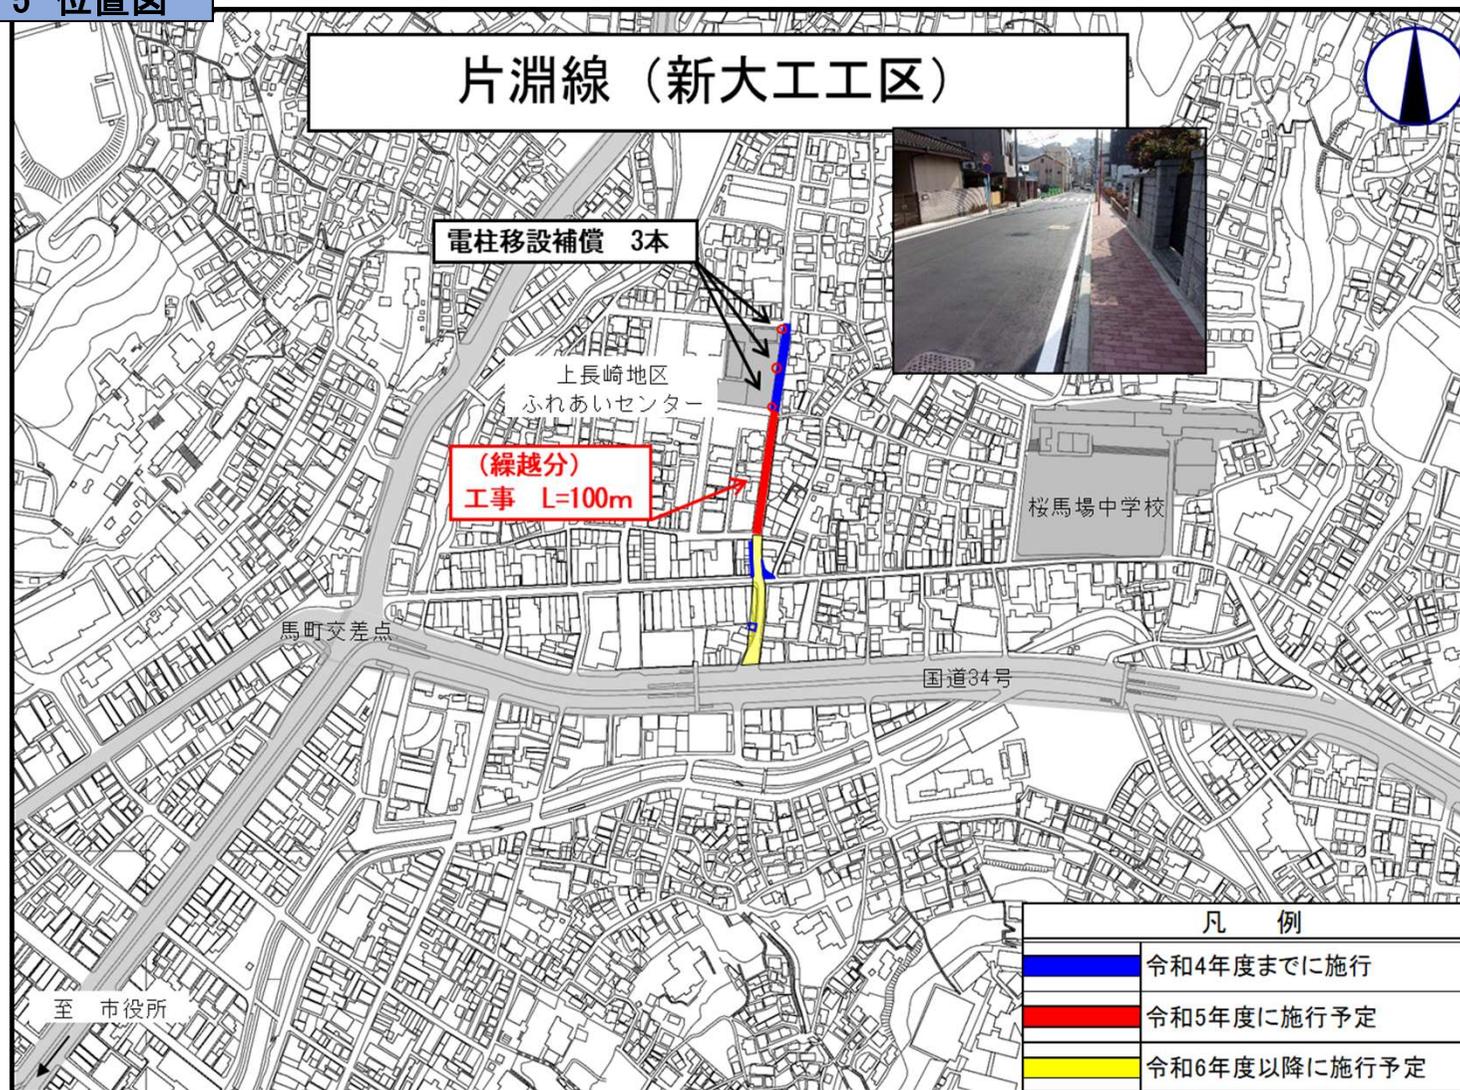

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
48～49	8 土木費	5 都市計画費	3 街路事業費	【単独】都市計画街路整備事業費 地方道路等整備事業費	10,000 千円

### 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
予算現額	千円 50,000	千円 —	千円 —	千円 45,000	千円 —	千円 5,000
支出予定額	40,000	—	—	36,000	—	4,000
繰越明許額	10,000	—	—	9,000	—	1,000

※ 起債充当率 90%(地方道路等整備事業債)(交付税措置率 ー%)

### 2 事業内容

交通環境及び居住環境の向上を図るため、都市の骨格となる都市計画道路の整備を行うもの。

### 3 繰越概要

片淵線(新大工工区)


【工事】L=100m

### 4 繰越事由

地下埋設物等の移設に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定:令和6年5月

### 5 位置図

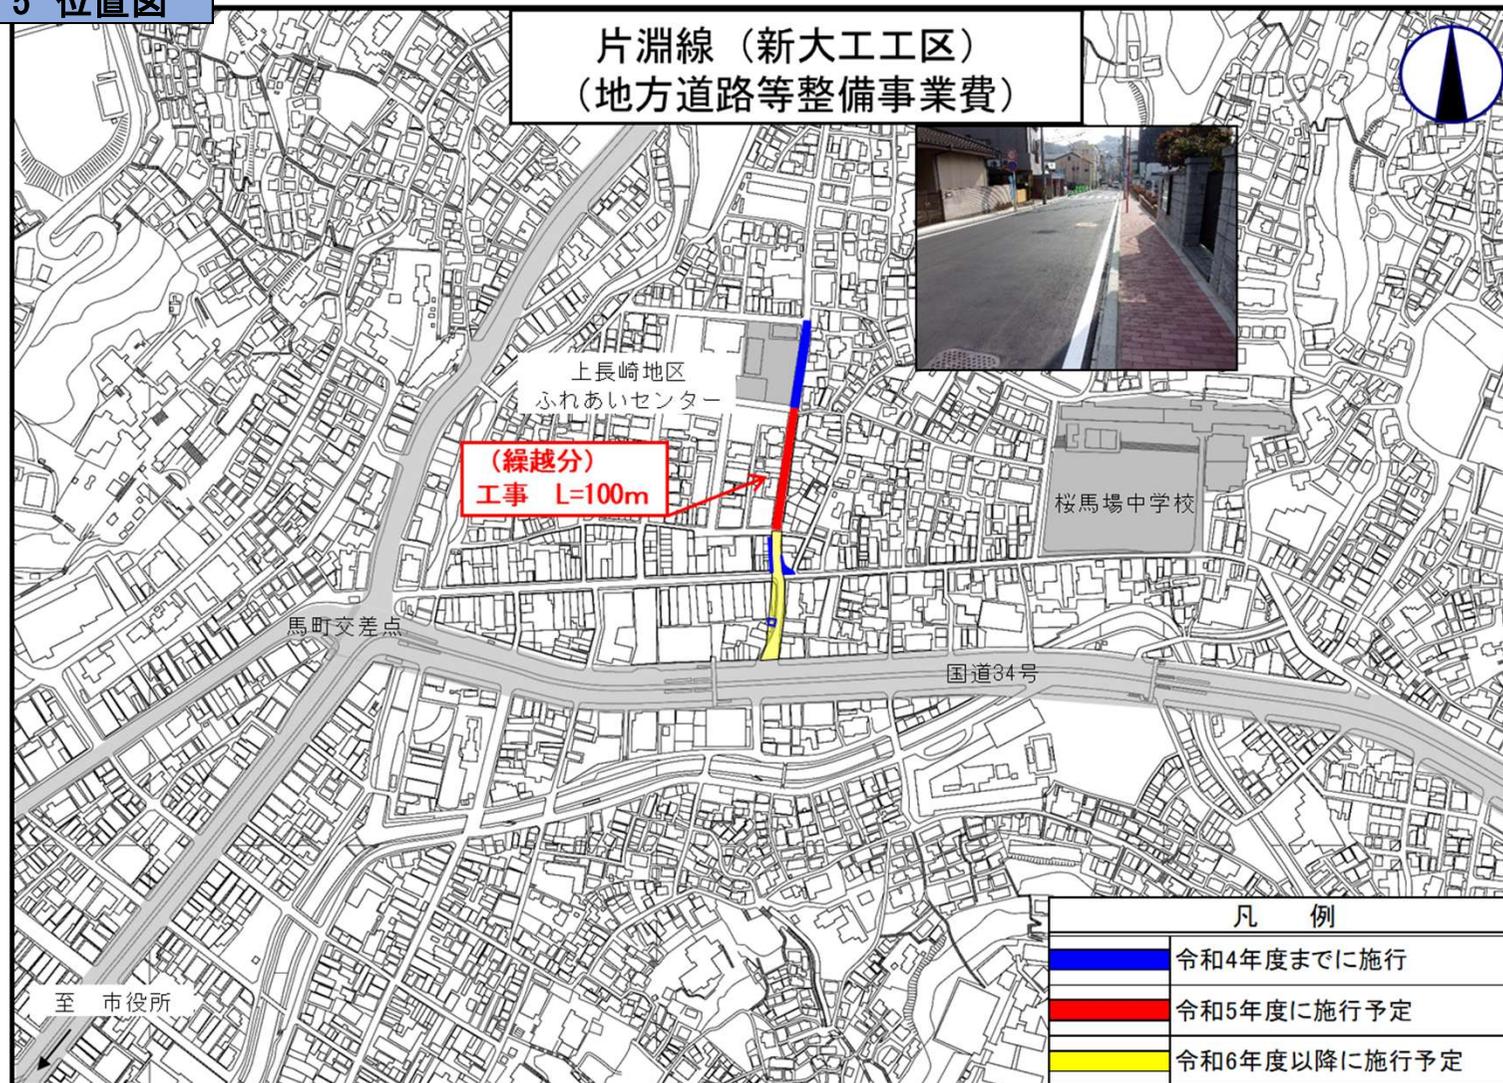

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
48～49	8 土木費	5 都市計画費	6 公園費	【補助】公園等施設整備事業費 金比羅公園	41,500 千円

## 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 62,500	千円 25,000	千円 —	千円 32,200	千円 —	千円 5,300
支出予定額	21,000	10,000	—	9,900	—	1,100
繰越明許額	41,500	15,000	—	22,300	—	4,200

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 補助事業 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率22.2%)

単独事業 地方負担分の75%(一般単独事業債)(交付税措置率 —%)

## 2 全体計画

【事業期間】平成22年度から令和8年度まで (認可期間 平成22年度から令和8年度まで)

【事業計画】面積 A=21ha

【総事業費】588,000千円

【進捗率】54%(令和5年3月末)

### 3 繰越概要


【工事】L=30m

### 4 繰越事由

本年度、園路整備を施行するにあたり、地元との調整に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和6年5月

### 5 位置図

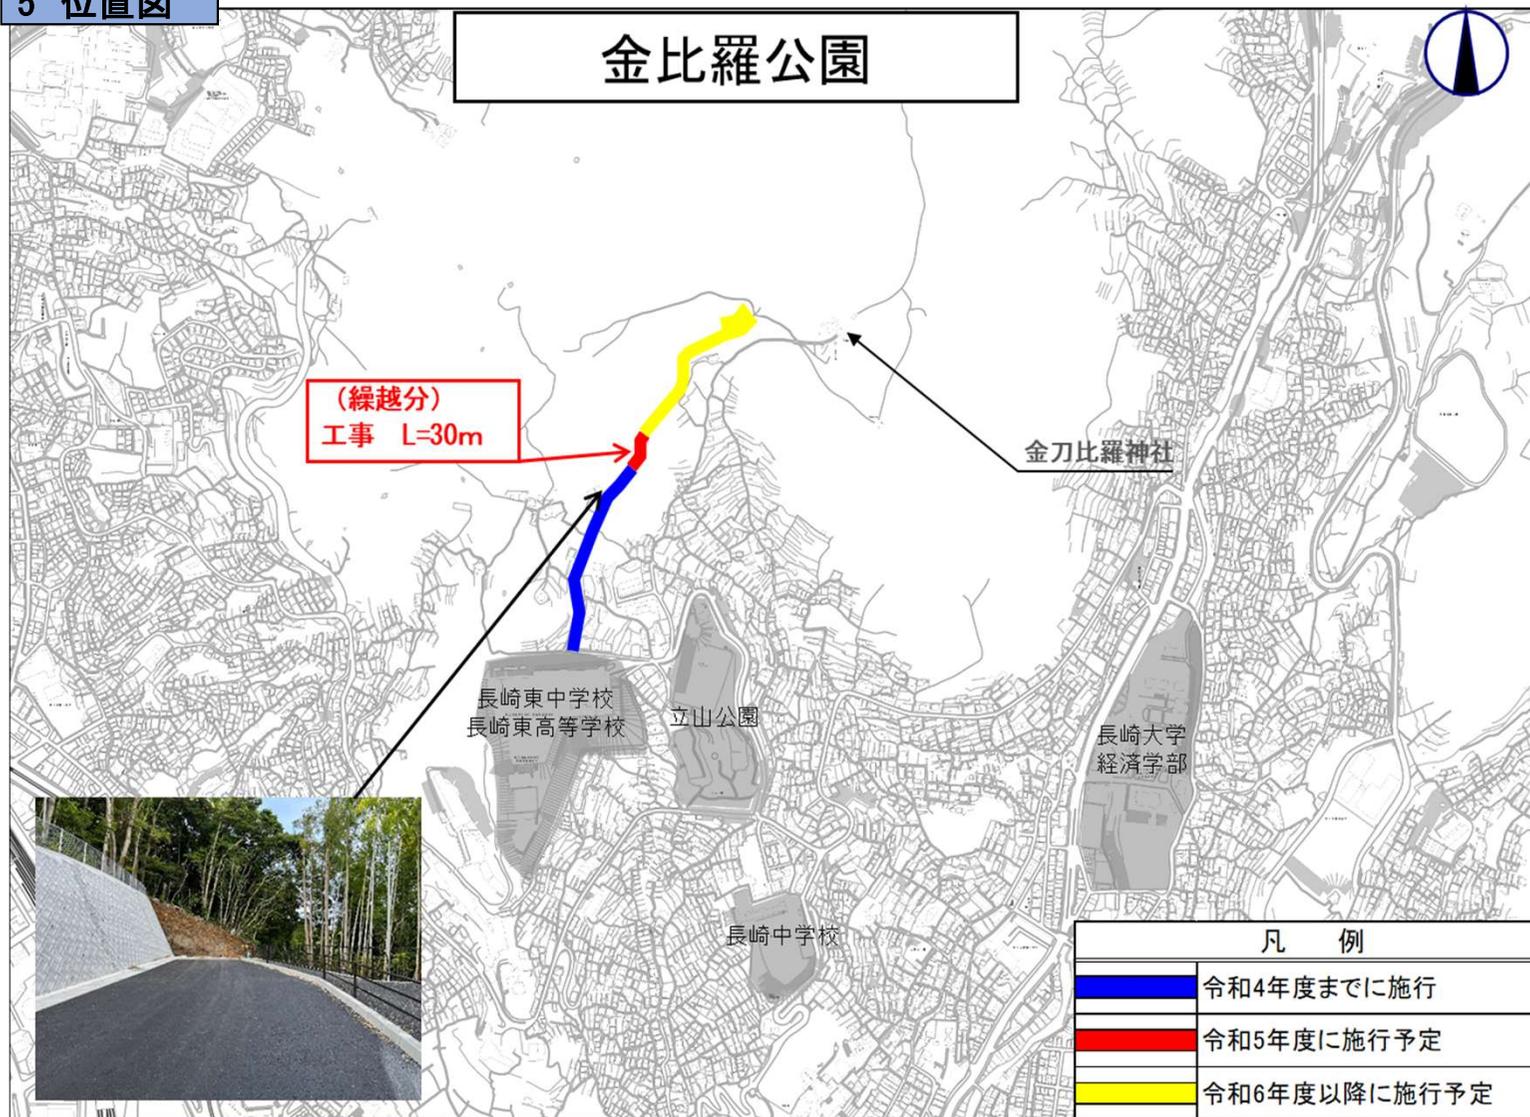

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
48～49	8 土木費	5 都市計画費	6 公園費	【単独】公園施設整備事業費 公園施設長寿命化	227,400 千円

## 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※1	その他※2	一般財源
予算現額	千円 298,800	千円 —	千円 —	千円 149,100	千円 100,000	千円 49,700
支出予定額	71,400	—	—	53,600	0	17,800
繰越明許額	227,400	—	—	95,500	100,000	31,900

※1 起債充当率 地方負担分の75%(一般単独事業債)(交付税措置率 ー%)

※2 企業版ふるさと納税寄附金

## 2 事業内容

### 【令和5年度事業内容】

長崎東公園	プール槽設計 一式
長崎市総合運動公園	野球場外壁ほか改修 一式
稲佐山公園	スロープカー改修 一式、噴水改修 一式

## ①長崎市総合運動公園


### 3 繰越概要

【工事】野球場外壁ほか改修 一式  
【繰越明許額】100,400千円

### 4 繰越事由

長崎市総合運動公園において、関連工事との調整に不測の日数を要し、改修工事が年度内に完了しない見込みであるため。  
繰越箇所の完了予定：令和6年5月

### 5 位置図

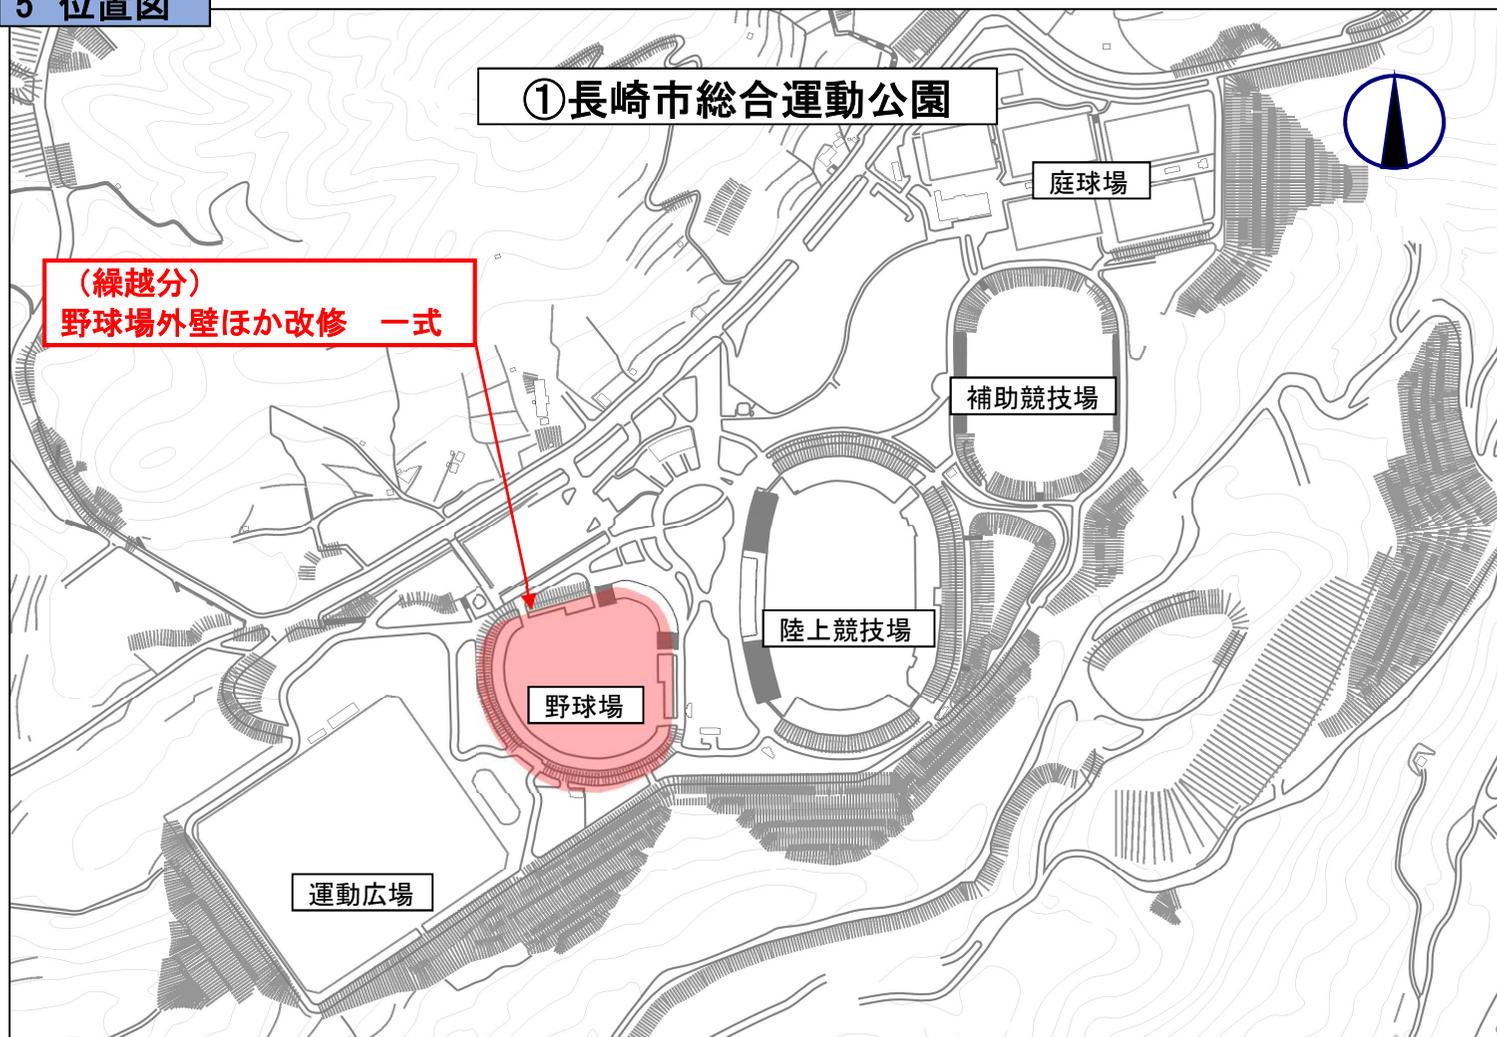

## ②稲佐山公園

### 3 繰越概要


【工事】スロープカー改修 一式  
噴水改修 一式  
【繰越明許額】127,000千円

### 4 繰越事由

稲佐山公園において、電子部品の一部に納期遅延が生じており、資材納入に不測の日数を要し、改修工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和6年9月

### 5 位置図

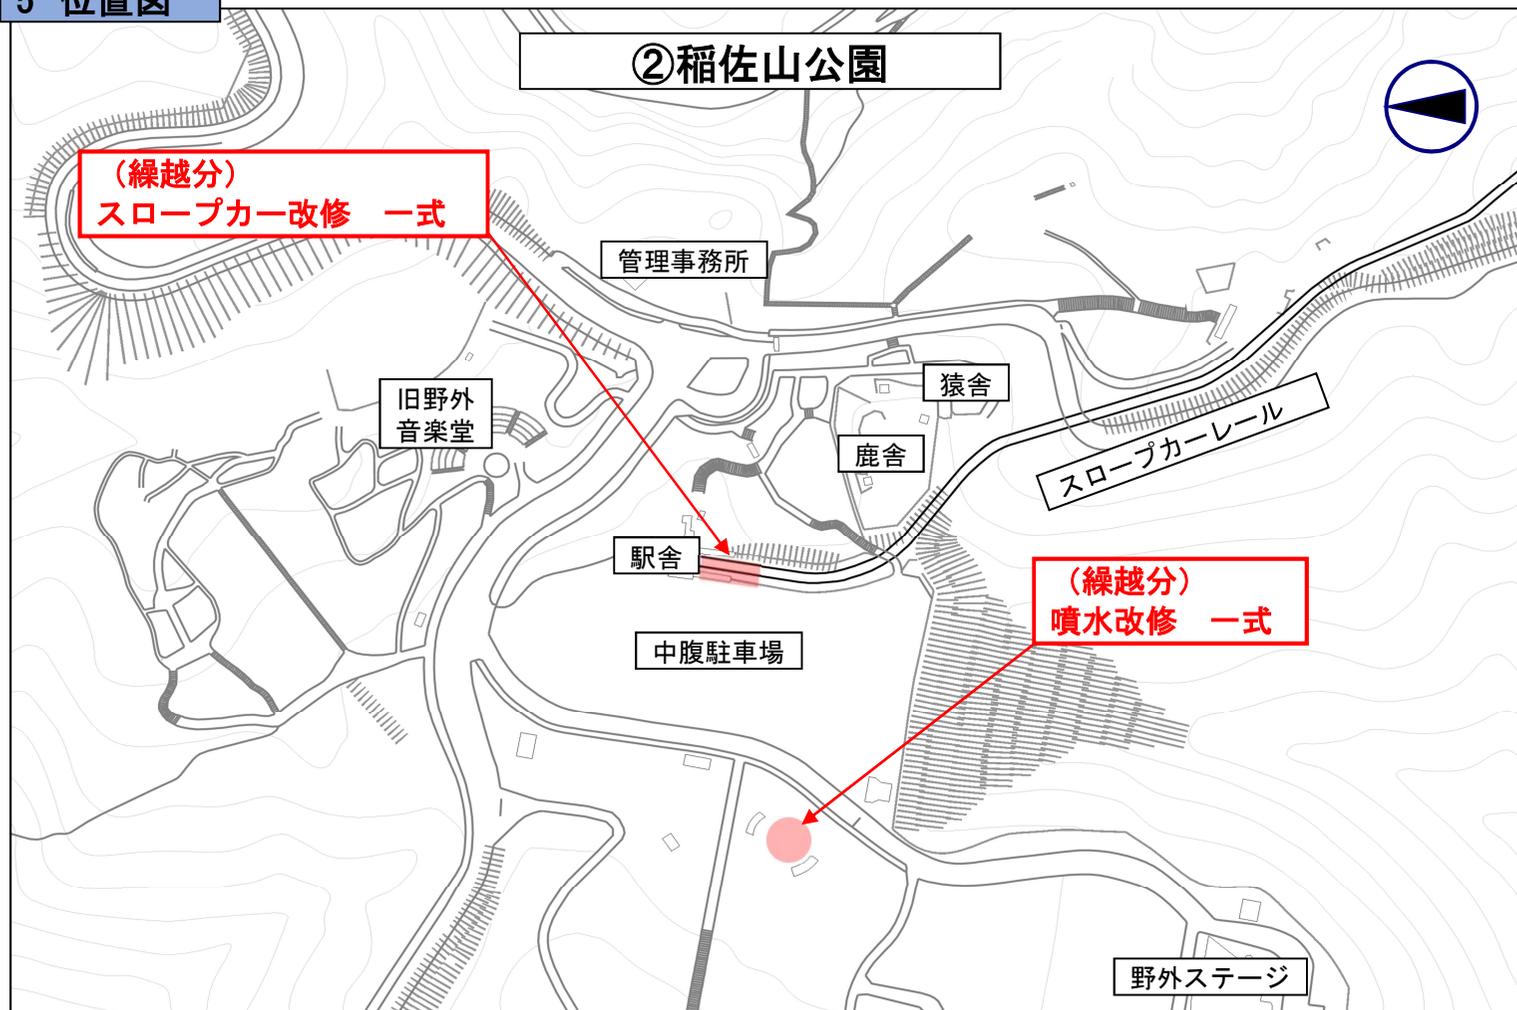

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
48～49	8 土木費	5 都市計画費	7 県施行事業費 負担金	都市計画費負担金	千円
				社会資本整備総合交付金事業費	66,000
				旧地方特定道路整備事業費	6,720
				合計	72,720

### 1 事業費及び財源内訳

事業名	区分	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
都市計画費負担金 社会資本整備総合 交付金事業費	予算現額	千円 198,105	千円 —	千円 —	千円 178,200	千円 —	千円 19,905
	支出予定額	132,105	—	—	118,800	—	13,305
	繰越明許額	66,000	—	—	59,400	—	6,600
都市計画費負担金 旧地方特定道路 整備事業費	予算現額	千円 13,200	千円 —	千円 —	千円 11,800	千円 —	千円 1,400
	支出予定額	6,480	—	—	5,800	—	680
	繰越明許額	6,720	—	—	6,000	—	720
合計	予算現額	千円 211,305	千円 —	千円 —	千円 190,000	千円 —	千円 21,305
	支出予定額	138,585	—	—	124,600	—	13,985
	繰越明許額	72,720	—	—	65,400	—	7,320

※起債充当率 社会資本整備総合交付金事業費：地方負担分の90%（公共事業等債）（交付税措置率 22.2%）  
旧地方特定道路整備事業費：地方負担分の90%（地方道路等整備事業債）（交付税措置率 —%）

## 2 路線別内訳

### (1) 社会資本整備総合交付金事業費

図面 番号	路線名	県施行 事業費	負担額内訳 ( )内は負担割合				
			国 (※1)	県 (※2)	市(1/10)		
					市負担額 (予算現額)	支出予定額	繰越明許額
①	補) (都) 滑石町線 (大神宮工区)	千円 1,281,050	千円 743,009	千円 409,936	千円 128,105	千円 120,105	千円 8,000
②	補) (都) 長崎時津縦貫線 (茂里町～滑石工区)	700,000	385,000	245,000	70,000	12,000	58,000
合 計		千円 1,981,050	千円 1,128,009	千円 654,936	千円 198,105	千円 132,105	千円 66,000

補): 補助事業 (都): 都市計画道路 図面番号○: 繰越予定路線

※1: (都) 滑石町線: 5.8/10、(都) 長崎時津縦貫線: 5.5/10 ※2: (都) 滑石町線: 3.2/10、(都) 長崎時津縦貫線: 3.5/10

(2) 旧地方特定道路整備事業費

図面 番号	路線名	県施行 事業費	負担額内訳 ( )内は負担割合				
			国 (一)	県 (8.0/10)	市(2.0/10)		
					市負担額 (予算現額)	支出予定額	繰越明許額
③	単)(都)滑石町線 (大神宮工区)	千円 16,000	千円 —	千円 12,800	千円 3,200	千円 80	千円 3,120
④	単)(都)長崎時津縦貫線 (茂里町～滑石工区)	50,000	—	40,000	10,000	6,400	3,600
合 計		千円 66,000	千円 —	千円 52,800	千円 13,200	千円 6,480	千円 6,720

単):単独事業 (都):都市計画道路 図面番号○:繰越予定路線



# ① 補) (都)滑石町線(大神宮工区)

## 4 繰越概要


【工事】道路改良(排水工) L=250m  
道路改良(舗装) L=370m

## 5 繰越事由

沿線地権者等との調整や近接する工事との工程調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定: 令和6年9月

## 6 位置図

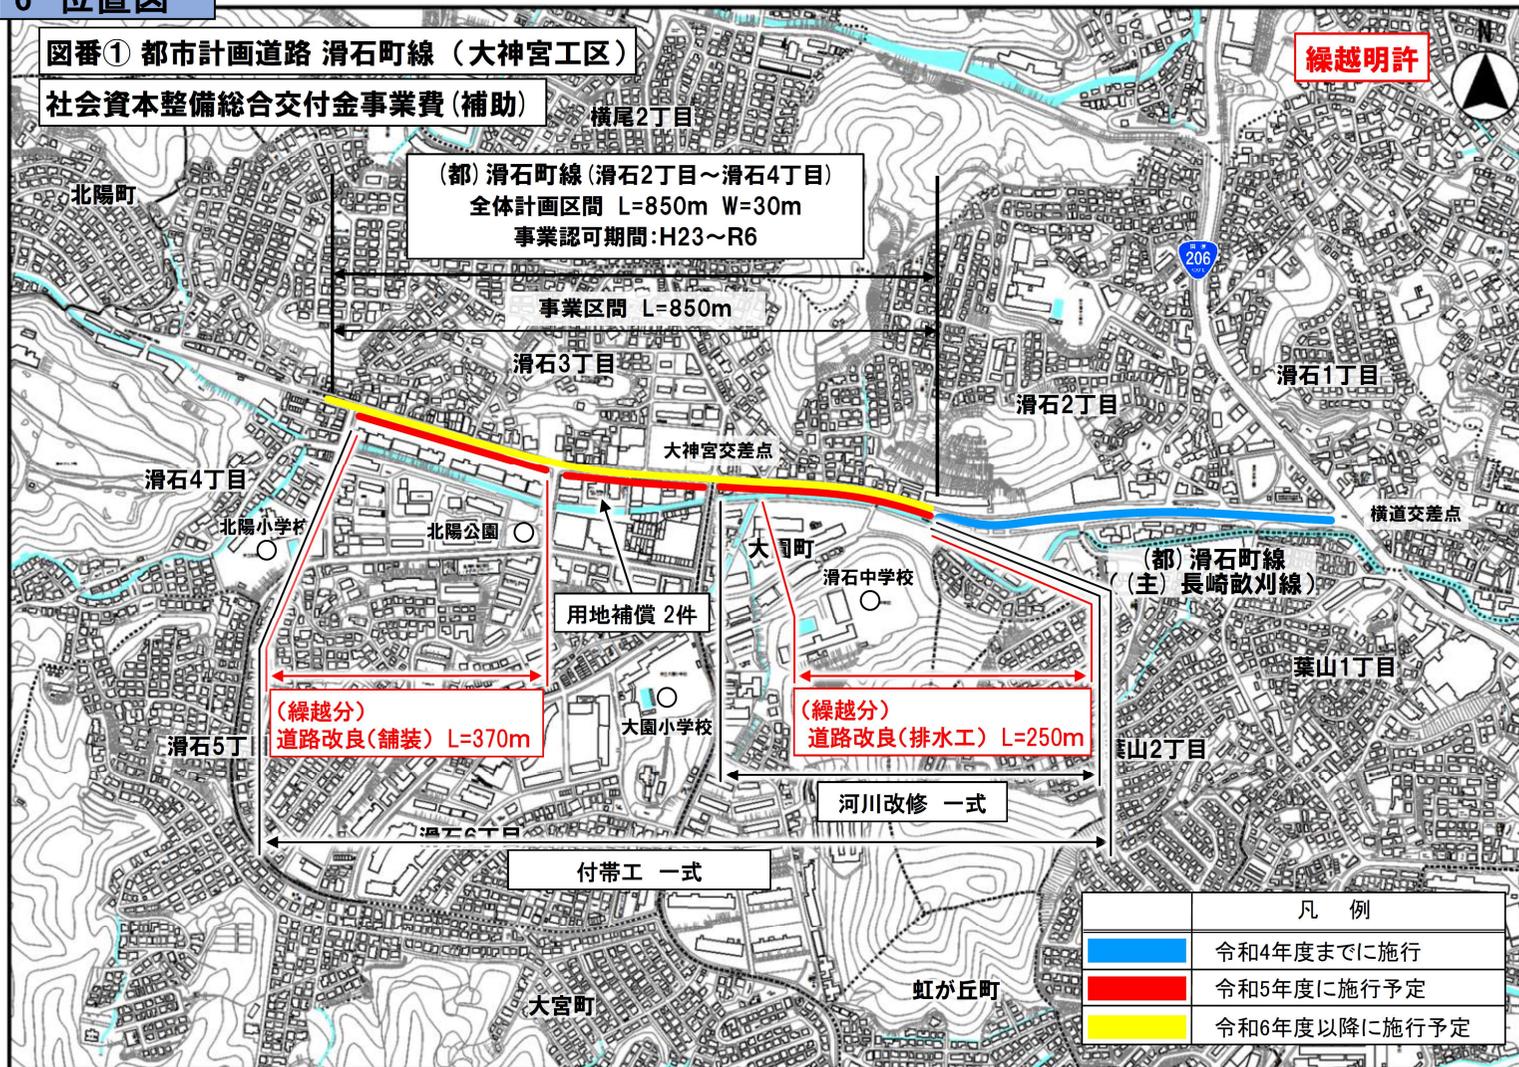

## ② 補) (都)長崎時津縦貫線(茂里町～滑石工区)

### 4 繰越概要


【委託】橋梁設計 一式  
境界確定測量 一式  
トンネル設計 一式  
水文調査 一式

### 5 繰越事由

設計にかかる施設管理者等との計画調整や、現地調査にかかる地権者等との調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定: 令和6年9月

### 6 位置図

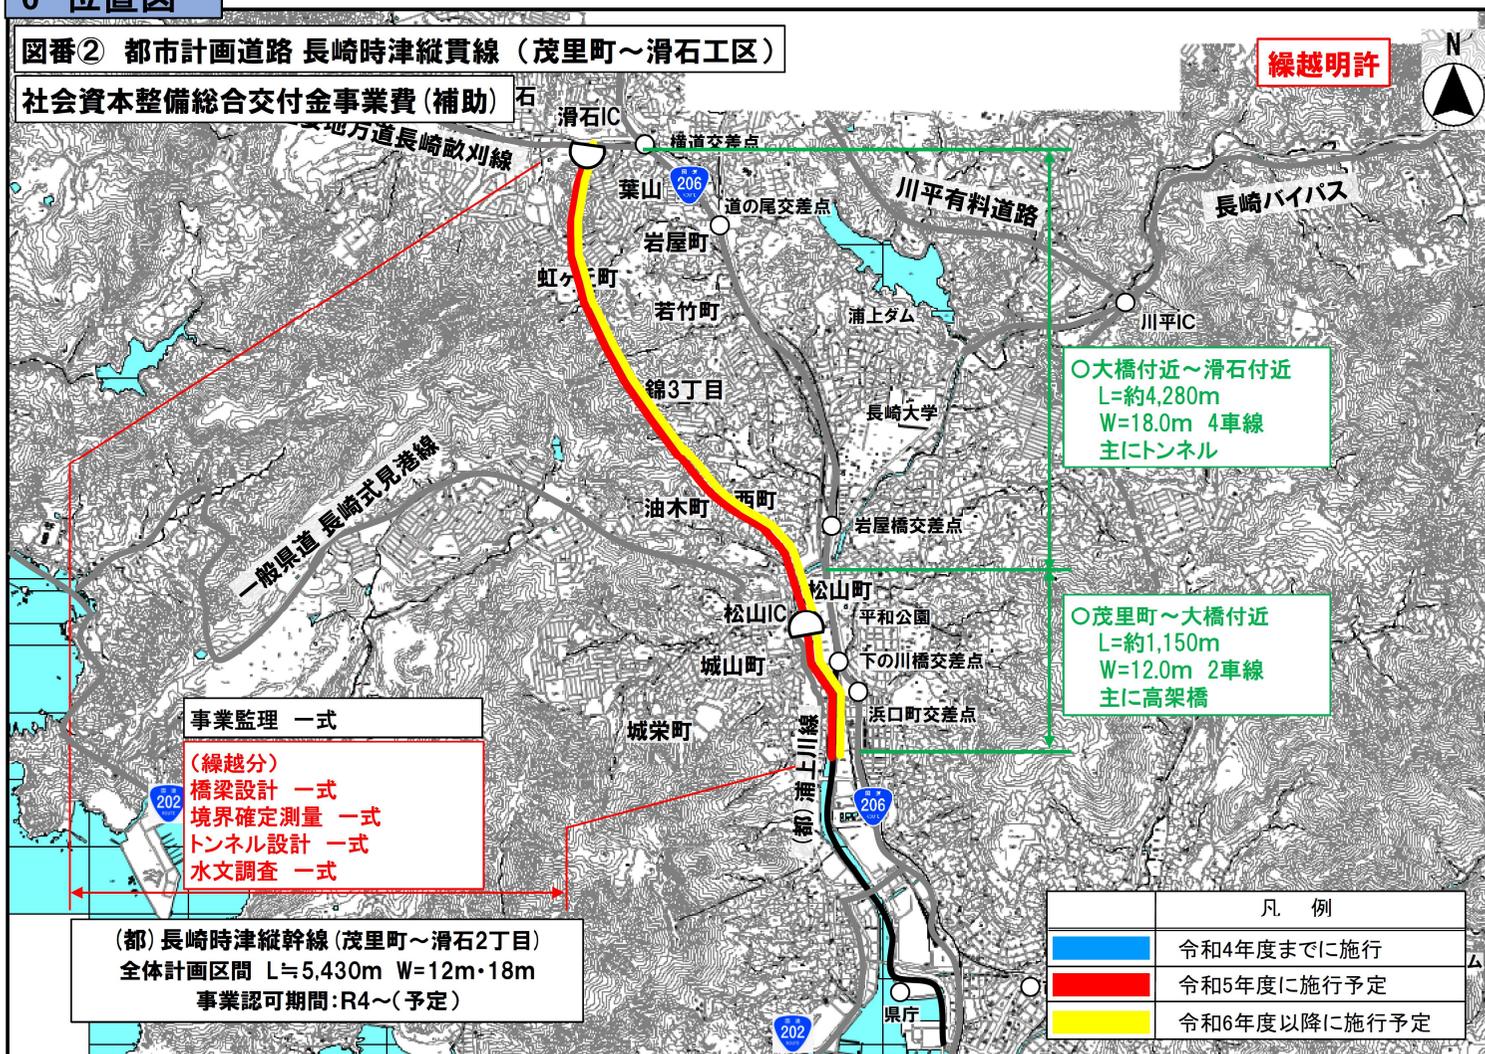

### ③ 単) (都)滑石町線(大神宮工区)

#### 4 繰越概要


【補償】電柱移設補償 一式

#### 5 繰越事由

支障電柱の移設にかかる沿線地権者等との調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定: 令和6年8月

#### 6 位置図

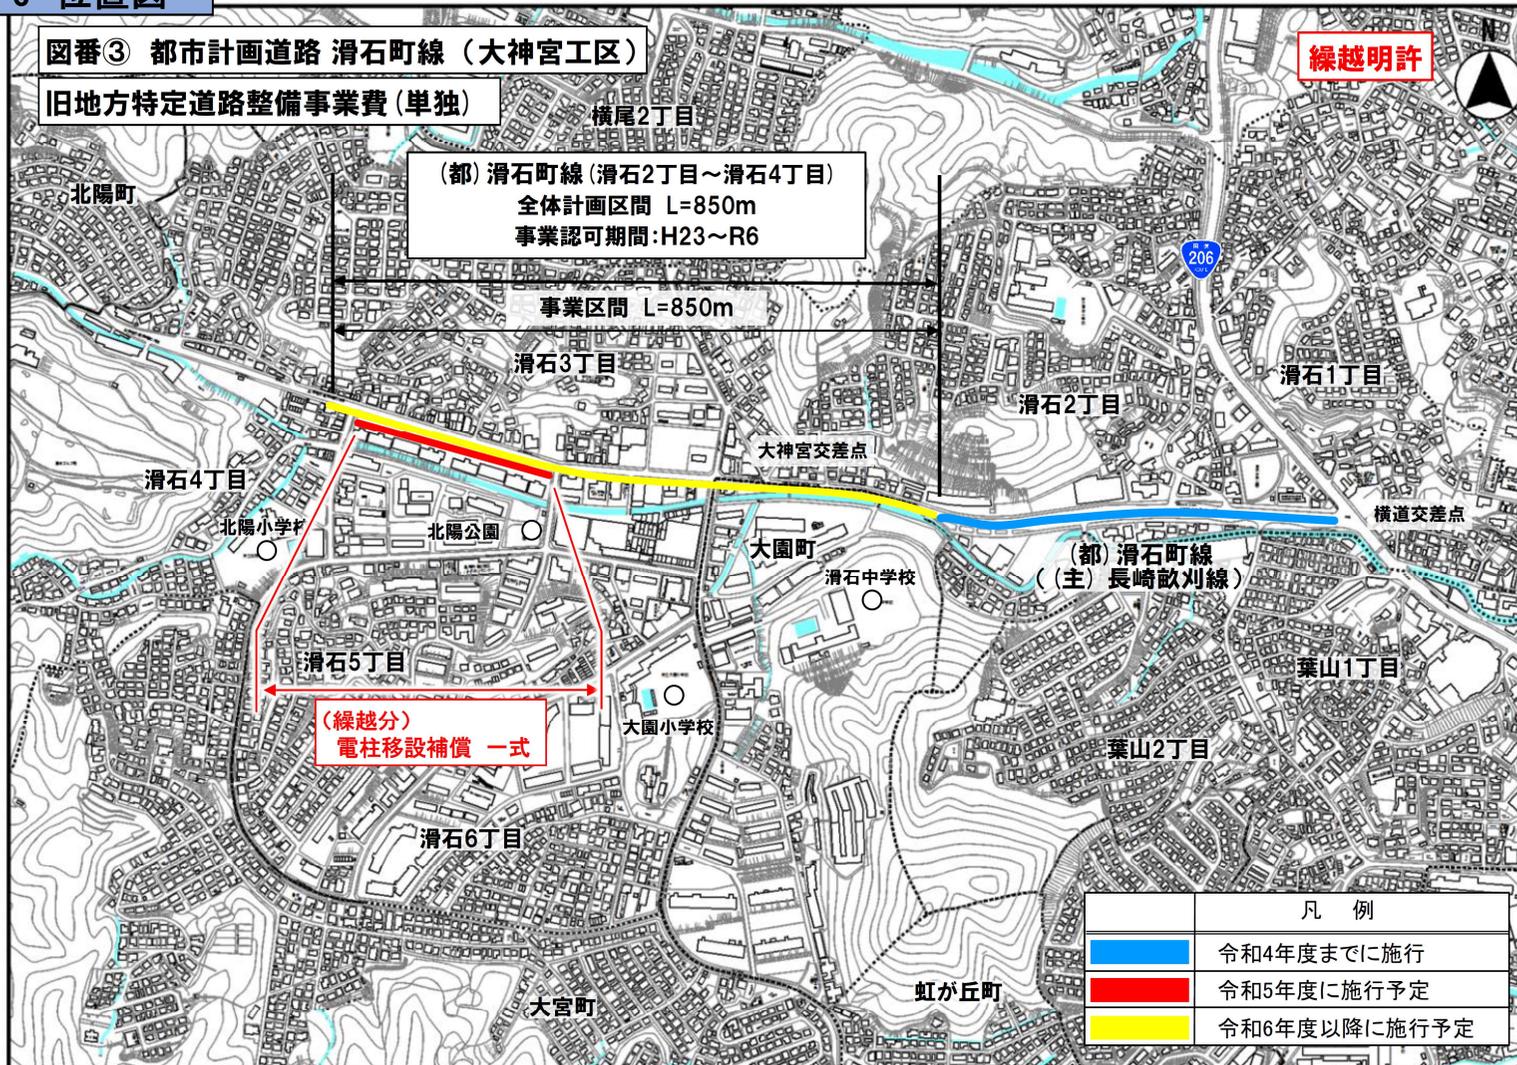

#### ④ 単) (都)長崎時津縦貫線(茂里町～滑石工区)

##### 4 繰越概要

【委託】調査設計 一式

##### 5 繰越事由

設計に必要となる現地調査にかかる地権者等との調整に不測の日数を要したことにより、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定:令和6年9月

##### 6 位置図

