

第7号議案

令和7年度長崎市一般会計補正予算（第10号）

目次

4款2項2目 ごみ処理費

・【単独】ごみ処理施設等整備事業費 三京クリーンランド埋立処分場

資料
ページ

予算説明書
ページ

・・・ 2～5

40～43

環 境 部
令和8年2月

予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
40～43	4 衛生費	2 清掃費	2 ごみ処理費	1-1	【単独】ごみ処理施設等整備 事業費 三京クリーンランド埋立処分場	千円 ▲44,740

1 事業概要


本事業は、三京クリーンランド埋立処分場における施設等の整備を行うもので、そのうち、土堰堤整備事業については、当該処分場において2工区の埋立進捗に伴い、廃棄物や浸出水の流出を防止するため、3工区にある土砂(約17,000m³)を2工区に運搬し、土堰堤を整備するもの。

なお、3工区の土砂運搬後の跡地については、令和8年度に太陽光発電設備設置に係る測量・設計、令和9年度に太陽光発電設備の設置工事を脱炭素先行地域づくり事業で実施する予定としている。

(参考)

土堰堤とは、埋立処分場の埋立進捗に伴い、廃棄物や浸出水の流出防止のため、主に土砂を材料として盛り固めて作られた構造物のこと。

また、廃棄物を埋め立てる区域と外部の区域を明確に区切り、環境保全のための重要な役割を果たすものである。

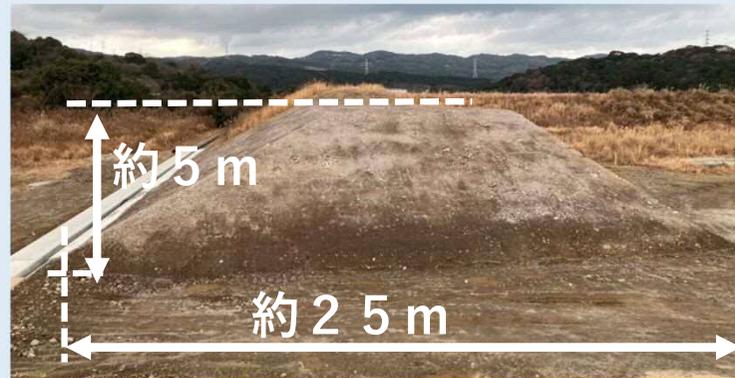

【三京クリーンランド埋立処分場 土堰堤現場写真】

1 事業概要

【当初計画】


土堰堤整備事業については、令和7年7月から令和8年2月までの約8か月の工期で、3工区にある土砂(約17,000m³)を2工区に運搬し、土堰堤を整備する計画としており、本事業の財源については、地方債及び一般財源で対応することとしていた。

【減額する理由】

土堰堤整備事業については、環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付対象事業に該当することが年度当初に判明したことから、令和7年度に実施する事業について、交付対象事業として取扱いができるよう、環境省と協議を重ねてきたが、令和7年7月に、令和7年度における補助金の追加内示時期は最短で12月下旬であり、内示以前に着工した工事については、補助対象外になるとの回答があった。

また、脱炭素先行地域づくり事業として、令和8年度から予定している太陽光発電設備設置等の実施時期を1年後倒しすることについて環境省と協議したが、困難であるとの回答があった。

このため、土堰堤整備事業については、太陽光発電設備設置等のスケジュールに影響を及ぼさない範囲で実施するとともに有利な財源を活用する必要があることから、事業を縮小して実施したため、減額補正を行うもの。

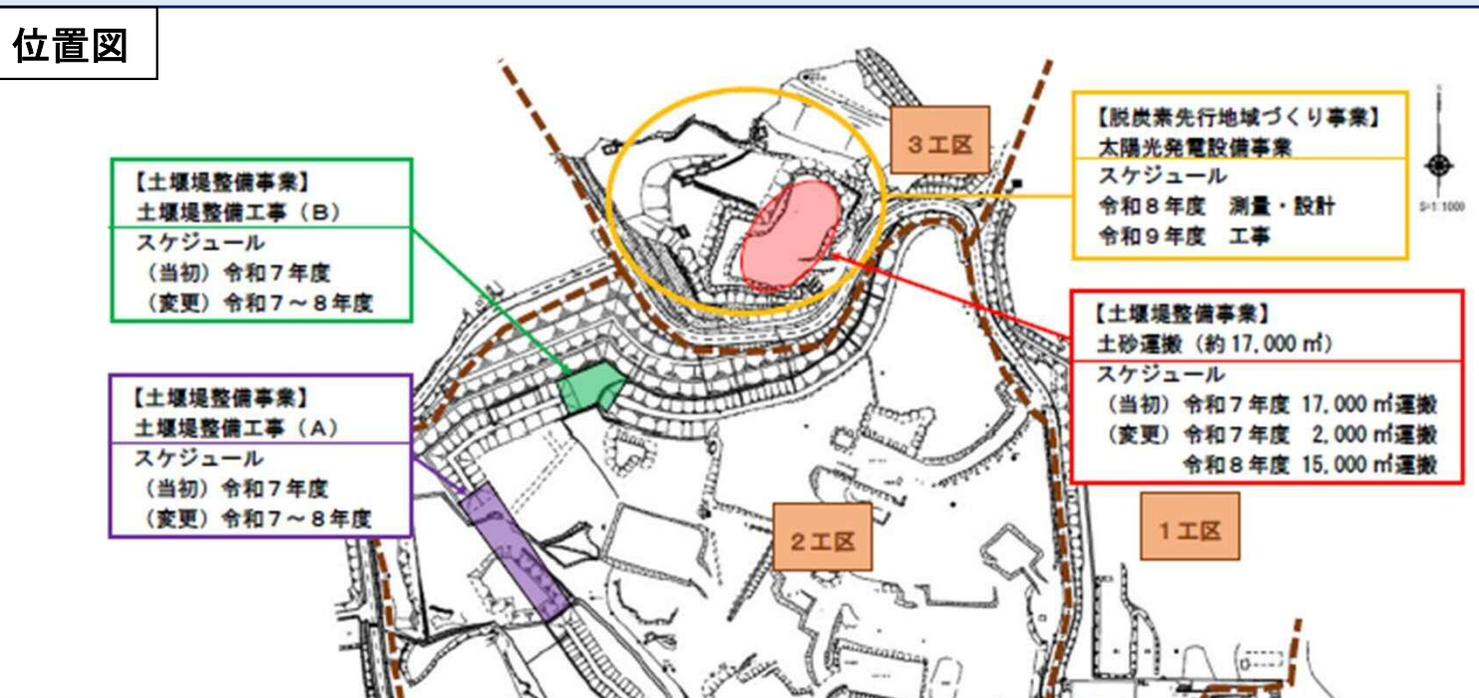

2 スケジュール

		令和7年度												令和8年度												令和9年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
当初	土堰堤整備事業	土堰堤整備 土砂量 [17,000m ³]																																			
	脱炭素先行地域づくり事業													太陽光発電設備 (測量・設計等)												太陽光発電設備 (工事)											
変更後	土堰堤整備事業	土堰堤整備 土砂量 [2,000m ³]												土堰堤整備 土砂量 [15,000m ³]																							
	脱炭素先行地域づくり事業													太陽光発電設備 (測量・設計等)												太陽光発電設備 (工事)											

3 財源内訳

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債 ※1	その他	一般財源
補正前の額 ※2	247,600 (68,653)	—	—	186,200 (51,400)	—	61,400 (17,253)
補正額 ※2	▲44,740 (▲44,740)	—	—	▲33,700 (▲33,700)	—	▲11,040 (▲11,040)
補正後の額 ※2	202,860 (23,913)	—	—	152,500 (17,700)	—	50,360 (6,213)

※1 一般廃棄物処理事業債 充当率 75%(交付税措置率30%) 等

※2 ()書きは、土堰堤整備事業分

4 参考(土堰堤整備事業に係る令和8年度当初予算)

(1) 事業費内訳

事業費 (ア+イ)	77,400千円
ア 工事請負費(土堰堤整備工事)	57,106千円
イ 委託料(土砂運搬業務委託)	20,294千円

(2) スケジュール

項目	月											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
土堰堤整備工事												
土砂運搬業務委託												

(3) 財源内訳

事業費	財源内訳				
	国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
千円 77,400	千円 19,579	千円 -	千円 49,100	千円 -	千円 8,721

※1 循環型社会形成推進交付金 交付率1/3

※2 一般廃棄物処理事業債 充当率 90%(交付税措置率50%)、75%(交付税措置率30%)
