

令和8年9月市議会 建設水道委員会資料

所管事項調査に関する資料

目 次	ページ
1 令和8年度主要事業の執行予定について	2～ 19

中央総合事務所
北総合事務所
令和8年9月

1 令和8年度主要事業の執行予定について

■次の表は現時点における主要事業の執行予定です。今後の執行予定額については、追加の補助があった場合は変更になることがあります。

令和8年8月時点（単位：千円）

区分	番号	事業実施箇所	予算額 (A)	執行 予定額 (B)	差引額 (B)-(A)	予算の内容 → 執行予定内容 ※は補足説明	全体計画及び進捗率				
							事業期間	事業計画	総事業費	進捗率	
										令和7年度 (令和8年3月末)	令和8年度 見込み (令和9年3月末)
道路	1	出来大工町江戸町線	80,000	61,356	▲18,644	工事 L= 400m → 工事 L= 370m	令和7年度 ～ 令和11年度	延長 L= 1,100m	310,000	6%	25%
	2	まちなか地区 (栄町油屋町1号線)	130,000	0	▲130,000	工事 L= 360m → 皆減(令和9年度実施予定)	令和7年度 ～ 令和8年度	延長 L= 360m	131,600	—	0%
	3	交通安全対策 (地区内連携)	20,000	20,000	0	松山町・岡町地区 城山町・城栄町地区 改良工事 一式 → 変更なし	令和7年度 ～ 令和12年度	整備地区数 12地区	116,000	5%	22%
斜面	4	稲佐・朝日地区	54,500	31,938	▲22,562	工事 L= 70m → 工事 L=50m(※) ※内示減による工事 用地取得 ほか → 変更なし 内容の見直し	平成10年度 ～ 令和8年度(令和13年 度まで延長予定)	延長 L= 393m	2,160,000	91%	92%
	5	立山地区	58,000	33,988	▲24,012	工事 L= 30m → 皆減(令和9年度実施予定) 用地取得 ほか → 変更なし	平成15年度 ～ 令和11年度	延長 L= 715m	2,720,000	61%	62%
公園	6	公園施設長寿命化	57,400	32,120	▲25,280	10公園整備工事 → 3公園整備工事	—	—	—	—	—
	7	都市公園機能再編	46,500	30,000	▲16,500	2公園整備工事 → 1公園整備工事(※) ※内示減による工事 内容の見直し	令和6年度 ～ 令和10年度	横尾地区9公園の 再整備	170,340	37%	55%
総合事務所内示率			47%								

【参考】補助内示にかかる予算執行について

【例】事業費 20,000千円(補助率 1/2)で、内示率が80%だった場合

予算額(A) 20,000千円		補助要望額 10,000千円		起債・一財 10,000千円	
内示後	歳入	補助内示額	内示減	内示分に対応する起債・一財	内示減分に対応する起債・一財
	歳出	執行予定額(B)	執行制限額(不用額)※	執行予定額(B)	執行制限額(不用額)※
	16,000千円	8,000千円	2,000千円	8,000千円	2,000千円

※内示減分については補助及び起債充当額が歳入予算計上額よりも減となることから、長崎市予算規則第9条の規定により、予算執行不可(不用額)となる。


【参考】長崎市予算規則(抜粋)

(予算の執行の制限)

第9条 歳出予算のうち、特定の収入を財源とする事務又は事業については、その収入が確定した後に執行するものとする。ただし、財務部長が特に認める場合は、この限りでない。

- 前項の収入が歳入予算に計上した額よりも減少し、又は減少するおそれがあるときは、課長は、財務部長の承認を受けた後でなければその収入を財源とする事務又は事業を執行することができない。

平面図

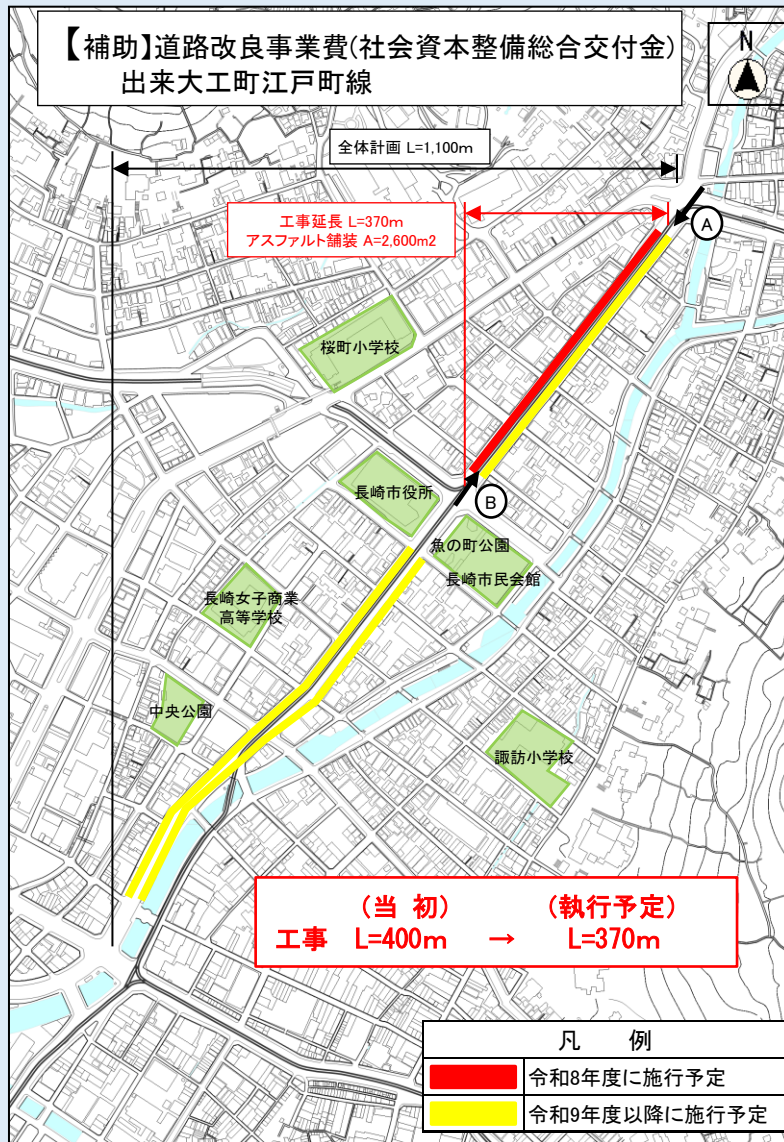

写真


起点側



終点側



平面図

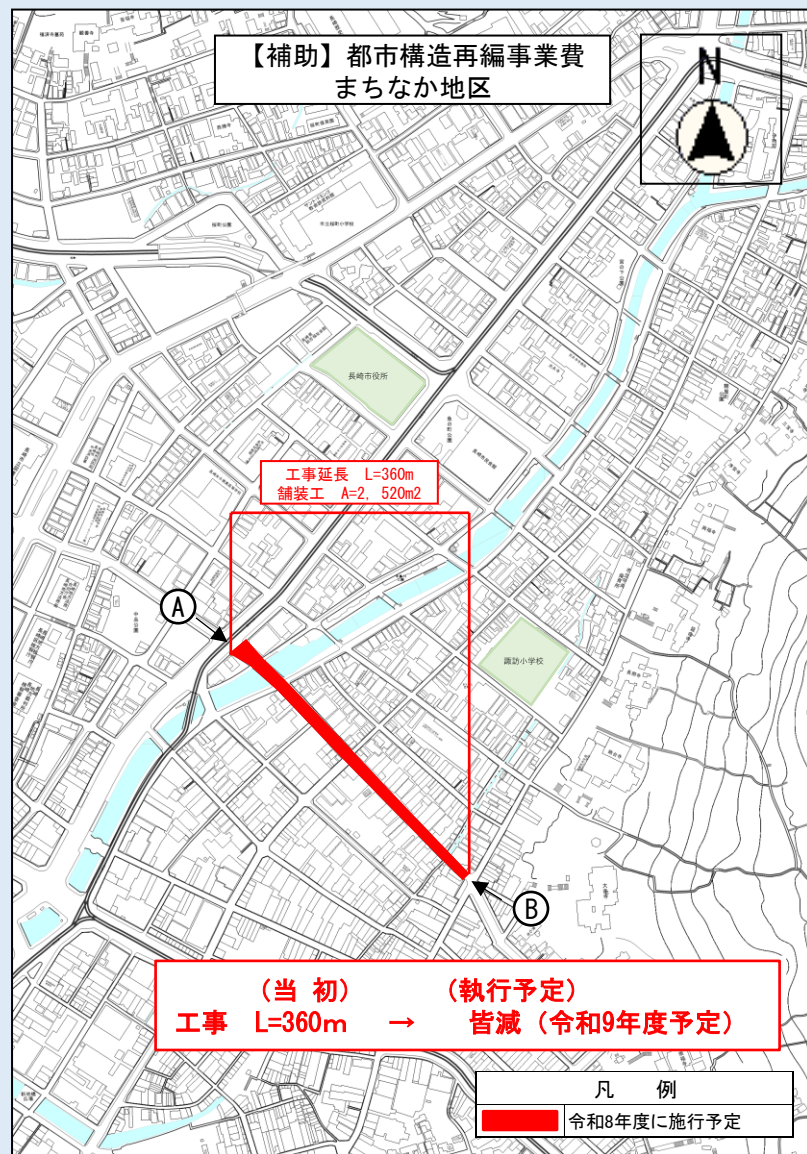

写真


起点側



終点側




平面図

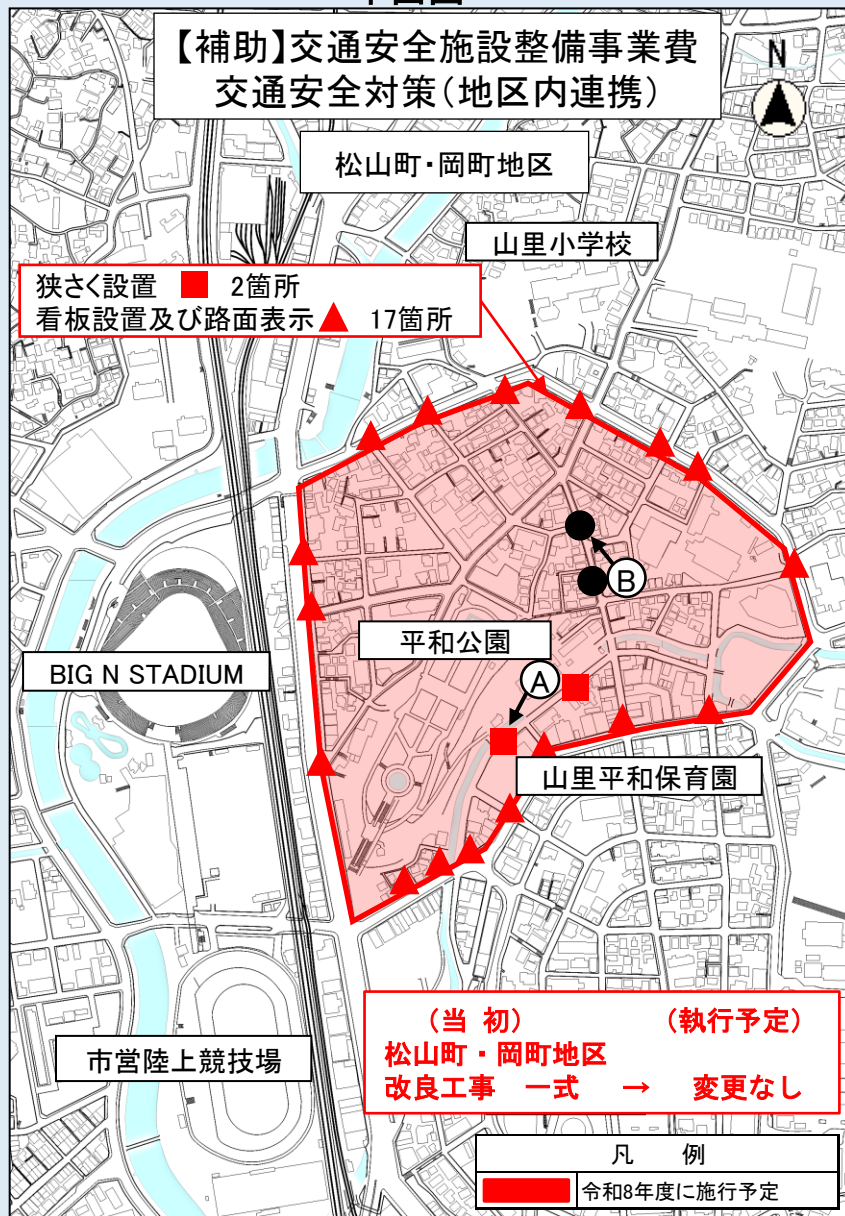

写真



平面図

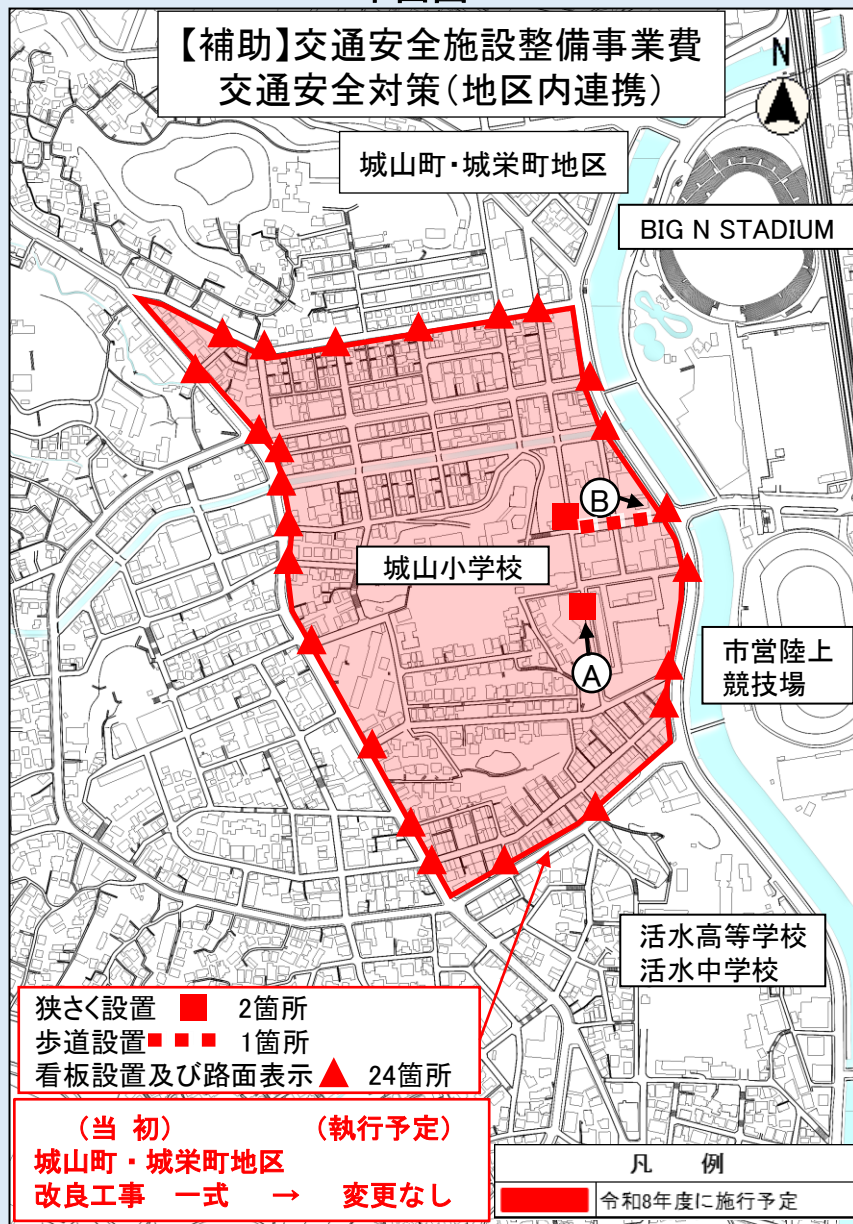

写真



平面图



写真

令和8年度予定箇所



平面図




写真



令和8年度予定箇所



【補助】公園等施設整備事業費
公園施設長寿命化(総合事務所)

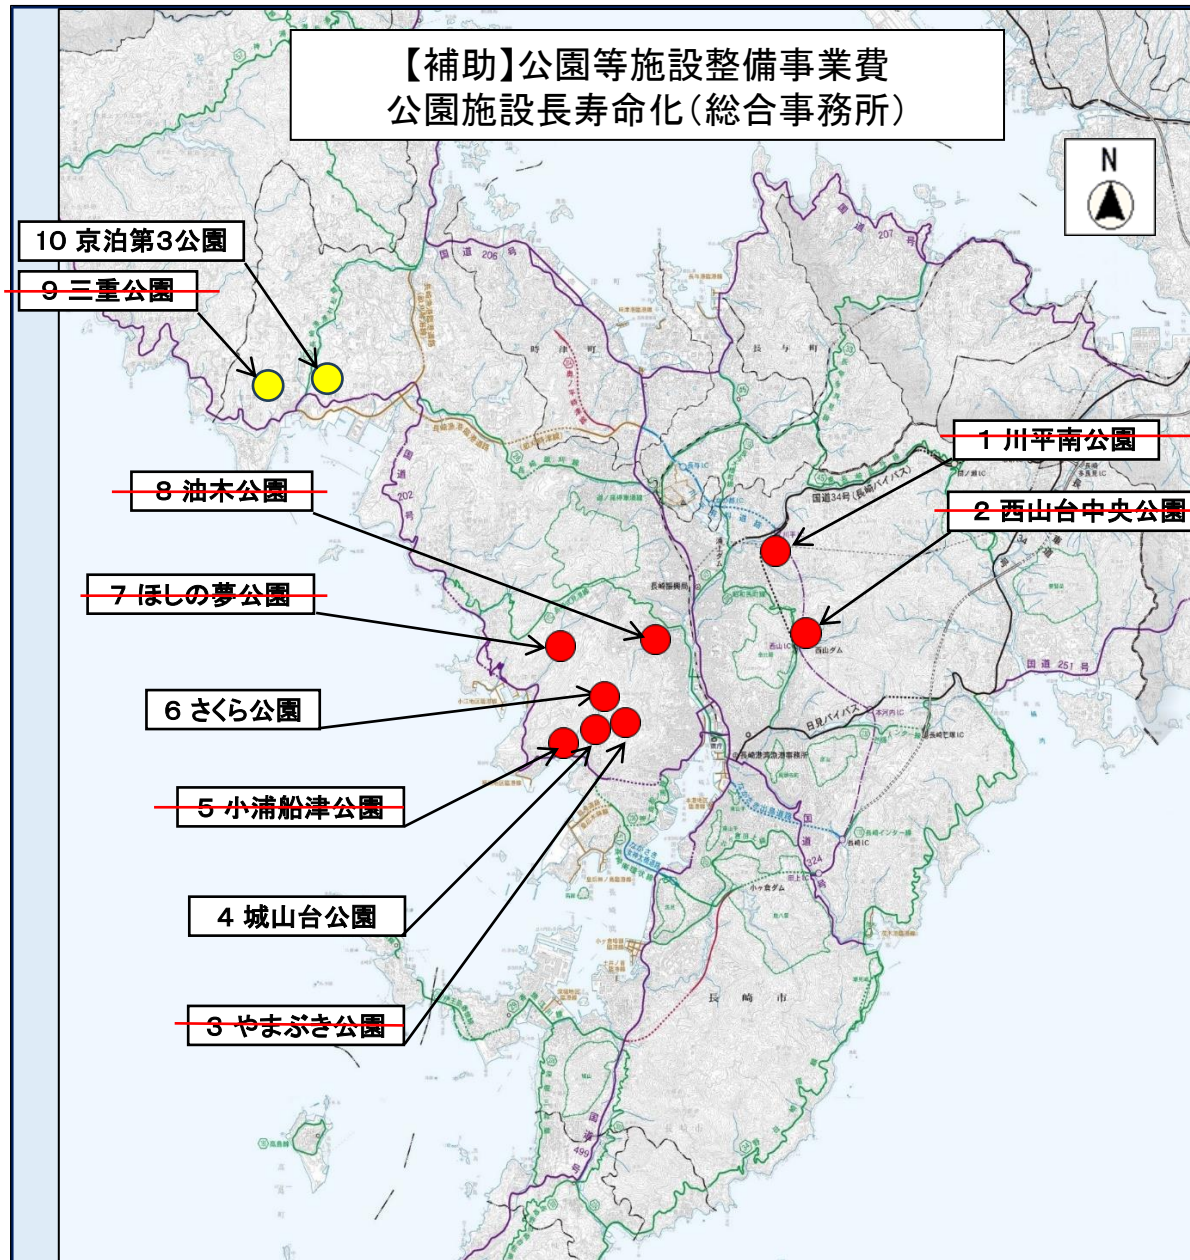


No,	区分	公園名
1	中央総合事務所	川平南公園
2		西山台中央公園
3		やまぶき公園
4		城山台公園
5		小浦船津公園
6		さくら公園
7		ほしの夢公園
8		油木公園
9	北総合事務所	三重公園
10		京泊第3公園
合計		10公園

3公園

凡 例	
中央総合事務所	●
北総合事務所	●



(当初) 10公園整備工事 → (執行予定) 3公園整備工事

No.	公園名・施設・所在地	現況		更新イメージ
1	【川平南公園】 ・すべり台 (川平町) C= 1,400千円			
	【川平南公園】 ・ブランコ (川平町) C= 1,400千円			
	【川平南公園】 ・鉄棒 (川平町) C= 400千円			
2	【西山台中央公園】 ・すべり台 (西山台2丁目) C= 1,400千円			

No.	公園名・施設・所在地	現況	更新イメージ
2	【西山台中央公園】 ・ブランコ (西山台2丁目) C= 1,400千円	 	
	【西山台中央公園】 ・砂場 → 撤去 (西山台2丁目) C= 400千円		
	【西山台中央公園】 ・鉄棒 (西山台2丁目) C= 400千円	 	
3	【やまぶき公園】 ・すべり台 (城山台1丁目) C= 1,400千円	 	

No.	公園名・施設・所在地	現況		更新イメージ
3	【やまぶき公園】 ブランコ (城山台1丁目) C= 1,400千円			
	【やまぶき公園】 鉄棒→撤去 (城山台1丁目) C= 400千円			—
4	【城山台公園】 ・スプリング→撤去 (城山台2丁目) C= 400千円			—
	【城山台公園】 ・複合遊具 (城山台2丁目) C= 18,300千円			

No.	公園名・施設・所在地	現況		更新イメージ
4	【城山台公園】 ・ブランコ （城山台2丁目） C= 1,400千円			
	【城山台公園】 ・鉄棒 （城山台2丁目） C= 400千円			
5	【小浦船津公園】 ・ブランコ （小浦町） C= 1,400千円			
	【小浦船津公園】 ・複合遊具 → すべり台 （小浦町） C= 1,400千円			

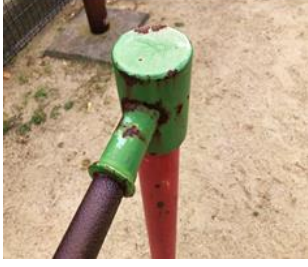
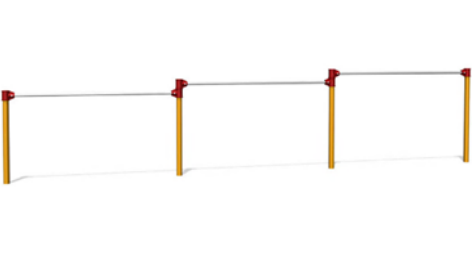
No.	公園名・施設・所在地	現況		更新イメージ
6	【さくら公園】 ・ブランコ (小江原2丁目) C= 1,400千円			
	【さくら公園】 ・ブランコ (小江原2丁目) C= 1,400千円			
	【さくら公園】 ・シーソー (小江原2丁目) C= 400千円			
	【さくら公園】 ・鉄棒 (小江原2丁目) C= 400千円			

No.	公園名・施設・所在地	現況	更新イメージ
7	【ほしの夢公園】 ・ブランコ (小江原5丁目) C= 1,400千円	 	
	【ほしの夢公園】 ・複合遊具 → すべり台に変更 (小江原5丁目) C= 1,400千円	 	
	【ほしの夢公園】 ・鉄棒 (小江原5丁目) C= 400千円	 	
8	【油木公園】 ・すべり台 (油木町) C= 1,400千円	 	

No.	公園名・施設・所在地	現況		更新イメージ
8	【油木公園】 ・シーソー → 撤去 (油木町) G= 100千円			
	【油木公園】 ・ブランコ (油木町) G= 1,400千円			
	【油木公園】 ・ブランコ → 撤去 (油木町) G= 200千円			
	【油木公園】 ・鉄棒 → 撤去 (油木町) G= 100千円			

No.	公園名・施設・所在地	現況		更新イメージ
9	【三重公園】 ・鉄棒+すべり台 → 複合遊具に変更 (三重町) C= 5,500千円			
				
10	【京泊第3公園】 ・複合遊具 (京泊1丁目) C= 7,620千円			
	【京泊第3公園】 ・シーソー (京泊1丁目) C= 400千円			

**【補助】公園等施設整備事業費
都市公園機能再編**

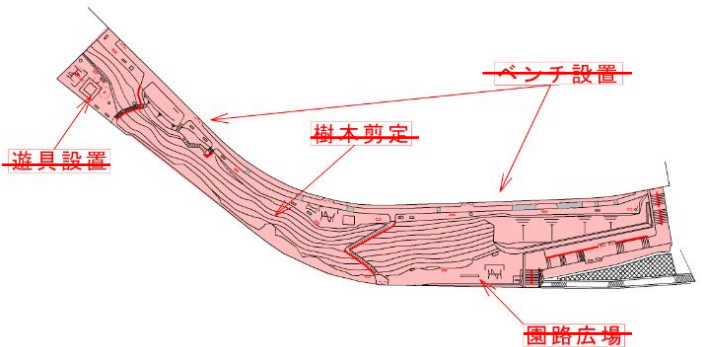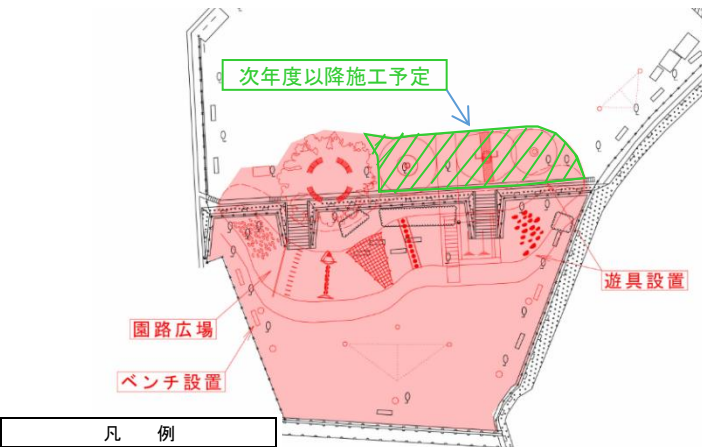公園名・施設・所在地	現況写真	計画平面図(再編後)
【上横尾緑地】 ・園路、ベンチほか (横尾4丁目)		 凡 例 令和8年度に施行予定
【築廻公園】 ・遊具、ベンチほか (横尾2丁目) (当初) 2公園整備工事 → (執行予定) 1公園整備工事 工事内容の見直し		 凡 例 令和8年度に施行予定
